



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OPERACIONES
 "Año del Dialogo y Conciliación Nacional"



INFORME N° 33-2018-GR.CAJ-SGO/ERGT

REGISTRO MAD	
EXPEDIENTE N°	: 03763369
FECHA	: 11.04.2018

A : Ing. Luis Alberto Díaz Vilca
Sub Gerente de Supervisión y Liquidaciones

DE : Ing. Edwin Richard Goicochea Torres
INSPECTOR DE OBRA

ASUNTO : Informe mensual de avance físico de ejecución de la obra : "Instalación del Sistema de Electrificación Rural de los Caseríos La Laguna, El Carrizo y San Juan de Miraflores, Distrito de San Luis, Provincia de San Pablo, Región Cajamarca", correspondiente al mes de marzo de 2018.

REFERENCIA : MEMO MULT. N° 010-2018-GR.CAJ-GRI/SGSL

FECHA : Cajamarca, 11 de Abril de 2018.

I. OBJETIVO

El presente informe tiene por objetivo, dar a conocer a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones sobre el avance físico de ejecución de obra, correspondiente al mes de marzo de 2018, ejecutada por la empresa contratista Consorcio Miraflores.

II. DATOS GENERALES

- **Contratista** : Consorcio Miraflores
- **Sistema de Contratación** : Mixto a Suma Alzada y Precios Unitarios
- **Contrato** : N° 004-2018-GR.CAJ-GGR, Fecha: 09/02/2018.
- **Proceso de Selección** : ADS N° 027-2017-GR.CAJ-Primera Convocatoria
- **Plazo de Ejecución Contractual** : **150 días calendario**
 - Prestación N° 01 : 25 días calendario
 - Prestación N° 02 : 108 días calendario
 - Prestación N° 03 : 17 días calendario.
- **Fecha de Entrega de Terreno** : 23 de Febrero del 2018.
- **Fecha de inicio de Obra**
 - Prestación N° 01 : 24 de Febrero del 2018.
 - Prestación N° 02 : 11 de Abril del 2018.
 - Prestación N° 03 : Por definir.
- **Fecha de Término Contractual**
 - Prestación N° 01 : 20 de Marzo del 2018.
 - Prestación N° 02 : 27 de Julio del 2018.
 - Prestación N° 03 : Por definir.
- **Monto Contratado** : **S/ 793,730.91 Soles C/IGV**
 - Prestación N° 01 : S/ 59,900 Soles C/IGV
 - Prestación N° 02 : S/ 683,430.91 Soles C/IGV

Edwin Richard Goicochea Torres
 INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
 REG. CIP. N° 93592

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
 SUB GERENCIA DE OPERACIONES

PASADO POR: *E. R. C. Saucedo*
 PARA: *Por el Encargado*

11/04/2018





GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OPERACIONES
 "Año del Dialogo y Conciliación Nacional"



• Prestación N° 03	: S/ 50,400.00 Soles C/IGV
- Residente de Obra	: Ing. Kenny Villalobos Vega, Reg. CIP N° 89188
- Inspector de Obra	: Ing. Edwin R. Goicochea Torres, Reg. CIP N° 93592
- Adelanto Directo	: no ha sido solicitado
- Adelanto para Materiales	: no ha sido solicitado
- Ampliación de plazo	: no se presento

III. ANTECEDENTES

- Con Fecha 27 de Noviembre del 2017, el comité de selección Adjudicó la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 027-2017-GR.CAJ-Primera Convocatoria, al Consorcio Miraflores.
- Con fecha 09 de Febrero del 2018, se suscribió el contrato N° 004-2018-GR.CAJ-GGR, entre el Gobierno Regional de Cajamarca y el Consorcio Miraflores, luego se haberse resuelto por parte del tribunal del OSCE el recurso de apelación interpuesto por el postor W&IM Ingenieros Contratistas S.R.L.
- Con Fecha 20 de Febrero de 2018, mediante Carta N° 22-2018-GR-CAJ/SGSL, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones, notificó al consorcio Miraflores quien es el inspector de Obra y se hizo entrega del expediente técnico contractual.
- Con Fecha 23 de Febrero de 2018, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones hizo entrega del terreno donde se ejecutará la obra.
- Todas estas condiciones antes indicadas se han cumplido dentro de los 15 días calendario estipuladas en el Artículo 152° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Con Fecha 24 de Febrero del 2018, se da inicio a la ejecución de obra en un plazo efectivo de ejecución de 150 días calendarios, partiendo de la prestación N° 01 – Saneamiento de Servidumbre y replanteo topográfico en un plazo contractual de 25 días calendario, el cual finalizará con fecha 20 de Marzo del 2018.
- Con Fecha 24 de Febrero del 2018, se da inicio a la ejecución de obra en un plazo efectivo de ejecución de 150 días calendarios, partiendo de la prestación N° 01 – Saneamiento de Servidumbre y replanteo topográfico en un plazo contractual de 25 días calendario, el cual finalizará con fecha 20 de Marzo del 2018.
- Con Fecha 20 de Marzo del 2018, mediante carta N° 009-2018/CONSORCIO MIRAFLORES, la empresa contratista presenta el Expediente técnico de saneamiento de servidumbre y replanteo topográfico, correspondiente a la ejecución de la prestación N° 01 para revisión y conformidad.
- Con Fecha 20 de Marzo del 2018, mediante carta N° 009-2018/CONSORCIO MIRAFLORES, la empresa contratista presenta el Expediente técnico de saneamiento de servidumbre y replanteo topográfico, correspondiente a la ejecución de la prestación N° 01 para revisión y conformidad.
- Con Fecha 26 de Marzo del 2018, mediante INFORME N° 25-2018-GR.CAJ-SGO/ERGT, el inspector de obra informa a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones que los Expediente técnico de saneamiento de servidumbre y replanteo topográfico presentado por la empresa contratista cuentan con observaciones y solicita se devuelva para su corrección.
- Con Fecha 05 de Abril del 2018, mediante carta N° 011-2018/CONSORCIO MIRAFLORES, la empresa contratista hace llegar a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones, el Expediente técnico de saneamiento de servidumbre y replanteo topográfico corregido, correspondiente a la ejecución de la prestación N° 01 para revisión y conformidad.
- Con Fecha 09 de Abril del 2018, mediante INFORME N° 29-2018-GR.CAJ-SGO/ERGT, el inspector de obra informa a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones, que los Expediente técnicos de saneamiento de servidumbre y replanteo topográfico presentado por la empresa, han sido corregidos de acuerdo a lo solicitado y se encuentran conformes.



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OPERACIONES
 "Año del Dialogo y Conciliación Nacional"



- Con Fecha 10 de Abril del 2018, mediante Carta N° 92-2018-GR-CAJ/SGSL, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones notifica al contratista Consorcio Miraflores y emite la conformidad a la ejecución de la PRESTACIÓN N° 01 – saneamiento de servidumbre y replanteo topográfico, autorizando el inicio a la ejecución de la PRESTACION N° 02 – suministro y montaje electromecánico.
- Con Fecha 11 de Abril del 2018, se da inicio a la ejecución de PRESTACION N° 02 – suministro y montaje electromecánico, en un plazo contractual de 108 días calendario, el cual finalizará con fecha 27 de julio del 2018.

IV. BASE LEGAL

- Contrato N° 004-2018-GR.CAJ-GGR
- Ley de Contrataciones del Estado 30225, su modificatoria efectuada mediante Decreto Legislativo N° 1341
- Reglamento D.S N° 350-2015-EF, su modificatoria efectuada mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF
- Directivas OSCE y demás Normativa especial que resulte aplicable.
- Código Civil Vigente, cuando corresponda y demás normas de derecho privado.
- Bases Administrativas Integradas
- Código Nacional de Electricidad-Suministro 2011
- Normativa Vigente del DGER/MEM, entre otras

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El avance físico real ejecutado de la obra para el mes de marzo es del 7.55%, el cual corresponde a la ejecución de la prestación N° 01 – Saneamiento de servidumbre y replanteo topográfico, estando dentro de lo programado.
- Se recomienda a la sub Gerencia de Supervisión y liquidaciones solicitar a la Empresa Contratista Consorcio Miraflores presente la valorización, correspondiente a la ejecución de la prestación N° 01 – Saneamiento de servidumbre y replanteo topográfico, ya que a la fecha no ha sido presentado a fin de que se tramite el pago respectivo.
- En cuanto a los metrados ejecutados estos serán regularizados y alcanzados al momento que la empresa contratista presente la valorización respectiva.
- Se adjunta panel fotográfico.

Atentamente.


 Edwin Richard Epicochoa Torres
 INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
 REG. CIP. N° 93592

cc.
 Archivo



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OPERACIONES
"Año del Dialogo y Conciliación Nacional"




Panel fotográfico de la obra: "Instalación del Sistema de Electrificación Rural de los Caseríos La Laguna El Carrizo San Juan de Miraflores, Distrito de San Luis, Provincia de San Pablo, Región de Cajamarca" - verificación de planos de replanteo topográfico





GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OPERACIONES
"Año del Dialogo y Conciliación Nacional"

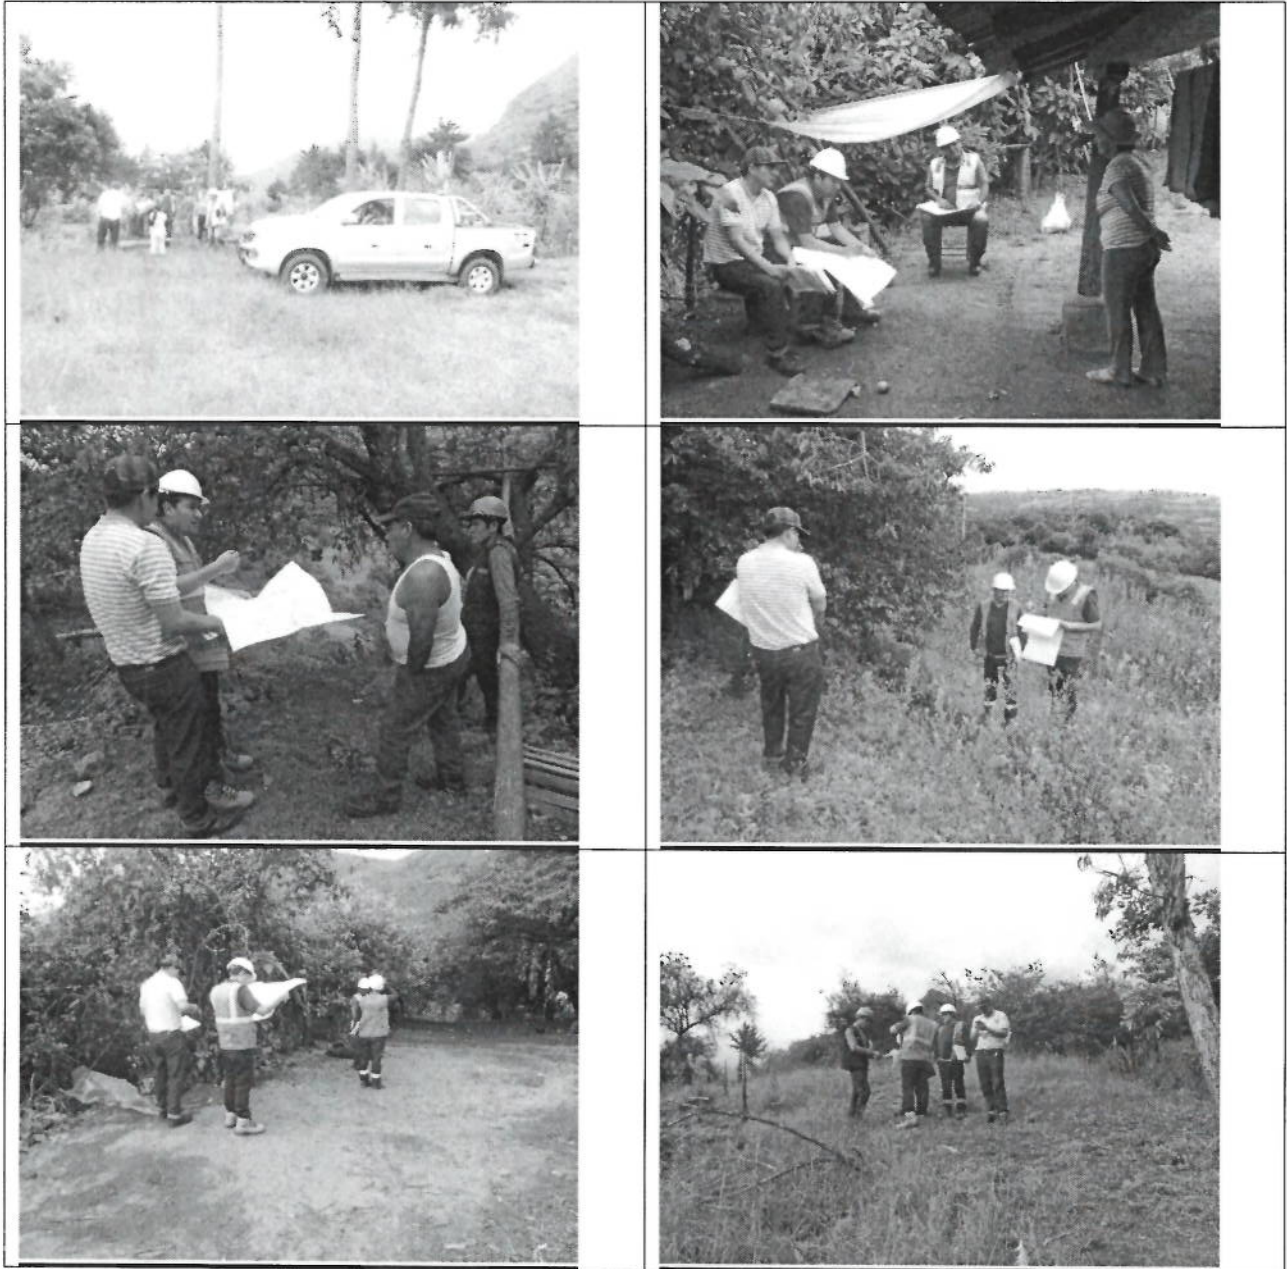


Edwin Richard Pacheco Torres
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 93592
