

I AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL 2013

Por una Gran Región

Cajamarca 09 de Agosto de 2013



Prof. Gregorio Santos Guerrero
Presidente Regional

Contenidos

- I. Contexto Internacional, Nacional y Regional
- II. Ejecución presupuestal
- III. Prioridades, avances y logros por ejes de desarrollo:
 - ✓ Eje Social.
 - ✓ Eje Económico.
 - ✓ Eje Ambiental.
 - ✓ Eje Institucional
- IV. Demanda Adicional en Inversión y Deuda Social





Contexto

Por una Gran Región

Análisis Del Contexto Internacional, Nacional y Regional

INTERNACIONAL	NACIONAL	REGIONAL
CRISIS DEL MODELO NEOLIBERAL	CRISIS DEL MODELO PRIMARIO EXPORTADOR	CRISIS MODELO PRIMARIO EXPORTADOR
CRISIS ECONÓMICA:		
Recesión económica: (España, Grecia, Alemania)	➤ Menor demanda de insumos, servicios y productos.	➤ Surgimiento de un nuevo modelo de desarrollo integral con sostenibilidad ambiental que ha conllevado a sanciones económicas del Gobierno Central al Gobierno Regional de Cajamarca
Caída de precios: minerales, agro exportación, etc. (China ha disminuido su demanda)	➤ Menor recaudación tributaria. ➤ Menor inversión pública.	➤ Menor asignación para inversiones a los Gobiernos sub nacionales. ➤ Se alienta al centralismo económico. ➤ Reestructuración del gasto público.
Salvatajes estatales	➤ Uso de divisas nacionales para estabilizar el dólar. ➤ Políticas proteccionistas a la Inversión Extranjera. ➤ Flexibilización de la normatividad tributaria, de estándares de calidad y régimen laboral.	➤ Surgimiento de grandes grupos extractivos de recursos naturales, de servicios, comercio y construcción. ➤ Quiebra de pequeñas empresas y negocios.

ANÁLISIS DEL CONTEXTO INTERNACIONAL, NACIONAL Y REGIONAL

INTERNACIONAL	NACIONAL	REGIONAL
CRISIS DEL MODELO NEOLIBERAL	CRISIS DEL MODELO PRIMARIO EXPORTADOR	CRISIS MODELO PRIMARIO EXPORTADOR
CRISIS AMBIENTAL:		
❖ Traslado de industrias contaminantes. ❖ Traslado de pasivos ambientales.	➤ Débil gobernabilidad ambiental. ➤ Centralización de la gobernabilidad territorial.	➤ Pasivos ambientales. ➤ Desestructuración de ecosistemas. ➤ Bloqueo de la gestión descentralizadora del territorio, impidiendo los procesos de ordenamiento territorial.
	➤ Incremento de la actividad extractiva informal	➤ Pasivos ambientales.
CRISIS SOCIAL Y POLITICA:		
Conflictos políticos, sociales y ambientales.	➤ Conflictos políticos, socios ambientales.	➤ Conflictos políticos, sociales y ambientales. ➤ Nueva agenda de sostenibilidad para el desarrollo sostenible e integral.
Crisis de gobernabilidad y representatividad.	➤ Crisis de partidos políticos. ➤ Ausencia de liderazgos políticos	➤ Surgimiento de grupos y alianzas políticas regionales. ➤ Surgimiento de líderes políticos ambientales.
Narcotráfico y corrupción.	➤ El tejido de corrupción se ha fortalecido a nivel del poder político y económico.	➤ Aumento de la economía informal.




LA CORRUPCION UN FLAGELO QUE COMBATIR


- La corrupción está institucionalizada en el país en todos los niveles y esferas.
- La transparencia y participación de la población en la gestión contribuirá para su erradicación.
- Se debe ser intolerantes ante actos de corrupción y sancionar con dureza a los infractores.

- ❖ *El Gobierno Regional de Cajamarca no está ajeno a este contexto.*
- ❖ *Ante indicios de corrupción se ha tomado acciones de inmediato para corregirlos, se encuentra en proceso de aprobación la Ordenanza Regional para conformar el Comité Anticorrupción*
- ❖ *No daremos tregua en nuestra lucha por desterrar la corrupción.*
- ❖ *Hacer un llamado a los medios de comunicación y la sociedad civil para fortalecer la vigilancia ciudadana.*






EL NUEVO MODELO DE DESARROLLO



EL NUEVO MODELO DE DESARROLLO





Ejecución Presupuestal


Por una Gran Región

COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO – POR CATEGORÍA DE GASTO PIA VS PIM

CATEGORÍA / GENÉRICA	PIA	%	PIM	%
GASTOS CORRIENTES	784,679,340	86.0	929,065,835	71.7
21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	562,138,051	71.6	661,389,031	71.2
22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	71,758,000	9.1	72,708,420	7.8
23: BIENES Y SERVICIOS	144,580,889	18.4	189,094,106	20.4
25: OTROS GASTOS	6,202,400	0.8	5,874,278	0.6
GASTOS DE CAPITAL	108,203,560	11.9	365,192,046	28.2
24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0.0	1,153,397	0.3
26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	108,203,560	100.0	364,038,649	99.7
SERVICIO DE DEUDA	20,005,475	2.2	1,400,000	0.1
28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	20,005,475	100.0	1,400,000	100.0
TOTAL	912,888,375	100.0	1,295,657,881	100.0




COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

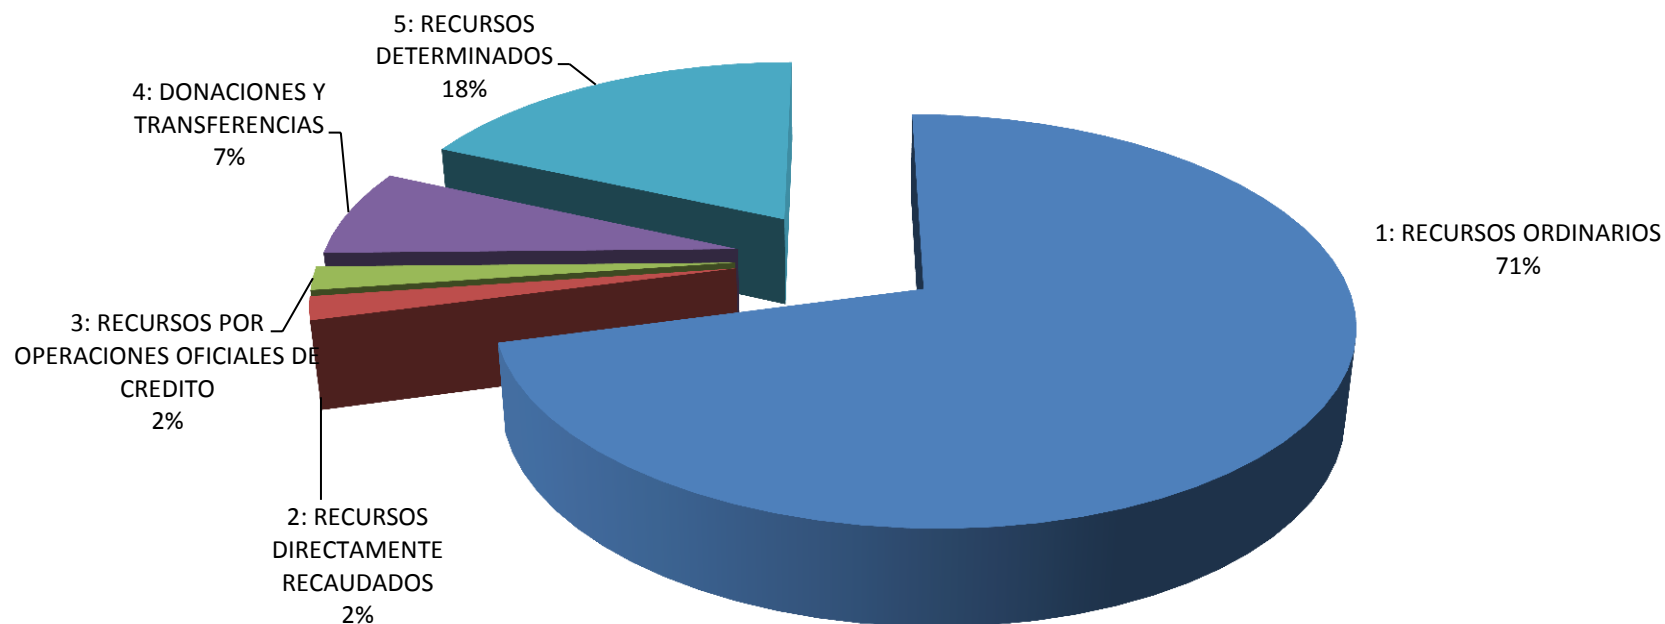

Del monto considerado en la Fuente de Recursos Ordinarios, el 87.5% corresponde a las Ejecutoras del Sector Salud y Educación.




EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE CATEGORÍA DE GASTO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO (31 DE JULIO DE 2013) (MILLONES DE S/.)

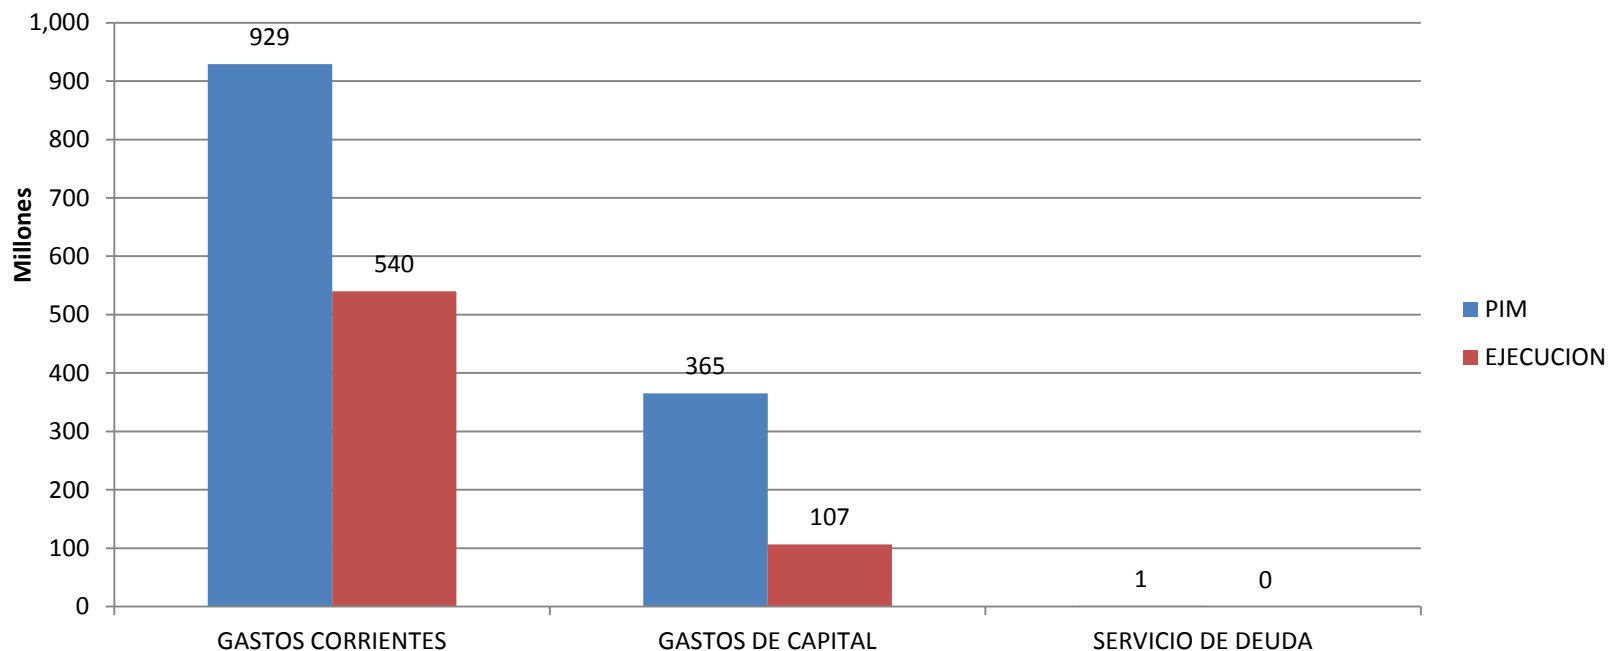

EJECUCIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN POR FUNCIÓN – POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO (MILLONES DE S/.)

FUNCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	Avance %
PLANEAMIENTO	16.36	2.98	18.2
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	0.15	0.00	0.0
AGROPECUARIA	16.60	5.06	30.5
PESCA	0.11	0.00	0.0
ENERGIA	91.28	30.12	33.0
TRANSPORTE	42.78	16.58	38.8
AMBIENTE	4.70	0.54	11.4
SANEAMIENTO	36.72	19.38	52.8
SALUD	84.81	18.34	21.6
EDUCACION	37.97	9.55	25.1
TOTAL	331.48	102.55	30.9

El Sector Salud contempla los Hospitales de Jaén y Cajabamba (71.7 millones) los cuales se encuentran en etapa de ejecución.

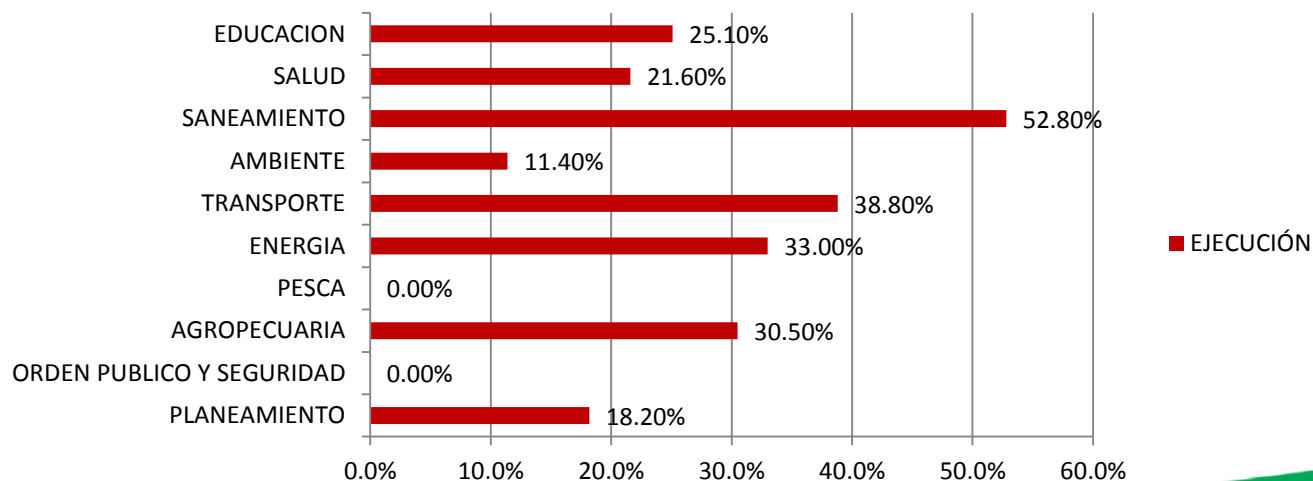

COMPARATIVO DE LA PARTICIPACIÓN EN LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA INVERSIONES 2007 – 2013

(En Porcentaje)


PLIEGO	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	POBLACIÓN
G.R. CUSCO	9.1	6.6	8.5	7.1	8.0	8.8	10.5	1'292,175
G.R. AREQUIPA	4.5	4.7	6.6	4.8	4.9	10.3	7.9	1'245,251
G.R. PIURA	5.7	4.3	4.4	4.5	6.1	6.1	6.5	1'799,607
G.R. SAN MARTIN	5.3	6.3	4.9	6.0	5.3	5.2	5.7	806,452
G.R. LORETO	6.2	4.0	2.6	9.7	7.2	7.1	5.6	1'006,953
G.R. AYACUCHO	2.1	3.4	3.1	4.4	3.4	4.3	5.1	666,029
G.R. LA LIBERTAD	4.9	5.8	3.9	5.1	4.3	4.0	4.0	1'791,659
G.R. HUANCANELICA	4.0	4.8	3.9	3.3	3.7	3.4	3.9	483,580
G.R. CALLAO	2.2	2.2	3.9	1.5	2.2	5.3	3.9	969,170
G.R. PUNO	3.0	2.4	3.3	2.9	3.4	4.3	3.8	1'377,122
G.R. HUANUCO	1.8	3.2	2.8	2.8	4.1	4.1	3.6	840,984
G.R. ANCASH	7.0	6.9	9.5	1.6	3.2	4.1	3.5	1'129,391
G.R. AMAZONAS	2.4	3.6	3.2	3.5	4.7	2.6	3.4	417,508
G.R. LIMA	1.8	3.4	2.6	3.6	2.6	2.6	3.3	9'395,149
G.R. APURIMAC	1.2	3.7	2.9	4.8	3.0	2.4	3.1	451,881
G.R. ICA	2.0	2.4	1.8	2.2	4.0	3.5	3.1	763,558
G.R. LAMBAYEQUE	6.4	5.8	5.0	3.2	3.5	1.7	3.0	1'229,260
G.R. UCAYALI	2.6	2.4	3.0	2.6	3.4	2.1	2.7	477,616
G.R. TUMBES	1.7	1.9	1.3	3.0	2.7	2.0	2.6	228,227
G.R. MOQUEGUA	5.9	2.6	2.3	1.4	2.6	3.0	2.5	174,859
G.R. JUNIN	3.3	4.4	4.6	2.4	2.4	2.0	2.4	1'321,407
G.R. PASCO	2.4	4.5	3.6	1.0	1.9	2.1	2.4	297,591
G.R. TACNA	6.8	5.2	5.8	1.4	2.0	2.9	2.3	328,915
G.R. CAJAMARCA	4.7	2.9	3.3	11.2	8.2	3.7	2.2	1'513,892
G.R. MADRE DE DIOS	0.9	1.3	2.1	2.7	2.8	1.6	2.1	127,639
MUNI. METR. LIMA	2.0	1.3	1.0	3.2	0.7	0.7	0.8	
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	30'135,875

Trato injusto y discriminatorio presupuestalmente al Gobierno Regional de Cajamarca, frente a otros Gobiernos Regionales, lo que evidencia la falta de equidad por parte del Gobierno Central, ante los altos índices de pobreza que mantiene la región.




COMPARATIVO GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA Y OTROS GOBIERNOS REGIONALES (MILLONES DE S/.)

RECURSOS DETERMINADOS-CANON

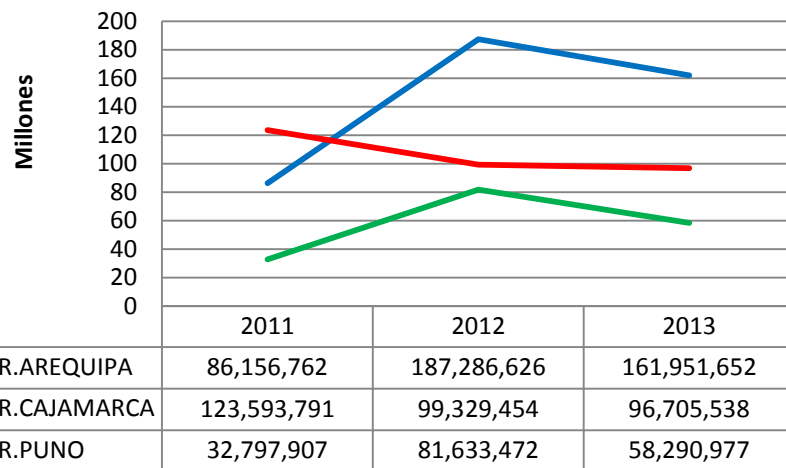

RECURSOS ORDINARIOS

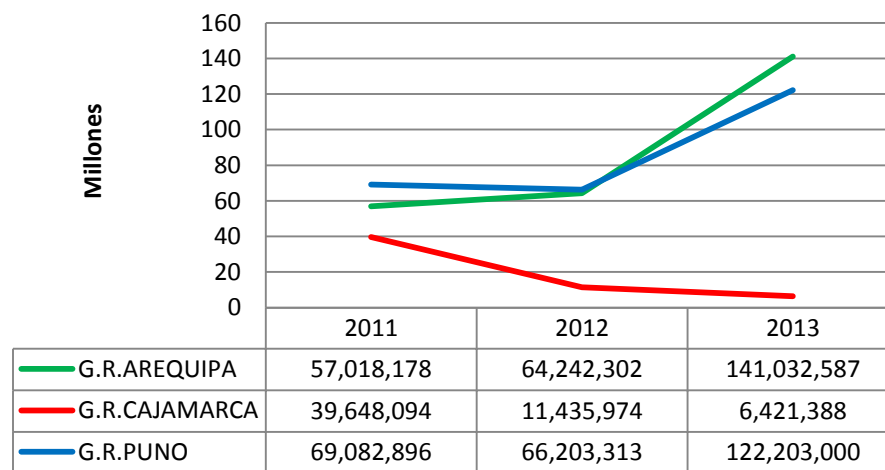


- ✓ Mientras a otras regiones se les compensa la disminución del canon con recursos ordinarios, a Cajamarca no se le da igual trato, violando el principio de complementariedad.
- ✓ El objetivo del Gobierno Central es ahogar a la Región de Cajamarca y confrontarlo con la población



COMPORTAMIENTO DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN INVERSIONES

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2007 – 2014
(MILLONES DE S/.)**

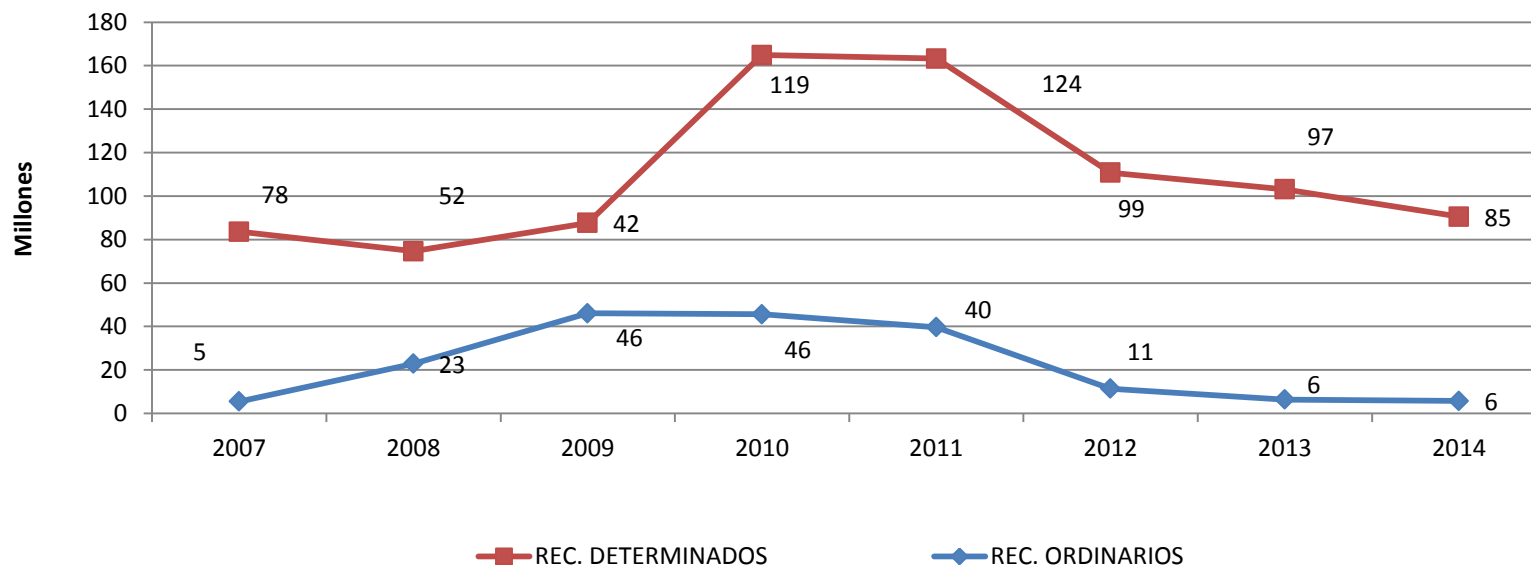

Retroceso en el nivel de asignación de recursos en inversión, limita el nivel de intervención en proyectos de inversión en los diferentes sectores de la Región.



MONTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA POR NIVELES DE GOBIERNO (NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL) (MILLONES S/.)

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013	
	PIM	%	PIM	%	PIM	%	PIM	%	PIM	%	PIM	%	PIM	%
GOBIERNO NACIONAL	180.5	19.5	169.9	15.2	271.6	22.5	350.6	20.0	718.2	31.7	868.3	32.5	871.7	35.0
GOBIERNO REGIONAL	361.2	39.1	338.7	30.3	326.6	27.0	544.6	31.1	604.4	26.6	413.8	15.5	334.4	13.4
GOBIERNOS LOCALES	382.1	41.4	608.7	54.5	610.5	50.5	857.3	48.9	945.7	41.7	1,392.0	52.1	1,281.0	51.5
TOTAL	923.8	100.0	1,117.3	100.0	1,208.7	100.0	1,752.5	100.0	2,268.3	100.0	2,674.1	100.0	2,487.1	100.0

En el período 2007 - 2013, se observa como el nivel nacional va concentrando los recursos a través de sus Ministerios en la ejecución de gastos de inversión, caso contrario sucede con el Gobierno Regional, lo que demuestra una conducta de discriminación financiera contra nuestra Región.




CONSECUENCIAS DE LA RECENRALIZACIÓN FISCAL Y DEL TRATO DISCRIMINATORIO DE LOS RECURSOS PARA INVERSIÓN

- Ejecución de proyectos atomizados por parte del Gobierno Nacional, que no contribuyen al cierre de brechas, buscando escenarios de poca sostenibilidad; la cual no generan competitividad.
- Imposibilidad de ejecutar proyectos de impacto regional de acuerdo a las prioridades de la región, lo cual se superpone al DS N° 097-2009.
- Confrontación del Gobierno Regional con la población por la falta de atención de proyectos, por la limitada asignación presupuestal.
- Limitados recursos asignados al Gobierno Regional sólo permite ejecutar estudios de Preinversión, conllevando a trasladar la ejecución de estos proyectos al Gobierno Nacional, por su carácter centralista de manejar los recursos, no respetando la autonomía regional.
- No concretización de los objetivos planteados en el PDRC, que vienen alineados a los Objetivos del Milenio.



DISTRIBUCIÓN ARBITRARIA DE LOS RECURSOS DETERMINADOS (CANON). (MILLONES DE S/.)

NIVEL DE GOBIERNO	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
M. P DE CAJAMARCA	48.20	34.33	37.10	26.89	45.58	67.65	74.28
VAR. %		-28.78	8.07	-27.52	69.51	48.42	9.80
G. R DE CAJAMARCA	78.14	51.74	41.6	119.26	123.59	99.32	96.70
VAR. %		-33.79	-19.60	186.68	3.63	-19.64	-2.64

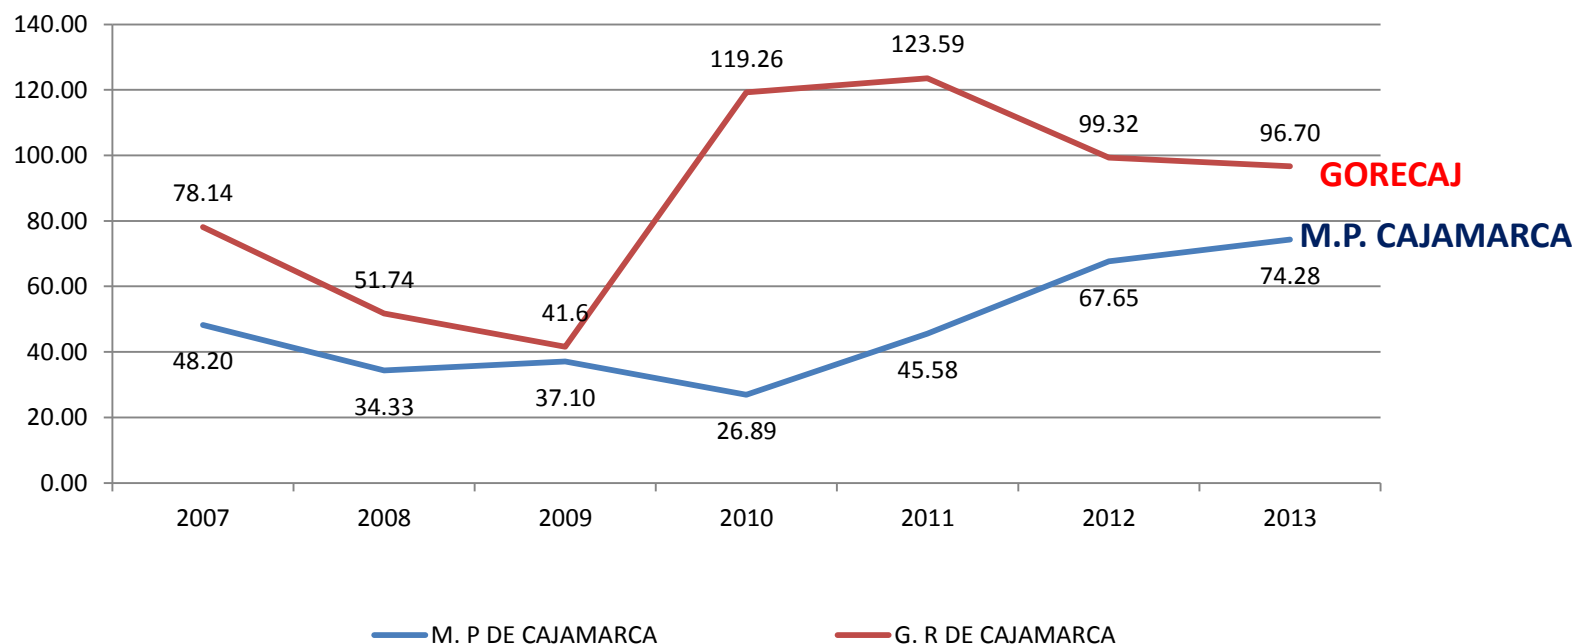



Eje Social

Por una Gran Región

Prioridad : Mejora en logros de aprendizaje con equidad

AVANZAMOS PERO AUN ES INSUFICIENTE.

Actividades:

- ✓ Cajamarca ha escalado en Comprensión Lectora del puesto 24 al 20 y en Matemática del puesto 24 al 15; según la prueba ECE 2012.
- ✓ 25,189 kits educativos entregados a 780 II.EE-IP, beneficiando a 23,130 estudiantes y 1,279 docentes.
- ✓ 363 Talleres de Capacitación docente beneficiando 11,356 docentes y 195,347 estudiantes.
- ✓ 409 II.EE. focalizadas cuentan con acompañamiento pedagógico.
- ✓ 120 redes educativas con supervisión, monitoreo y asesoría pedagógica, beneficiando a 13,549 docentes y a 185,356 estudiantes.
- ✓ 31 II.EE. beneficiadas con 90 aulas prefabricadas.



Prioridad: Universalización de la Educación

SOMOS EL GOBIERNO DE LOS MIL JARDINES DE INFANCIA

Actividades:

- ✓ **11,160 niños y niñas acceden a educación inicial con 610 aulas creadas.**
- ✓ **396 jardines de infancia con presupuesto aprobado para su funcionamiento el 2014, beneficiando adicionalmente a 7800 niños y niñas.**
- ✓ **Funcionamiento de 22 anexos de educación superior tecnológica, en convenio con Gobiernos Locales, beneficiando a 1,200 jóvenes.**
- ✓ **188 predios de los sectores de salud, educación y Aldea Infantil saneados e inscritos en registros públicos.**
- ✓ **277 II.EE. reconocidas como promotoras de la interculturalidad: Cajamarca 205; Cajabamba 3, Chota 33, Cutervo 3, Jaén 9 y en San Ignacio 24 II.EE, con 157 profesores acreditados.**



Prioridad: Mejora de la gestión de la I.E. UGEL y DREC

NUEVO MODELO DE GESTIÓN CON ENFOQUE TERRITORIAL

Actividades:

- ✓ **14 Unidades Ejecutoras con autonomía presupuestal y administrativas (2011 sólo habían 07).**
- ✓ **92 Promotores Educativos Distritales para acompañamiento de gestión a directores de I.E.**
- ✓ **550 docentes coordinadores de redes educativas becados con estudios de maestría en Gestión Educativa en la UNC, cuyas clases inician en setiembre, con una inversión de 3 millones.**
- ✓ **72 motos lineales y 17 camionetas entregadas a las UGELs y DREC para mejorar el acompañamiento pedagógico y de gestión.**
- ✓ **9,856 docentes reasignados y 2,472 docentes beneficiados con ascenso de nivel, reconociendo sus derechos laborales.**



Mejorando la Infraestructura se Mejora la Calidad Educativa

12 I.E. inauguradas, con una inversión de 18.7 millones, beneficiando a 14,184 alumnos.

N°	Proyectos Concluidos	Provincia	Monto de Inversión (S/.)	Beneficiarios
1	ISTP Andabamba Santa Cruz	Santa Cruz	1,705,193	672
2	I.E. Secundaria 22 de Octubre Urcurume	Cutervo	1,751,256	209
3	I.E. Inicial N° 301	Cutervo	1,153,278	142
4	I. E. S Cesar Vallejo del CP. de Chipuluc	Cutervo	3,556,726	190
5	I.E. 16934 - Luis Felipe de las Casas Grieve - CP Siete de Agosto, distrito de San José de Lourdes	San Ignacio	1,593,534	208
6	I.E. N° 16003 Pueblo Joven Miraflores	Jaén	1,031,696	1,043
7	I.E. David León	Contumazá	812,014	7,356
8	I.E. Gran Guzmango Cápac - Chilete	Contumazá	889,942	2,722
9	I.E. Simón Bolívar	San Miguel	1,687,333	172
10	I.E. Mi Perú Chabarbamba, distrito Huambos	Chota	1,437,664	200
11	I.E. Chuco Pedro Gálvez	San Marcos	2,068,985	132
12	I.E. N° 1129 Porconcillo Bajo Montecillo – CP Huambocancha	Cajamarca	1,051,361	1,138
TOTAL			18,738,982	14,184



Mejorando la Infraestructura para la Gestión Educativa

2 UGELs entregadas, con una inversión de 5.4 millones, beneficiando a 96,387 alumnos.

N°	Proyectos Concluidos	Provincia	Monto de Inversión (\$/.)	Beneficiarios
1	Construcción y Equipamiento Ugel San Ignacio	San Ignacio	3,055,110	2,311
2	Construcción e Implementación Ugel Hualgayoc	Bambamarca	2,287,089	94,076
TOTAL			5,342,199	96,387



Mejorando la Infraestructura se Mejora la Calidad Educativa

3.4 millones en ejecución en proyectos de infraestructura educativa, beneficiando a 2,085 alumnos.

N°	Proyectos en Ejecución	Provincia	Monto de Inversión (S/.)	Beneficiarios	% Avance
1	I.E. N° 16519 José Carlos Mariátegui – Huaranguillo	San Ignacio	1,101,991	268	71
2	I.E. N° 16499 Ricardo Palma - Huarandoza	San Ignacio	1,345,816	518	46
3	I.E.P-PS N° 16010 - Cruce Chamaya	Jaén	1,007,896	256	95
TOTAL			3,455,703	2,085	



Mejorando la Infraestructura se Mejora la Calidad Educativa

4 expedientes técnicos aprobados en infraestructura educativa para beneficiar a 3,803 estudiantes, que demandará una inversión de 3.6 millones.

N°	Expediente Técnicos Aprobados	Provincia	Monto de Inversión (S/.)	Beneficiarios
1	Servicio Educativo en el IEGECOM de Nivel Secundario Sagrado Corazón del C.P. Lagunas Pedregal, Distrito De Huasmín	Celendín	1,080,086	555
2	I.E. N° 82467 Francisco Delgado Guerrero del Caserío Namo, Distrito de Huasmin	Celendín	1,170,258	572
3	I.E. N° 82898 – Muyoc – Gregorio Pita	San Marcos	808,437	139
4	I.E. N° 82069 - Llacanora	Cajamarca	562,848	2,537
TOTAL			3,621,629	3,803



Prioridad: Universalización del derecho a la educación

4 expedientes técnicos en elaboración en infraestructura educativa para beneficiar a 3,744 estudiantes, que demandará una inversión de 6.4 millones

N°	Expediente Técnicos en Elaboración	Provincia	Monto de Inversión (S/.)	Beneficiarios
1	I.E. N° 82284	Cajabamba	2,493,682	265
2	I.E. Carlos Manuel Cox Rosse – Cholocal	Cajabamba	2,115,510	1,741
3	I.E. N° 82696 La Hualanga - Bambamarca.	Hualgayoc	1,355,013	1,551
4	I.E. N° 82098	San Pablo	479,549	187
TOTAL			6,443,754	3,744



Prioridad: Universalización del derecho a la educación

25 perfiles viables para el sector educación que demandará una inversión de 150.6 millones.

Cantidad	Perfiles Viables	Provincias	Monto de Inversión (S/.)	Alumnos Beneficiarios
13	Mejoramiento de los Aprendizajes en las Áreas de: Comunicación, Matemáticas, Ciencias y Persona, Familia y Relaciones Humanas	San Ignacio, Jaén, Cutervo, Santa Cruz, San Miguel, San Pablo, Contumazá, Hualgayoc, Cajamarca, Cajabamba, Santa Marcos y Celendín	83,981,785	112,521
7	Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada	Chota, Cutervo, Santa Cruz, San Miguel, Hualgayoc, Cajabamba, San Marcos, Cajamarca y Celendín	53,462,586	12,087
2	Mejoramiento del Servicio Educativo en las I.E. de Nivel Primario	San Pablo	11,064,583	3,350
1	Implementación de los Centros de Recursos Virtuales de las Redes Educativas Institucionales de la Educación Básica Regular	Cajamarca, Cajabamba, Hualgayoc y Santa Cruz	299,421	63,635
1	Instalación de los Servicios de los Centros de Recursos para el Aprendizaje en las Redes Educativas de Supayacu y Los Naranjos	San Ignacio	600,874	45
1	I.E. N 82029 del Centro Poblado Agocucho	Cajamarca	1,145,680	223
TOTAL			150,554,929	191,861



Prioridad: Infraestructura Educativa

19 perfiles en elaboración

N°	Perfiles en elaboración	Provincias
1	Instalación y Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Inicial en La Palma, Chames, Los Toches, San Juan de Cuñacales, El Cuadrado, Progresopampa, Chalapampa Alto, Chugur, Callayuc, San Luis, El Anís, Tangalbamba Alto, Chanta Alta, Catudén y Edelmira	Chota, Hualgayoc, Cutervo, Cajabamba, Cajamarca, Contumazá y San Marcos
2	Instalación de Servicios de EIE en los Centros Poblados de La Tranca, El Cruce, Totorá, Montegrande, Tabloncillo, Charape, Guayabal, Manchara, La Unión, San Antonio de Pajón, Altamiza, Alto Dorado y Los Naranjos	Chirinos, Huarango La Coipa, Tabaconas San Ignacio, Namballe San José de Lourdes
3	Mejoramiento de los Servicios Educativos de Nivel Primario de la I.E. N° 16981 Comunidad Nativa Alto Naranjos y la I.E. N°17357 Comunidad Nativa Nuevo Kucha Distrito de San José de Lourdes	San Ignacio
4	Mejoramiento de los Servicios Educativos de Nivel Primario y Secundario N° 16524 Comunidad Nativa Los Naranjos, Distrito de San José de Lourdes, Provincia de San Ignacio	San Ignacio
5	Mejoramiento de I.E primaria (IEP) N° 1791 en Las Mercedes, IEP N° 17626 en San Francisco	San Ignacio
6	Mejoramiento del Servicio Educativo de la I. E. N° 16514 Caserío EL Balsal, I. E. N° 16511 Caserío La Jalca, I. E. N° 16766 Caserío El Huabo, I E. N° 17385 Caserío Las Abejas Distrito De Namballe	San Ignacio
7	Mejoramiento del Servicio Educativo de las: I. E. N° 16645 Caserío Miracasa, I. E. N° 17643 Caserío Ramón Castilla, I. E. N° 17634 Caserío Corazón de La Naranja, I. E. N° 17644 Caserío Pueblo Libre, Distrito de Namballe.	San Ignacio



Continúa...



Prioridad: Infraestructura Educativa

N°	Perfiles en elaboración	Provincias
8	Mejoramiento de los Servicios Educativos de Nivel Primario en la Comunidad Nativa de Supayacu, distrito de Huarango	San Ignacio
9	Mejoramiento de los Servicios Educativos de Nivel Secundario de la Institución Educativa en la Comunidad Nativa de Supayacu, distrito de Huarango	San Ignacio
10	Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Secundario en las Localidades de Vista Alegre, Santa Rosa de Chumbil, Carrerapampa, Jancos y Capilla de Unanca de los distritos de Tumbadén y San Pablo	San Pablo
11	Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Inicial en las Localidades de San Luis, Jancos, Capilla de Unanca, Cuscudén, Sapotal, Tuñad y El Jardín N° 60 – San Pablo, de Los Distritos de San Luis, San Bernardino y San Pablo	San Pablo
12	Mejoramiento del Local Institucional de la Unidad de Gestión Local (UGEL) San Pablo	San Pablo
13	Instalación y Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en las Localidades de San Isidro, Miraflores, Cutervo, Chibulgán, Barbasco, Paric, La Laguna, Pajurillo y Palo Quemado en Los Distritos de Callayuc, Choros, Cutervo, Querocotillo y Santo Domingo	Cutervo
14	Instalación y Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en las Localidades de Tambillo, San Juan de Tapuzca, Shimana, Unión, Taylin, Lama Lama, Vista Alegre, Las Mercedes y Palla Peña en los Distritos de Pomahuaca, Pucará, Sallique, San Felipe, Santa Rosa, San José de Lourdes y Tabaconas	Jaén San Ignacio
15	Instalación y Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en las Localidades de Pampas Chancas, Chorobamba, Quínua Cruz, Campo Alegre, Chuco y Pizón en Los Distritos de Cachachi, Cajabamba, Eduardo Villanueva, Pedro Gálvez y Miguel Iglesias	Cajabamba San Marcos Celendín



Continúa...



Prioridad: Infraestructura Educativa

N°	Perfiles en elaboración	Provincias
16	Instalación y Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en las Localidades de Auque Alto, La Hualanga, Liclipampa, Chala Alan, Chulipampa, San Francisco, San Pedro, La Palma y Chiut en Los Distritos de Bambamarca, Hualgayoc, Conchán, Tacabamba y Anguía	Hualgayoc Chota
17	Mejoramiento del Servicio Educativo en las Instituciones Educativas de Nivel Secundario en las Localidades de Chanshapamba, Malca y Tabacal	Cajabamba
18	Ampliación y Mejoramiento de la I.E. de Educación Superior Tecnológica Pública José Sabogal Diéguez	Cajabamba
19	Mejoramiento del Servicio Educativo en las I.E. de Nivel Primaria de las Localidades de San Jorge, Chilacat, Salcot y la Travesía	Contumazá



Prioridad: Disminución de la desnutrición crónica infantil

Se ha disminuido el porcentaje de desnutrición crónica en niños menores de 5 años de 40.5% a 36.1%, en el periodo 2010 al 2012.

Actividades:

- ✓ Implementación de 106 centros de promoción y vigilancia de la madre y el niño para el seguimiento nutricional.
- ✓ Entrega de 684 refrigeradoras y congeladoras a 340 establecimientos de salud, para la conservación de vacunas (42% EE.SS). En el siguiente semestre por entregar 580 congeladoras y refrigeradoras.
- ✓ 58,178 niños menores de 5 años atendidos en Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED), administración de sulfato ferroso y en vacunación.
- ✓ 10,883 familias con niños menores 12 meses que reciben Consejería nutricional



Prioridad: Disminución de la mortalidad materna neonatal

Las intervenciones para disminuir la mortalidad materna está dando resultados de 22 muertes en el I Semestre 2012 se ha reducido a 15 en el mismo período del 2013.

12 semanas sin muertes maternas, Cajamarca es una de las 5 regiones que contribuye al logro del quinto objetivo del milenio de la ONU

Actividades:

- ✓ El Hospital Regional Cajamarca dispone de sangre segura para la atención de emergencias maternas.
- ✓ Se ha implementado el servicio de hemodiálisis para salvar las vidas de las madres con complicaciones renales.
- ✓ Implementación con 2 incubadoras, 2 equipos fototerapia y 3 médicos neonatólogos para la unidad de cuidados intensivos neonatales, con inversión 718,583.
- ✓ 729 Juntas vecinales y 120 Rondas Campesinas trabajando en la vigilancia comunitaria de la salud materna infantil.
- ✓ 7,765 familias con gestantes que reciben consejería nutricional



Somos referente nacional en vigilancia y control epidemiológico

Actividades:

- ✓ Hemos controlado el Dengue disminuyendo el número de casos de 3,167 en el 2012 a 119 en el 2013, intensificando las actividades preventivo promocionales.
- ✓ Se reconoce la capacidad de respuesta de los trabajadores de salud.
- ✓ Se vienen implementando el Plan Regional de vigilancia y control de la influenza H1N1, contando en la actualidad sólo con 9 casos confirmados.



Prioridad: Mejorar la capacidad de respuesta de los servicios de atención primaria y hospitalaria

Actividades:

- ✓ Se ha invertido 8'436,666 para el equipamiento de establecimientos de salud y Hospitales para atención prioritaria de la madre y el niño.
- ✓ 1,000 trabajadores de salud capacitados en temas de salud materno infantil (50 pasantías en el Hospital Regional para atención de emergencias obstétricas y neonatales).
- ✓ Contratación de 150 profesionales y técnicos de enfermería para la atención integral de la madre y el niño.
- ✓ Entrega de 12 ambulancias a establecimientos de salud: Chota (03), Cutervo (06), Cajamarca (01) y Celendín (02).



Prioridad: Mejorar la capacidad de respuesta de los servicios de atención primaria y hospitalaria

Actividades:

- ✓ 2,759,886 en adquisición de equipos para operaciones del corazón.
- ✓ Incremento de nuevas especialidades: Cirugía cardiovascular, Nefrología, Neurología, Endocrinología, Cardiología intervencionista y neurocirugía.
- ✓ Incremento de Atenciones:

Servicios	Atenciones	
	2012	I Semestre 2013
Consulta externa	21,297	40,262
Emergencia	11,980	16,080
Intervenciones quirúrgicas	1,178	2, 463
Hospitalización	4,268	6, 314



Prioridad: Mejorar la capacidad de respuesta de los servicios de atención primaria y hospitalaria

Actividades:

- ✓ Implementación de nueva escala remunerativa a personal contratado del primer nivel de atención, para retener profesionales en zona rural

TIPO DE PERSONAL	ANTES	NUEVA ESCALA			
		Urbano	Periurbano (15%)	Rural (35%)	Extremo Rural (60%)
Médicos	1,800 a 2,800	2,600	2,990.00	3,510	4,160
Profesionales no médicos	900 a 2,200	1,500	1,725.00	2,025	2,400
Técnicos	700 a 1,100	1,000	1,150	1,350	1,600

Para los Establecimientos de Salud ubicados en extremo rural (hasta 4 horas de distancia) a partir de allí por cada 2 horas se incrementara 100.00 nuevos soles más.



Prioridad: Mejorar la capacidad de respuesta de los servicios de atención primaria y hospitalaria

Actividades:

- ✓ Se ha incrementado el número de Recursos Humanos en Salud a Nivel Regional

TIPO DE PERSONAL	2010	2011	2012	2013	INCREMENTO
MÉDICOS	391	456	479	540	149
OBSTETRICES	454	556	597	665	211
ENFERMERAS	762	854	929	989	227
ODONTOLOGOS	79	96	96	121	42
OTROS PROFESIONALES	235	273	306	349	114
TÉCNICOS ASISTENCIALES	1783	2163	2293	2303	520
ADMINISTRATIVOS	267	280	333	343	76
TOTAL	3,971	4,678	5,033	5,310	1,339

2013: Del total de médicos, 135 son médicos especialistas



Prioridad: Mejorar la capacidad de respuesta de los servicios de atención primaria y hospitalaria

Inversión en 05 hospitales en la Región


TIPO: HOSPITAL II – 2
BENEFICIARIOS: 376,865 HAB.
INVERSIÓN: 72.5 MILLONES
ESTADO: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO (OBRA ADJUDICADA POR CONCURSO OFERTA, AVANCE 5%)

TIPO: HOSPITAL II – 1
BENEFICIARIOS: 62,456 HAB.
INVERSIÓN: 34 MILLONES
ESTADO: PROCESO DE LICITACIÓN PARA ELABORACIÓN DE EXP. TEC.

TIPO: HOSPITAL II – 1
BENEFICIARIOS: 131,932 HAB.
INVERSIÓN: 35.9 MILLONES
ESTADO: NUEVA CONVOCATORIA PARA ELABORACIÓN DE EXP. TEC.

TIPO: HOSPITAL II – 1
BENEFICIARIOS: 123,432 HAB.
INVERSIÓN: 29.9 MILLONES
ESTADO: PROCESO DE SANEAMIENTO DE TERRENO.

TIPO: HOSPITAL II – 1
BENEFICIARIOS: 78,640 HAB.
INVERSIÓN: S/. 32.6 MILLONES
ESTADO: EXPEDIENTE TÉCNICO EN CULMINACIÓN (95%),

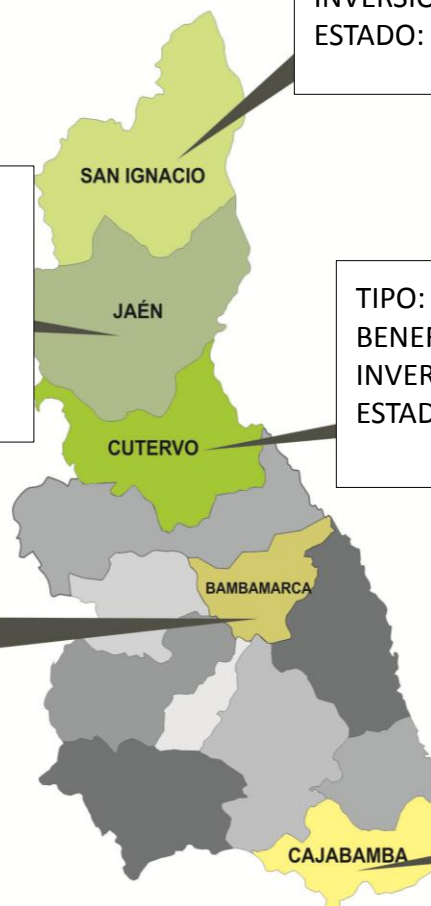

Prioridad: Mejorar la capacidad de respuesta de los servicios de atención primaria y hospitalaria

3.3 millones de soles invertidos en 2 establecimientos de salud, que beneficia a 89,034 personas, entregados a la ciudadanía.

Proyectos Concluidos	Provincia	Monto de Inversión (S/.)	Beneficiarios
Centro de Salud Morro Solar	Jaén	1,342,473	21,559
Establecimientos de Salud: Ambato Tamborapa, Vista Alegre de Chingama y San Agustín	Jaén	1,998,084	67,475
TOTAL		3,340,557	89,034



Prioridad: Mejorar la capacidad de respuesta de los servicios de atención primaria y hospitalaria

2.4 millones de soles se está ejecutando en infraestructura de salud, el cual beneficiará a 10,126 personas.

N°	Proyectos en Ejecución	Provincia	Monto de Inversión (S/.)	Beneficiarios	% avance
1	Centro de Salud Cabracancha	Chota	1,268,891	7,549	80%
2	Puesto de Salud Corazón de María - Socorro - Lajas	Chota	578,370	477	80%
3	Puesto de Salud Cesara, Red San Ignacio, DISA Jaén, Distrito de Namballe	San Ignacio	553,728	2,100	53%
TOTAL			2,400,989	10,126	



**CENTRO DE SALUD
CABRACANCHA**



**PUESTO DE SALUD CORAZÓN DE
MARÍA**



Prioridad: Mejorar la capacidad de respuesta de los servicios de atención primaria y hospitalaria

Expediente técnico en elaboración

N°	Expediente Técnico en Elaboración	Provincia	Monto de Inversión (S/.)	Beneficiarios
1	Establecimiento de Salud Catán, ubicado en la Red Chilete de la Red de Contumazá	Contumazá	530,661	1,500

Perfil Viable

N°	Perfil Viable	Provincia	Monto de Inversión (S/.)	Beneficiarios
1	Mejoramiento del Sistema de Referencia y Contra Referencia desde la Comunidad a Establecimientos de Salud Según Nivel de Complejidad en las Microredes	Celendín	8,929,624	61,221



Prioridad: Mejorar la capacidad de respuesta de los servicios de atención primaria y hospitalaria

5 perfiles en elaboración

N°	Perfiles en Elaboración	Provincias
1	Instalación, Implementación de Servicios de Salud Especializados en la Jurisdicción de Cajamarca, San Miguel, Celendín, San Pablo, Cajabamba, Contumazá, San Marcos.	Cajamarca, San Miguel, Celendín, San Pablo, Cajabamba, Contumazá, San Marcos
2	Instalación, Implementación de Servicios de Salud Especializados en la Jurisdicción de Jaén, San Ignacio	Jaén San Ignacio
3	Mejoramiento del Crecimiento y Desarrollo de los Niños y Niñas desde la Gestación hasta los 5 años de Edad en la Provincia de Chota	Chota
4	Mejoramiento de los Servicios de Salud en la Microred de Huambocancha Alta, Porcón Alto, Granja Porcón y Quilcate Alto	Cajamarca
5	Mejoramiento de los Servicios de Salud de la Micro Red Morro Solar.	Jaén



Prioridad: Saneamiento Básico

439 millones en ejecución en Saneamiento Básico para beneficiar a 226,983 personas, avanzando con 24,937 conexiones domiciliarias de agua y 33,298 conexiones domiciliarias en desague.



PAFE III	MONTO DE INVERSIÓN	BENEFICIARIOS	CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA	CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGUE	AVANCE
GRUPO C	118.4	117,891	7,114	8,987	100%
GRUPO B	137.2	47,225	9,933	9,598	85.5%
GRUPO A	183.8	61,867	7,890	14,713	99.87%
TOTAL	439.4	226,983	24,937	33,298	



PTAP DE SAN MARCOS



EXCAVACIÓN BAMBAMARCA



ALCANTARILLADO DE CUTERVO



PTAP DE SAN MIGUEL

**PROBLEMÁTICA EN LA EJECUCION DE LAS
OBRAS DEL PROGRAMA PE-P35:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SISTEMAS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES DE LAS PRINCIPALES
CIUDADES DEL DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA - I ETAP”**



GRUPO A		
DESCRIPCION	SITUACION	MEDIDA CORRECTIVA
SAN PABLO		
1.- CAPTACIÓN	No se cumplió con la meta - El Reservorio de 30 m3 (San Pedro), Mejoramiento de Captación San Pedro y su Línea de Conducción, no fueron ejecutadas debido a la oposición de los pobladores del barrio de San Pedro de esta ciudad ya que ellos se abastecen en forma independiente de otra fuente de agua.	Se reducirá meta física.
2.- CONDUCCION		
SAN MIGUEL		
1.- CAPTACIÓN	No se cumplió con la meta - Captación Tayka y la Línea de Conducción de Agua Potable, desde esta captación hasta la PTAP, no fueron ejecutadas porque los agricultores y usuarios del canal existente no lo permitieron. Esta decisión fue informada por el Ingeniero con Carta N° NJS/DP-CAJ-489-2011 de 29.09.2011.	Mejoramiento de la toma del canal. Se reducirá meta física.
2.- CONDUCCIÓN		
CONTUMAZA		
1.- CAPTACIÓN	No se cumplió con la meta - Mejoramiento de la estructura de captación en manantial Montegrande y el Mejoramiento de captación existente Shamon, no se ejecutó por la falta de disponibilidad del terreno por parte del propietario.	Se reducirá meta física.



GRUPO A		
DESCRIPCION	SITUACION	MEDIDA CORRECTIVA
CELENDIN		
1.- CAPTACIÓN	No se cumple con la meta – No se termina los trabajos de Rehabilitación de la captación Molinopampa ni la ejecución de los 340 ml faltantes para la Línea de Conducción, porque la población de agricultores de Molinopampa no acepta resolución aprobada y vigente del 2004 por el ALA, se ha solicitado a la MP Celendín tramite ante el ALA, por ser competencia exclusiva municipal, sin resultados a la fecha.	Se empalma los 340 ml de la LC antigua a la nueva Línea de Conducción. Se reducirá meta física.
2.- CONDUCCION		
5.- REDES DE AGUA Y C.D.	No se cumple con la meta en su totalidad – Debido a la oposición de los pobladores. Hasta ahora se lleva ejecutado 40,586 ml de los 44,301 ml del Proyecto.	Se reducirá meta física.
6.- REDES DE ALCANTARILLADO Y C.D.	No se cumple con la meta en su totalidad – Debido a la oposición de los pobladores. Hasta ahora se lleva ejecutado 32,685 ml de los 40,073 ml del Proyecto.	Se reducirá meta física.
SAN MARCOS		
3.- ALMACENAMIENTO	Se cumplió parte de la meta – Se construyó el Reservorio de 180m3 (El Calvario), pero no se hizo el Reservorio de 120m3 (El Choloque) por falta de adquisición del terreno por parte de la Municipalidad.	Para el funcionamiento del sistema se utiliza el Reservorio existente contiguo de 100 m3. Se reducirá meta física.



GRUPO B		
DESCRIPCIÓN	SITUACION	MEDIDA CORRECTIVA
CHOTA		
2.- CONDUCCIÓN	En Línea de Conducción Conchano: se cambió de trazo por terrenos inestables. Tramo de interconexión de Reservorios 1100 m3 y 950m3, no se ejecuta por alto costo de servidumbre (S/. 45,000.00).	Se reducirá meta física.
7.- PT AGUA RESIDUAL	Se adquirió terreno, se efectúa trabajos de sensibilización ante oposición de pobladores del sector Pingobamba Bedoya.	De continuar oposición, se reducirá meta física.
CUTERVO		
5.- REDES DE AGUA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS	Falta ejecutar 618.0m y 88 conexiones domiciliarias. Existe reducción de metas de 1485.0m y 147 conexiones domiciliarias por oposición de usuarios. Falta instalar los micromedidores.	Por oposición social se ha planteado realizar trabajos solo para el cierre de circuitos.
6.- REDES DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS	Falta ejecutar 842.0m y 96 conexiones. domiciliarias. Existe reducción de meta de 960.0m de red y 135 conexiones domiciliarias. Domiciliarias por oposición de usuarios.	Por oposición social se ha planteado realizar trabajos sólo para el cierre de circuitos.
7.- TÚNEL	Avance en Túnel de 600 m. Los trabajos a ejecutar en canal de ingreso tiene excavaciones entre 2.50m a 22.00m, en el caso de canal de salida las excavaciones van hasta 7.00m. Servidumbre de paso se soluciono al 98%, expectativas económicas de los propietarios son altas.	Se ha solicitado se resuelvan deudas con terceros a fin de obtener licencia social que permita la culminación de metas contractuales.



GRUPO B		
DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA
BAMBAMARCA		
1.- CAPTACIÓN	No se cuenta con libre disponibilidad de terrenos, propietario privado solicitaron cancelación de S/. 1,200,000.00	Se reducirá meta física. Para abastecimiento de la parte alta se implementa la ejecución de la alternativa 03 del estudio de pre inversión (abastecimiento por bombeo de 10 lps aprox.), desde Tres Chorros al reservorio de 260 m3
2.- CONDUCCIÓN	LC Bellavista, No libre disponibilidad de terrenos para captación.	Se reducirá meta física.
3.- ALMACENAMIENTO	Al no construirse la línea de conducción Bellavista no se construyen los 06 reservorios en zona rural. Construcción de reservorio de 260m3 en zona urbana al 80%. Resta el equipamiento hidráulico.	Se reducirá meta de reservorios en zona rural
4.- REDES DE AGUA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS	Falta ejecutar 832m en redes y 405 conexiones domiciliarias y 3,975 micromedidores. La reducción de meta es de 2,359m en redes y 452 conexiones domiciliarias por oposición de pobladores.	Se reducirá meta física
5- REDES DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS	Falta ejecutar 621m en redes y 142 conexiones domiciliarias. La reducción de meta es de 1,294m y 182 conexiones domiciliarias por oposición de pobladores.	Se reducirá meta física
6.- PT AGUA RESIDUAL	No se tiene disponibilidad de terreno por oposición de Comunidad Ahijadero y Capulí.	Se reducirá meta física
7.- EMISOR	No se tiene disponibilidad de terreno por oposición de Comunidad Ahijadero y Capulí	Se reducirá meta física

GRUPO B		
HUALGAYOC		
1.- CAPTACIÓN	No se cuenta con libre disponibilidad de terreno por Sr. EDGAR REGALADO. El empalme de la nueva línea se efectuará con la captación existente.	Se reducirá meta física.
2.- CONDUCCIÓN	En la Línea de Conducción La Huaylla, se analiza la reducción de las 02 cámaras rompe presión debido a que la minera a instalado una pequeña PTAP.	Se reducirá meta física.
6.- PT AGUA RESIDUAL	Terreno fue reubicado hasta en 02 oportunidades por relaves mineros y propiedad de terceros. Avance de 7.5% con la construcción de muro de sostenimiento. Se tiene oposición para el acceso por parte de propietario del terreno para la PTAR	Existe compromiso de la MD de Hualgayoc para resolver impase subsistente.



GRUPO C		
DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA
JAÉN		
5.- PT AGUA POTABLE	Se cumplieron las metas establecidas. No obstante se requiere realizar trabajos para alimentación eléctrica no considerados en el expediente técnico original.	Se coordina resolver con la EPS Marañón con la suscripción de un Convenio específico.
6.- REDES DE AGUA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS	El número de conexiones domiciliarias no se alcanzó debido a la no suscripción oportuna de los contratos correspondientes entre la EPS y los usuarios. Algunos medidores no se cambiaron originando una cantidad menor al número de conexiones ejecutados. El saldo de medidores fue entregado a la EPS para su futuro empleo.	Se coordina resolver con la EPS Marañón con la suscripción de un Convenio específico.
7- REDES DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS	El número de conexiones domiciliarias no se alcanzó debido a la no suscripción oportuna de los contratos correspondientes entre la EPS y los usuarios.	Se coordina resolver con la EPS Marañón con la suscripción de un Convenio específico.



Prioridad: Saneamiento Básico

01 proyecto en ejecución

N°	Proyecto Ejecutado	Provincia	Monto de Inversión (S/.)	Beneficiarios	% Avance
1	Construcción del Sistema de Agua Potable por Bombeo para Caseríos del Sector Sur de Cutervo	Cutervo	6,590,540	6950	92

01 expediente técnico en elaboración

N°	Expediente Técnico en Elaboración	LOCALIDAD	MONTO DE INVERSIÓN (S/.)
1	Instalación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Linderos.	Jaén	4,321,250



Prioridad: Defensa de los Derechos Laborales

Actividades:

- ✓ 570 conciliaciones realizadas, de las cuales se han hecho efectivas con 157 empresas por un monto de 288,029.47 n/s en beneficio del trabajador y se han solucionado 146 casos de manera directa luego de haber sido notificados a las audiencias de conciliación y 267 abandonaron el proceso de conciliación ambas partes.
- ✓ 787 actuaciones inspectivas realizadas en los diversos sectores, especialmente en obras de construcción civil, dentro de las cuales 135 actuaciones se han realizado en las provincias de Jaén y San Ignacio y 652 en las Provincias de Cajamarca, Chota, Hualgayoc, Celendín, Cajabamba, San Pablo, San Marcos y Santa Cruz respectivamente.



Prioridad: Capacitación y Orientación

Actividades:

- ✓ En este primer semestre del 2013 se ha logrado capacitar a 1,516 trabajadores de 9 de las 13 Municipalidades Provinciales de la Región, en temas de: Derechos Individuales y Colectivos, Seguridad y Salud en el Trabajo, y Contratos de trabajo. Con la finalidad de generar una Cultura de Prevención a la vulneración de los derechos de los trabajadores.
- ✓ 864 alumnos evaluados por el servicio de Orientación Vocacional en las provincias de Cajamarca, Jaén y San Ignacio.
- ✓ A través de la Bolsa de Trabajo se ha logrado insertar al campo laboral a 465 personas en diversas empresas de la Región, superando la meta anual programada (400).





Eje Económico

Por una Gran Región

Censo Agropecuario 2012 Cajamarca:

- ✓ 33,317.5 Km² de superficie
- ✓ 67.8 % población rural
- ✓ 340 mil Unidades Agropecuarias (1° en el país).
- ✓ 703,445 vacunos (1° en el país).
- ✓ 532,432 parcelas (1° en el país).
- ✓ 60% PEA - Agricultura
- ✓ 1.2 % PEA – Minería.
- ✓ Región eminentemente agrícola y ganadera.

Pago de Bonos Agrarios

- ✓ La reforma Agraria rescató 15,994 fundos de manos de los hacendados, siendo aproximadamente 9 millones 520 hectáreas, Desde entonces comenzó la historia de los bonos de la reforma agraria, en el Gobierno de Fujimori se dictaron leyes (1996) por las cuales se establecía que el Estado no debía indemnizaciones sino bonos, y que estos se cancelarían a su valor nominal.
- ✓ A la fecha la deuda es de US\$1,200 millones y con intereses asciende a US\$ 4,000 millones, representando el 6% de las reservas internacionales, los cuales serían destinados a un grupo de empresarios.

La pregunta es ¿Quién indemniza a las miles de personas que trabajaron gratis por años para los hacendados?



Prioridad: Asociatividad y Financiamiento Rural

- ✓ **6 Cooperativas constituidas**, en los corredores económicos del Crisnejas, Jequetepeque, Alto Zaña, Centro y Norte , asociando a 2,232 productores, logrando ofertar palta, chirimoya, mango, café, por un volumen de 81 Tm y una transacción comercial de 286 mil Nuevos Soles.
- ✓ **9.7 Millones de soles** para el fortalecimiento de las Agencias Agrarias para contribuir al fortalecimiento de la Asociatividad agraria en la región.
- ✓ **1.5 millones de soles** para fomentar la competitividad de las cadenas productivas y la agroindustria rural para financiar proyectos del PROCOMPITE, ejecutándose en las provincias de San Ignacio, Jaén y San Miguel, beneficiando a 1,662 familias.



Prioridad: Asociatividad y Financiamiento Rural

- ✓ **3.8 Millones de soles** gestionados ante Agroideas a través de planes de negocio, en proceso de viabilidad, beneficiando a 655 familias.
- ✓ **4 Millones de soles** para mitigar los daños de la Roya Amarilla del Café en la Región Cajamarca que han afectado a 13,200 productores en 26,100 Ha. Atendiéndose a la fecha a 6,000 productores en una extensión de 3,000 Ha.
Siendo reconocidos por la Junta Nacional del Café como la única región eficiente en el cumplimiento de metas para controlar esta plaga endémica.
- ✓ En las 13 Agencias Agrarias se viene produciendo 400 mil plántones entre palta, café, tara y pino; para incrementar la frontera agrícola en 652 Ha. en toda la región.
- ✓ A través del CORECITI se han financiado 03 proyectos de investigación: Fasciola Hepática y almacenamiento de Aguaymanto (Cajamarca) y plagas en bosques de tara (San Marcos).



Prioridad: Recuperación y puesta en valor de ferias tradicionales

- ✓ Feria Regional Fongal Cajamarca.
- ✓ 13 Ferias Agropecuarias provinciales.
- ✓ Feria de Integración Regional Gallito Ciego (Cajamarca, Lambayeque, La Libertad).
- ✓ Feria Bi Regional Cajamarca – Lambayeque.
- ✓ Feria Bi Nacional Perú – Ecuador.



Prioridad: Formalización de Predios Rurales

Actividades:

- ✓ 4,840 títulos entregados con el aporte del Gobierno Regional de 200 soles por título.
- ✓ 3,574 títulos por entregar.
- ✓ 3 Comunidades Campesinas tituladas: Rodeopampa, Fila de Choropampa y Pomabamba, beneficiando a 349 familias con una extensión de 520 Ha.



Prioridad: Riego Tecnificado

8.2 millones en EJECUCIÓN, para incorporar 617 Ha. que beneficiarán a 727 familias.

N°	Proyectos en Ejecución	Provincia	Inversión (S/.)	Hectáreas	Familias Beneficiadas	Avance Físico
1	El Tablón y Juan Velazco	San Ignacio	3'089,131	233	88	90%
2	Santa Ana – Cajabamba	Cajabamba	1'233,878	110	90	67%
3	Tres Puentes - San Pablo	San Pablo	678,589	163	185	88%
4	Sistema Tecnificado de Riego Dos de Mayo	San Ignacio	937,668	09	61	90%
6	Riego por Aspersión en el Centro Poblado de Morán Lirio	Hualgayoc	2'345,759	102	303	80%
TOTAL			8'285,025	617	727	



Prioridad: Riego Tecnificado

03 expedientes técnicos aprobados, para incorporar 840 Ha., 8 Km. de canales, que demanda una inversión de 7.2 millones.

Expedientes Técnicos Aprobados	Provincia	Monto de Inversión (S/.)	Beneficiarios	Meta		
				Km. Canales	Ha. Incorporadas y / o mejoradas	Sistema de Riego
Mejoramiento de Infraestructura del Canal de Riego Zonanga Alto*	Jaén	2,585,381	138	5.426	558.38	2
Instalación del Sistema de Riego Lluchubamba, Distrito Sitacocha,**	Cajabamba	3,126,360	135	2.12	202.5	2
Mejoramiento de Infraestructura Canal de Riego Chililique – Montegrande.*	Jaén	1,515,154	1215	0.6	79.26	1
Total		7,226,895	1,488	8	840	5

****Proyectos transferidos al Proyecto Especial Jaén-San Ignacio Bagua para su ejecución.***

***** Inicio de ejecución por el GORECAJ, en el segundo semestre.***



Prioridad: Riego Tecnificado

12 Expedientes Técnicos en elaboración, para incorporar 2,708 Ha. bajo riego con 85.5 Km. de canales, beneficiando a 6,041 familias, que demandará una inversión de 46 millones.

Cantidad	Expedientes Técnicos en Elaboración	Provincia	Monto de Inversión (S/.)	Beneficiarios	Meta	
					Km. Canales	Ha. Incorporadas y / o mejoradas
02	Riego tecnificado en Cumbico, Magdalena / Aranmarca	Cajamarca	6'875,189	2,106	18.9	440
02	Riego en el valle del Manta y Colaguay, Pomahuaca / Quebrada El Palmo, San Felipe.	Jaén	9'564,275	443	9.9	433
02	Riego en el C.P. Salacat, Sorochuco / Sistema de Riego Santa Rosa Cortegana	Celendín	9'165,853	510	6.6	580
02	Servicio de agua para riego en las localidades de Shirac Punta, Jucat y Malcas / Riego Huagal	San Marcos	4'782,880	597	23.5	566
02	Riego tecnificado Molino Cunish – La Laguna – Sangal/ Construcción del canal Chacapampa Tumbadén	San Pablo	6'972,628	1,320	2.3	200
01	Servicio de agua para riego de los canales Lanchez Arteza, Arteza Canchán, Hanchipán, Arteza Mascota	San Miguel	3'689,673	755	24.4	189
01	Instalación del servicio de agua del sistema de riego del Caserío de Santa Catalina, Distrito Cupisnique.	Contumazá	4'980,072	310		300
TOTAL			46'030,570	6,041	85.5	2,708

Prioridad: Riego Tecnificado

09 Perfiles viables de Riego para incorporar 3,913 Ha., beneficiando a 5,450 personas, que demanda una inversión de 52 millones.

Cantidad	Perfiles Viables	Localidad	Monto de Inversión	Beneficiarios	Ha. incorporar y/o mejorar
01	Sistemas de Riego del C.P. Huambocancha Alta	CAJAMARCA	1'793,838	219	350
03	Sistema de Riego en Tuñad Hualabamba. Sistema de Riego Iglesiapampa, Chorroblando y Yerbasanta. Sistema de Riego Microcuenca Yamichad-Zona Baja.	SAN PABLO	15'017,851	1,586	1,148
03	Servicio de Agua de la Comunidad Licupis y anexos Servicio de Agua Sectores de Carniche Alto y Bajo y Huanabal Servicio de Agua de Tocmoche	CHOTA	25'774,517	1,021	1,212
01	Sistema de Riego El Paraíso, La Huaca, Limón Chuaquillo, Los Faiques, Bombocacongona, Colapón y San Gerardo de Charcas	JAÉN	4'505,577	1,554	549
01	Sistema de Riego Presurizado San Juan De Cutervo	CUTERVO	5'034,761	1,070	654
TOTAL			52'126,544	5,450	3,913

Prioridad: Riego Tecnificado

21 perfiles para riego en proceso de formulación para incorporar 9,001 Ha., beneficiando a 6,890 personas, que demandará una inversión de 120.6 millones.

Canti dad	Perfiles en elaboración	Provincias	Monto de Inversión	Beneficiarios	Ha. incorporadas y/o mejoradas
03	Sistema de riego del CP. Yurayacu/Mejoramiento del canal de riego Miracosta /sistema de riego del caserío de Chiribamba	Chota	15'954,654	1,565	1,400
02	Sistema de riego Yangua, distrito Sallique/Sistema de Riego Chalanmache, distrito Sallique	Jaén	8'729,741	178	807
02	sistema de riego canal el Apto Catache/sistema de riego de los canales Montegrande, Molino 1, Molino 2 y Mayobamba, la Esperanza	Santa Cruz	8'303,730	511	859
04	Sistema de riego Penipampa y Pomabamba / Servicio de Riego el Muyoc / Sistema de riego Alfonso Ugarte, Shitamalca y Chuco / Sistema de Riego Malat	San Marcos	16'578,026	1,186	1,050
04	Riego Pishuanga, Campana Pampa Grande / Sistema de riego Cachachi / Riego sector San Isidro Jocos / Riego Parubamba	Cajabamba	15'439,223	1,330	1,200
02	Sistema de riego San Silvestre de Cochán / Sistema de riego Niepos	San Miguel	11'669,637	328	1,090
01	Mejoramiento e Instalación de Riego Tecnificado del Sistema de Riego la Cocha - Puquio, Distrito de Contumazá	Contumazá	9'962,118	182	395
01	Mejoramiento del servicio de agua para riego Cuzcudén, Centro Poblado de Cuzcudén, Distrito de San Pablo	San Pablo	4'244,504	330	280
01	Mejoramiento del Canal Batancucho – El Enterador, Distrito Bambamarca, Provincia Hualgayoc	Hualgayoc	4'688,998	430	420
01	Represamiento e instalación del servicio de agua del sistema de riego en la microcuenca Chochoguera	Cajabamba	25'000,000	850	1,500
TOTAL			120'570,621	6,890	9,001

Prioridad: Proyectos Productivos

03 perfiles en elaboración de proyectos productivos, beneficiando a 32,475 personas, que demandará una inversión de 50.9 millones de soles.

N°	Perfiles en elaboración	Provincias	Estado	Monto de Inversión	Beneficiarios
01	Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de cultivos andinos (Quinua, Haba y Tarwi).	Cajabamba, Cajamarca, Celendín, San Marcos, Chota, Hualgayoc, Cutervo y San Pablo	Viable	9'967,799	20,875
01	Instalación de Sistema de Cosecha de agua de lluvia y tecnificación de riego y cultivo rentable en la región.	Santa Cruz, Chota y Hualgayoc	Formulación	17'000,000	2,400
01	Mejoramiento de las Unidades de producción agropecuaria de los pequeños y medianos productores de la región (Chacras integrales).	Cajabamba, Cajamarca, Celendín, San Marcos, Chota, Hualgayoc, Cutervo, San Pablo, Santa Cruz, San Miguel y Contumazá	Formulación	24'000,000	9,200
TOTAL				50'967,799	32,475

Prioridad: Desarrollo Ganadero

Proyectos en ejecución:

- ✓ **9.8 Millones de soles** en la ejecución del proyecto de Control Integrado de Distomatosis Hepática, logrando un avance del 35%, y una atención a **6,120 productores** de **6 provincias** (Cajabamba, San Marcos, Celendín, San Pablo, San Miguel y Cajamarca); incluye la implementación de 01 laboratorio regional parasitológico - Reflotamiento de LABRENOR.
- ✓ **Estudio de factibilidad concluido:** "Mejoramiento de la competitividad de los productores de ganado bovino lechero en la región Cajamarca, por un monto de 27 millones para 44,325 beneficiarios de las 13 provincias del departamento, en evaluación por la OPI.



Prioridad: Producción Piscícola y Desarrollo de la Agroindustria

Actividades:

- ✓ Se ha fomentado la creación de 11 piscigranjas aumentando la producción a 188.73 Tm de trucha arcoíris.
- ✓ Siembra de paiche en Laguna Azul –San Ignacio (14 Ha) para determinar su potencialidad de su Uso en la pesca y acuicultura.
- ✓ **Formulación del Expediente Técnico** del Proyecto Recuperación de la capacidad productiva del Módulo Piscícola La Balza - San Ignacio, beneficiando a 526 productores, con un monto de inversión de 2.4 Millones de soles.
- ✓ Fortalecimiento de capacidades a 1,203 empresarios y emprendedores en gestión empresarial lográndose constituir 22 empresas.



Prioridad: Posicionamiento como destino Turístico

- ✓ 06 Proyectos Viables en Turismo, por un monto de inversión mayor a los 100 millones de nuevos soles. De los cuales se han presentado 04 al Plan COPESCO para su ejecución.

N°	Perfiles Viables	Monto Referencial del PIP
1	Instalación de los Servicios Turísticos de Disfrute del Entorno Paisajístico e Interpretativo del Centro Ceremonial Layzón, Distrito, Provincia y Región Cajamarca.	8'276,635
2	Mejoramiento e instalación de servicios turísticos públicos en el recorrido interno del corredor turístico Jaén – San Ignacio, Provincia de Jaén Provincia San Ignacio, Región Cajamarca	9'560,419
3	Instalación de servicios turísticos públicos en el circuito turístico Udimá - Poro Poro, distrito de Catache, provincia de Santa Cruz, Región Cajamarca.	6'910,110
4	Mejoramiento de los servicios turísticos públicos en el Complejo Arqueológico Kuntur Wasi, distrito y provincia de San Pablo, Región de Cajamarca	4'233,013
5	Instalación de servicios públicos en las cataratas y cascadas Qarwa Qiro y su entorno, distrito de Chetilla, Provincia y Región Cajamarca	7'637,588
6	Acondicionamiento turístico de la ruta Inca Chonta - Combayo y Puesta en valor de las Ventanillas de Combayo en la provincia y Región Cajamarca.	6'118,684
	TOTAL	100'406,528

Prioridad: Posicionamiento como destino Turístico

MUSEO REGIONAL DE LAS CULTURAS DE CAJAMARCA

- ✓ **Monto de Inversión: 57'670,079 nuevos soles**
- ✓ Con Código SNIP: 266731, encontrándose en evaluación por la OPI del Ministerio de Cultura.
- ✓ Comprende 6,275 m² de área construida y 3,600 m² de área libre.
- ✓ Se contará con 6 Ejes temáticos:
 - (Piso 1): Naturaleza, territorio y primeras culturas
 - (Piso 2): Centros Ceremoniales del Formativo
 - (Piso 2): La cultura Cajamarca: identidad regional
 - (Piso 3): Cajamarca y otras culturas
 - (Piso 3): La conquista europea
 - (Piso 4): Cajamarca hoy



Prioridad: Posicionamiento como destino Turístico

PUESTA EN VALOR Y ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LA RUTA DEL AGUA CUMBEMAYO

- ✓ **2,499,118 Nuevos Soles** financiados por el Gobierno Regional y Plan COPESCO.
- ✓ Contando con centro de interpretación, venta de artesanía, centros de producción, estacionamiento vehicular, sendero de piedra, veredas, sardineles, jardines, bancas y empedrados.
- ✓ Producto turístico entregado el día 10 de julio del presente año a la Dirección Regional de Cultura de Cajamarca para su administración.



Actividades:

- ✓ 510 Km. de intervención de las carreteras departamentales con un presupuesto de 9.53 Millones de nuevos soles, mejorando el nivel de transitabilidad .
- ✓ Implementación de la DRTC, con 3 volquetes de 15 m³, con una inversión de 1.5 millones.
- ✓ Transferencia de maquinaria por parte del MTC:
01 Planta de Asfalto, 01 Pavimentadora, 01 rodillo neumático, 01 rodillo liso vibratorio y 01 Planta chancadora.
- ✓ Mantenimiento y reparación del pool de maquinaria transferida por el MTC.



Gestión y conservación vial por niveles de servicio de 361.5 km. de red vial departamental y vecinal, con un presupuesto de S/. 224.7 Millones de nuevos soles.

CARRETERA	INVERSIÓN (Millones S/.)	Km	BENEFICIARIOS	AVANCE
EMP. PE-08 (Choropampa) – Cospán – Huayobamba – L.D. La Libertad. (Plazo: 5 años)	70.5	123.0	22,000	30%
Red vial vecinal provincias de Jaén y San Ignacio (*). (Plazo: 4 años)	154.2	238.5	465,000	15%
TOTAL	224.7	361.5	487,000	

Fuente: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones/Gerencia Sub Regional Jaén – San Ignacio

(*) Se resolvió el contrato de ejecución por niveles de servicio de Jaén – San Ignacio por falta de disponibilidad presupuestal, se ha proyectado la intervención por inversión.



12 proyectos de infraestructura vial en ejecución, con una inversión de 70.8 Millones, beneficiando a 87,918 personas.

N°	Proyectos En Ejecución	Provincia	Monto De Inversión (S/.)	Beneficiarios	% Avance
1	Construcción Carretera Shawindo-Anguyacu-Tuque	Chota	4,406,604	3,246	61.00
2	Construcción Puente Chamaya III	Cutervo	7,094,614	8,647	28.57
3	Creación del Camino Vecinal Ladrillera - Huabal - Santa Rosa, Distrito Callayuc, Provincia de Cutervo - Cajamarca	Cutervo	3,442,046	2,001	75.00
4	Construcción y Mejoramiento de la Carretera Puente San Francisco - Túpac Amaru	San Ignacio	2,306,183	2,753	100.00
5	Mejoramiento Carretera Ca-101, Tramo: Empalme Pe-1nf (Contumazá) - Yetón	Contumazá	7,342,067	6,265	8.18
6	Mejoramiento Camino Vecinal Tramo Emp.Ca-105 - La Palma-Conga El Verde y Tramo Emp. R-22 - La Libertad-EMP. R-114 - El Porvenir-Nvo Triunfo-EMP R-22-EMP R-23-Cruce El Naranjo-El Naranjo-EMP Ca-107 Chalamarca, Distrito de Chalamarca - Chota - Cajamarca	Chota	2,563,646	4,050	20.02



Continúa...



Prioridad: Infraestructura Vial

N°	Proyectos En Ejecución	Provincia	Monto De Inversión (S/.)	Beneficiarios	% Avance
7	Mejoramiento y Apertura de la Carretera José Gálvez - Jorge Chávez - La Ayacunga.	Celendín	3,642,091	4,500	32.87
8	Construcción Carretera Chimbán - Pión - Santa Rosa	Chota	5,465,751	2,282	93.10
9	Mejoramiento de la Carretera EMP. Pe-3n (Bambamarca) - Atoshaico - Ramoscucho - La Libertad de Pallán - EMP. Pe 8b (Celendín)	Hualgayoc Celendín	31,203,381	43,321	36.16
10	Rehabilitación y Mejoramiento del Servicio de la Trocha Carrozable Ichocán - La Tulpuna, Distrito de Ichocán, Provincia de San Marcos, Región Cajamarca	San Marcos	377,167	376	100
11	Mejoramiento Carretera Miravalles - Niepos	San Miguel	1,320,708	2,976	100
12	Mejoramiento del Servicio de Acceso Sobre el Río Silaco en la Trocha Carrozable La Ramada - Chimbán , Distrito de Chimbán - Chota - Cajamarca	Cuterno Chota	1,731,121	7,501	
	TOTAL		70,895,383	87,918	



Prioridad: Infraestructura Vial

02 Expedientes Técnicos de Infraestructura Vial en elaboración, beneficiando a 102,394 personas, demandando una inversión de 44 Millones

EXPEDIENTES TÉCNICOS EN ELABORACIÓN	PROVINCIA	MONTO DE INVERSIÓN (S/.)	BENEFICIARIOS	% AVANCE
Construcción Puente Las Paltas Sobre El Río Puclush – Saldo de Obra	San Miguel San Pablo	1,076,948	1,586	100.00
Mejoramiento Carretera Ca-103:emp.Pe-06b (Santa Cruz de Succhubamba)-Romero Circa-La Laguna-Tongod-Catilluc-EMP.Pe-06c(El Empalme)-Cajamarca	Santa Cruz San Miguel	43,166,143	100,808	60.00
TOTAL		44,243,091	102,394	

08 perfiles viables para la integración vial del Departamento beneficiando a 21,924 habitantes, demandando una inversión de 41 Millones de Nuevos Soles

N°	Proyectos viables	Provincia	Monto de inversión (S/.)	Beneficiarios	Km. Mejoras	Km. Apertura	Longitud Puente (m)
1	Construcción carretera Cortegana - San Antonio - El Calvario - Tres Cruces - Candén, distrito de Cortegana	Celendín	5,950,393	3,592		18.67	
2	Construcción del camino vecinal tramo Chanta Corrales - Amillas, distritos de Contumazá y Magdalena	Contumazá	4,983,124	2,775		19.48	
3	Mejoramiento del camino vecinal, tramo Cruce Santa Rosa hasta Cruce Oxapampa, distritos de Bambamarca y La Libertad de Pallán	Hualgayoc Celendín	8,649,094	3,090		32.27	
4	Construcción carretera Chumuch – Rambrán, Distrito de Chumuch	Celendín	5,678,036	1,000		22	
5	Apertura de la carretera tramo Alimarca – Canlle-Chiquinda – Ulluyupampa - Las Pajas, distrito de Gregorio Pita	San Marcos	8,790,431	1,127		22.67	
6	Mejoramiento y rehabilitación camino vecinal Cochamarca-La Laguna-Bellavista-Cortadera-Jalquilla-Illuca-las Pajas-Santa Cruz-Muyoc, distrito de Gregorio Pita	San Marcos	4,896,197	1,836	39.93		
7	Mejoramiento del servicio de acceso sobre el Río Silaco en la trocha carrozable La Ramada – Chimbán, distrito de Chimbán	Chota	1,731,121	7,501			50
8	Rehabilitación y mejoramiento del servicio de la trocha carrozable Ichocán - La Tulpuna	San Marcos	377,167	1,003	4.5		
TOTAL			41,055,563	21,924	44.43	115.09	50



07 perfiles en elaboración para la integración vial del departamento beneficiando a 29,669 habitantes, que demandará una inversión de 113 millones.

N°	Proyectos en elaboración	Provincia	Monto de inversión (S/.)	Beneficiarios	Km. Mejoradas	Km. Apertura	Km. Asfaltado	Longitud Puente (m)
1	Creación de la Carretera Tramo Supayacu - Chingozales, en el Distrito de Huarango	San Ignacio	4,500,000			13.3		
2	Mejoramiento de la Carretera Ruta CA 100 Emp. PE-3N - San Miguel de Pallaques – Dv. San Pablo - Quebrada Honda – San Gregorio - Sauce – Palo Blanco – Mirador – San Martín - Las Viejas - L.D. La Libertad (LI-100 a Chepén).	San Miguel	24,440,284	1,000	130			
3	Construcción de la carretera tramo Cochacongá - parejas - Miguel Grau - Candén - Musadén - Caparico - distrito de Cortegana - Chadín	Celendín Chota	36,015,012	16,466		41.6		
4	Mejoramiento del camino vecinal tramo cruce Bellavista - Puerto Marañón	Jaén	4,980,624	6,112			10.81	
5	Mejoramiento y Ampliación del tramo de carretera Emp. CA-109 (Llanguat) - Puente Río La Llanga - Pizón; Distrito de Celendín y Miguel Iglesias	Celendín	32,653,513	3,000	33			
6	Creación de puente carrozable sobre el río Miraflores en la comunidad nativa Los Naranjos , distrito de San José de Lourdes	San Ignacio	4,974,011	2,139				78
7	Construcción del puente carrozable Catagón y accesos en el distrito de Pedro Gálvez	San Marcos	6,274,217	952				122.25
TOTAL			113,837,661	29,669	163	54.9	10.81	200.25

Cierre de Brechas para Generar la Competitividad

COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN	CE %
Coeficiente de electrificación 2008	40.2
Programa de la Ampliación de la Frontera Eléctrica PAFE III	17.3
Otras intervenciones (Período 2009 - 2012)	14.5
Coeficiente de electrificación 2012	72
Contribución del PRER en ejecución	2.03
PRER a nivel de expediente técnico	3.74
PRER a nivel de estudio de pre inversión	6.39
PRER a nivel de plan de trabajo y TDR	0.52
Incremento del coeficiente de electrificación por el PRER	12.68
Total Coeficiente de Electrificación Cajamarca 2014	84.68



SER SANTA ROSA II ETAPA – RED SECUNDARIA



SER CUTERVO II ETAPA.




SER SAN IGNACIO III ETAPA – RED SECUNDARIA



Prioridad: Electrificación Rural-Etapa de energización y entrega

252 millones en ejecución en el Programa de Ampliación de frontera eléctrica – PAFE III, beneficiando a 216,825 personas, de 952 localidades.

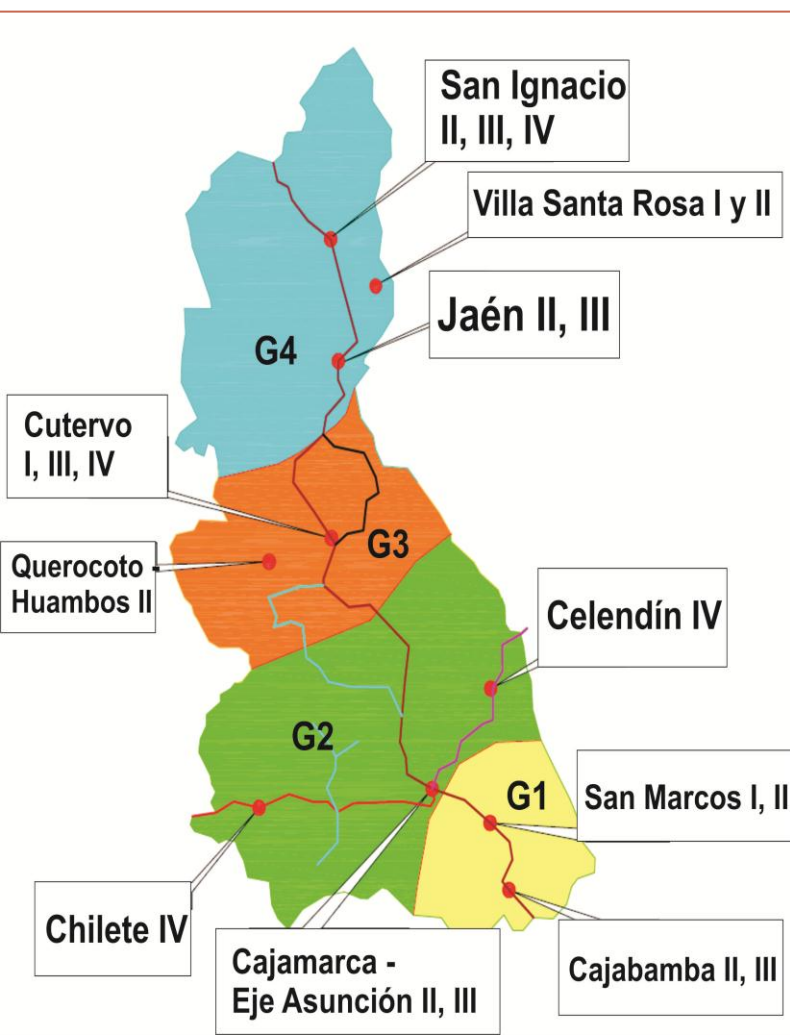

PAFE III	MONTO DE INVERSIÓN	BENEFICIARIOS	CONEXIONES DOMICILIARIAS	AVANCE
GRUPO I	59,021,785	50,335	8,366	98.75%
GRUPO II	63,530,060	49,255	8,784	92.10%
GRUPO III	78,916,010	59,767	13,167	94.75%
GRUPO IV	50,665,780	57,468	5,184	99.60%
TOTAL	252,133,635	216,825	35,501	



PROBLEMÁTICA EN EL PROGRAMA PE-P33: PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA ELÉCTRICA PAFE III



FACTORES DE RETRASO

- ✓ **PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE OBRA / ENERGIZACIÓN POR PARTE DE LAS CONCESIONARIAS ES DISTINTO AL ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRA.**

***RD N° 018-2002-EM-DGE:** Norma de procedimientos para la elaboración de proyectos y ejecución de obras en sistemas de distribución y sistemas de utilización en media tensión en zonas de concesión de distribución*

Contrato de Ejecución de Obra
N° 001-002-003-004-2011-GR
CAJ/PROREGION

Concesionarias	Contratistas
12.4. Recepción o Conformidad y Puesta en Servicio.- el Interesado debe solicitar recepción y puesta en marcha, adjuntando el expediente final de Construcción. Sin embargo se viene solicitando adicionalmente que se alcance una planilla que detalle el levantamiento íntegro de las observaciones encontradas, a fin de proceder a energizar provisionalmente e iniciar el proceso de recepción.	Cláusula 11.1. Terminación de Trabajos Pendientes y reparación de defectos.- El Contratista cuenta con 365 días (período de notificación de defectos) para ejecutar todo el trabajo necesario para la reparación de defectos o daño notificado (Pliego de observaciones).



DIFERENCIAS ENTRE LOS PROCEDIMIENTOS DE ENERGIZACIÓN DE LAS CONCESIONARIAS Y EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA.

- **Planos con Codificación GIS.**

Los Planos de Líneas de Primarias, Redes Primarias y Redes Secundarias deben contener los Códigos del Sistema de Información Geográfica de las Concesionaria en cada estructura del proyecto (Aprox. 50 000 estructuras, en 10 000 planos). Las concesionarias tienen limitación de personal técnico para realizar esta labor, a fin de superar este impase, el programa esta pagando a técnicos para que se realice este trabajo.

- **Planos de Lotización visado por el Área Técnica de las Municipalidades Distritales.**

El programa beneficia a 65 distritos de la Región, teniéndose aproximadamente 5 000 planos de Lotización

- **Pliego de Observaciones subsanadas en su totalidad (de forma y fondo) debidamente firmadas por el Supervisor, Contratista y Supervisor de la Concesionaria.**

Las Observaciones principalmente se basan en las impuestas por la supervisión de la Concesionaria, las mismas que están siendo subsanadas por el Contratista, para proceder con la energización correspondiente.

- **Documentos para firma de Contratos de Suministro**

Condición necesaria para la recepción y energización de obra según lo indicado por las Concesionarias (Padrones, Certificados de Posesión y copia de DNI). La preparación de los expedientes de los beneficiarios lo ha asumido la USI de PROREGION



✓ INSTALACIÓN DE MEDIDORES.

Concesionarias		Contratistas
HIDRANDINA S.A.	ELECTRONORTE S.A.	BB Tecnología Industrial SAC Grupo N° 01 y 02 T&D Contratistas Generales SA Grupo N° 03 y 04
Actividades Técnico Comerciales	Actividades Técnico Comerciales.	Partidas
Identificación de Acometida	Identificación de Acometida.	Instalación de medidor monofásico de energía activa
Instalación de Medidor Monofásico Prepago	Instalación de Medidor Monofásico Prepago.	
Levantar Ficha de Intervención y Graficación	Digitación de Acta de Intervención de Vector.	
Saldado de Tapa de Caja portamedidor	Remachado de Tapa de Caja portamedidor.	
Pintado de tapa de Caja portamedidor	Pintado de Caja portamedidor.	
Codificado de la tapa de la Caja portamedidor	Codificado de la tapa de la Caja portamedidor.	
	Instalación de Interruptor Termomagnético en Caja portamedidor.	



✓ SANEAMIENTO DE SERVIDUMBRE.

- ✓ Existen Problemas en la gestión de servidumbre, debido a que (1) propietario de terrenos por donde pasa la Línea Primaria, se opone al pase de las líneas, (2) solicitan sumas muy por encima de lo presupuestado.
- ✓ Hay propietarios de terrenos afectados, que condicionan el pase de las líneas a la instalación del suministro de energía a su propiedad.

AVANCE LOGRADO EN GESTION DE SERVIDUMBRE POR GRUPOS AL 20-07-2013

GRUPOS	LONGITUD DE LINEA PRIMARIA (km)			NUMERO PROPIETARIOS EMPADRONADOS, VALORIZADOS Y PAGADOS					
	EXPEDIENTE TECNICO	RECONOCIMIENTO EN CAMPO	%	EMPADRONADOS (CONTRACTUAL)	VALORIZADOS (REAL)	PAGADO	NO UBICADOS	FALTA PAGAR	% PAGADO
GRUPO N° 01	388.88	376.7	96.87%	1171	2071	1819	250	2	99.90%
GRUPO N° 02	458.34	409.72	89.39%	2076	2969	2755	197	24	99.43%
GRUPO N° 03	446.38	428.27	95.94%	2196	2769	2503	248	18	99.35%
GRUPO N° 04	438.64	435.38	99.26%	1615	1898	1643	252	3	99.84%
GRAN TOTAL	1732.24	1650.07	95.26%	7058	9707	8720	947	47	99.59%



Redes de terceros

- ✓ Existen puntos de alimentación otorgados por las Concesionarias a partir de redes de terceros, que no cuentan con la conformidad técnica de las Concesionarias y que para su transferencias requieren que se realice el mejoramiento y/o reforzamiento de éstas.
- ✓ Problemas de Líneas Primarias de Terceros que no han sido recepcionadas por las Concesionarias por encontrarse en condición de observadas, lo que ha obligado a modificar los trazos de ruta de las Líneas Primarias.
- ✓ Problemas de Líneas Primarias de Terceros que no han sido recepcionadas por las Concesionarias por encontrarse con problemas judiciales, lo que ha obligado a modificar los trazos de ruta de las Líneas Primarias.
- ✓ Las Municipalidades con las se presentan estas dificultades son: Cachachi, Tacabamba, Cutervo, Huambos, Santa Rosa y Pimpingos.



Alternativas de Solución

✓ **ENERGIZACIÓN DE REDES, INSTALACIÓN DE MEDIDORES Y RECEPCIÓN DE OBRA POR PARTE DE LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS**

Se está coordinando reuniones al más alto nivel entre los representantes del Gobierno Regional de Cajamarca y del Grupo Distriluz (del cual forman parte Hidrandina S.A. y Electronorte S.A.), de tal manera que se tomen decisiones que permitan acelerar las actividades que están frenando la puesta en servicio del PAFE III.

✓ **SANEAMIENTO DE SERVIDUMBRE**

Se viene efectuando una intervención permanente de la Unidad de Sostenibilidad, para que en forma conjunta con la Supervisión se culmine a la brevedad posible con el saneamiento de la servidumbre.



Alternativas de Solución

✓ **REDES DE TERCEROS**

Se efectuó la reunión de coordinación los días 24 y 25 de enero del 2013, entre los representantes de las Municipalidades de Santa Rosa y Pimpingos, y el Ministerio de Energía y Minas, de tal manera que las Municipalidades elaboren y viabilicen los Estudios de Preinversión (que deberán incluir el DIA y el CIRA) de levantamiento de observaciones de las Redes de las cuales depende el PAFE III y posteriormente sea el Ministerio de Energía y Minas quien financie la ejecución de las Obras.

Se efectuó reunión de coordinación el día lunes 05 de agosto del 2013 con la Municipalidad distrital de Cachachi, quien manifestó que estaría entregando el día viernes 09 de agosto a Hidrandina S.A. el Expediente Técnico de Levantamiento de observaciones para su revisión y aprobación para su ejecución.

Se efectuó reunión de coordinación los días 02 y 05 de agosto del 2013 con los representantes de la Sub Gerencia de Operaciones del Gobierno Regional de Cajamarca, quienes manifestaron que encontraban elaborando las bases de licitación para la elaboración del Expediente Técnico de Levantamiento de observaciones.

Se continuarán realizando reuniones de coordinación para agilizar la transferencia de la redes eléctricas a las Concesionarias



Prioridad: Electrificación Rural PRER I-Etapa de energización y entrega

30 millones en ejecución en el Programa de Electrificación Rural (PRER I) para beneficiar a 27,283 personas de 172 localidades.

PRER I	MONTO DE INVERSIÓN	BENEFICIARIOS	CONEXIONES DOMICILIARIAS	AVANCE
PRER I (JAÉN Y SAN IGNACIO)	23,659,921	23,018	3,364	95.9%
PRER I (CAJABAMBA)	6,421,705	4265	853	69.7%
TOTAL	30,081,626	27,283	3,517	



Prioridad: Electrificación Rural

12 Expedientes Técnicos aprobados que beneficiará a 35,283 habitantes que demandará una inversión de 31.7 Millones. Su financiamiento será gestionado ante el Ministerio de Energía y Minas.

Nº	EXPEDIENTES TÉCNICOS APROBADOS	PROVINCIA	MONTO DE INVERSIÓN (\$/.)	BENEFICIARIOS
1	Electrificación rural del distrito de Gregorio Pita II Etapa	SAN MARCOS	7,037,463	5,410
2	Electrificación rural en la Microcuenca Muyoc-Shitamalca.	SAN MARCOS	6,721,745	7,355
3	Electrificación Rural Cajabamba II Etapa Fase II	CAJABAMBA	2,758,389	5,050
4	Redes primarias, secundarias y conexiones domiciliarias El Llantén, Zognad Bajo, Nuevo Progreso, El Lirio y Chucllapampa	SAN MIGUEL	446,405	1,160
5	Redes primarias, secundarias y conexiones domiciliarias de Llamapampa, Alto Perú, Pueblo Nuevo, San Mateo, Baños Quilcate	SAN MIGUEL	430,286	1,400
6	Electrificación Rural Aylambo	CAJAMARCA	257,976	440



Continúa...



N°	EXPEDIENTES TÉCNICOS APROBADOS	PROVINCIA	MONTO DE INVERSIÓN (S/.)	BENEFICIARIOS
7	Electrificación rural Cajabamba II Etapa - Fase 1	CAJABAMBA	1,876,386	2,585
8	Pequeño Sistema Eléctrico Tembladera I Etapa	CONTUMAZA	2,894,540	3 842
9	Mejoramiento de la línea en 22.9 Trifásica en San Miguel – El Molino y El Molino – El Prado, Provincia san Miguel, Cajamarca	SAN MIGUEL	778,047	1,092
10	Evaluación del Estado Físico y Expediente Técnico de levantamiento de observaciones del Proyecto Pequeño Sistema Eléctrico Chilete III Etapa	SAN PABLO, SAN MIGUEL, CAJAMARCA	6,973,659	9,976
11	Expediente de obras complementarias de levantamiento de observaciones de la obra electrificación rural del Caserío Pampa Iracushco	CAJAMARCA	217,433	815.00
12	Instalación de líneas y redes primarias, redes secundarias de electrificación rural de 5 caseríos de Santa Cruz	SANTA CRUZ	1'401,187	
TOTAL			31,793,518	35,283



05 Perfiles en Elaboración, que beneficiará a 936 localidades, que demandará 114 Millones.

PERFILES EN ELABORACIÓN	MONTO DE INVERSIÓN (S/.)	NÚMERO LOCALIDADES	SITUACIÓN ACTUAL
Instalación del Sistema Eléctrico Rural San Miguel Fase I	10,320,000	101	En elaboración de estudio de preinversión – Procesamiento de Datos
Instalación del Sistema Eléctrico Rural San Miguel Fase II y III	31,662,247	285	Se ha declarado desierto el proceso de licitación de los estudios de preinversión de los SERs San Miguel Fase II y III.
Instalación del Sistema Eléctrico Rural Celendín Fase I	18,596,834	124	En Evaluación del perfil por OPI
Instalación del Sistema Eléctrico Rural Celendín Fase III	38,360,587	324	En Evaluación del perfil por la OPI
Instalación del Sistema Eléctrico Rural Cajabamba	15,412,171	102	En evaluación de perfil por la OPI
TOTAL	114,351,839	936	



Prioridad: Electrificación Rural

05 perfiles viables, para beneficiar a 8,305 personas con 1,901 conexiones domiciliarias, que demandará una inversión de 9.4 millones

Perfiles Viables	Provincias	Monto de Inversión (S/.)	Beneficiarios	Km. redes primarias y/o secundarias	Conexiones domiciliarias
Sistema Eléctrico Rural Microcuenca Chirimoyo Cajamarquino Localidades: Mogol, Alcaparrosa, Cochas, Chirimoyo, Yahuarmarca, Sector Chulucanas.	Cajamarca	2,834,407	1,564	22	313
Eléctricación Rural Caserío Pampa Iracushco.	Cajamarca	217,433	640	3	160
Electrificación Rural Aylambo.	Cajamarca	138,010	440	5	116
Instalación del Sistema de Electrificación Rural en los Caseríos de los Distritos de Guzmango y Tantarica.	Contumazá	2,769,754	2,485	66	505
Instalación y Ampliación del Sistema Eléctrico Rural en 19 Caseríos de la Provincia de Cajabamba.	Cajabamba	3,500,000	3,176	60	807
Total		9,459,604	8,305	156	1,901



Prioridad: Electrificación Rural

Elaboración de expedientes técnicos

EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN	MONTO DE INVERSIÓN (S/.)	NÚMERO LOCALIDADES	SITUACIÓN ACTUAL
Instalación del Sistema Eléctrico Rural, Bellavista y San Ignacio	14'689,815	130	Se ha logrado elaborar las bases para la licitación del expediente técnico.





Eje Ambiental

Por una Gran Región

Prioridad: Gestión de Cuencas Hidrográficas

Actividades:

Conformación de Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca.

- ✓ Expediente Técnico presentado al ANA para la creación del consejo de Recursos Hídricos de la cuenca del río Chicama.
- ✓ Cuencas de río Jequetepeque y del río Crisnejas, tienen conformado sus respectivos GRUPOS IMPULSORES.
- ✓ Reuniones para la conformación de los consejos de recursos hídricos de las cuencas del río Chinchipe y Chamaya.



Prioridad: Gestión de Cuencas Hidrográficas

01 Expediente Técnico aprobado, que beneficiará a 116,653 habitantes, que demandará una inversión de 4.8 Millones

Expediente Técnico Aprobado	Provincia	Monto de Inversión (S/.)	Beneficiarios
Mejoramiento de la Gestión Institucional de los Servicios Ambientales Hídricos en la Microcuenca del río Amojú.	Jaén	4,852,590	116,653

02 Perfiles Viables, que beneficiará a 7,834 habitantes que demandará una inversión de 23.6 Millones

Perfiles Viables	Provincias	Monto de Inversión (S/.)	Beneficiarios
Recuperación de Ecosistemas Degradados en la Cuenca del Río Jequetepeque.	San Miguel y San Pablo	23,101,881	7,545
Proyecto Fortalecimiento de capacidades en Gestión Social del Agua y el Ambiente en Cuencas.	Cajamarca San Pablo, San Miguel, San Marcos, Cajabamba y Contumazá.	593,300	289
TOTAL		23,695,181	7,834

02 Perfiles en elaboración, que beneficiará a 8,787 habitantes que demandará una inversión de 49,5 Millones

Perfil en Elaboración	Provincias	Monto de Inversión (\$/.)	Beneficiarios
Recuperación de ecosistemas degradados en las cabeceras de la cuenca del río Zaña.	San Miguel y Santa Cruz	40,923,808	2,342
Recuperación del servicio ambiental hídrico de 06 microcuencas altoandinas en las provincias de Cajamarca y Contumazá.	Cajamarca y Contumazá	8,599,254	6,445
TOTAL		49,523,062	8,787



Prioridad: Conservación de la Biodiversidad

INDICADORES	2011	2012	I SEMESTRE 2013
Área en proceso de Conservación (Hectáreas)	43,863.55	29,267.01	139,971.62

- ✓ **Implementación del Sistema Regional de Conservación de Cajamarca - SIRECC:** Está en proceso de formulación 7 Diagnósticos Especializados que demandará una inversión de **427 Mil.**



Prioridad: Conservación de la Biodiversidad

3 Perfiles en elaboración, que demandará una inversión de 10,76 Millones que beneficiará a 126,135 habitantes, los mismos que deben ser inscritos en el MINAM



**Santuario Nacional
Tabaconas Namballe**

S/. 6,002,204
Benef.: 3,255 Hab.



**Bosque de Protección
Pagaibamba**

S/. 3,046,185
Benef.: 2,131 Hab.



Parque Nacional Cutervo



S/. 1,712,393
Benef.: 120,749 Hab.

INDICADORES	2012	I SEMESTRE 2013
Hectáreas Reforestadas/Forestadas	316.4	1099.10
Plantones en producción		847,137
Plantones instalados	351,520	1,221,100


- ✓ **S/. 17,891,107** Monto de Inversión de 03 **Proyectos en Ejecución**, el cual beneficiará a **6,041 familias**.
- ✓ **S/. 4,020,000** Monto de Inversión de 01 **Expediente Técnico**, el cual beneficiará a **800 familias**.
- ✓ **S/. 35,396,827** Monto de Inversión de 02 **Perfiles**, el cual beneficiará a **542,217 familias**.



S/. 4,834,514
Benef. 1,928 Familias



S/. 4,020,000
Benef. 800 Familias

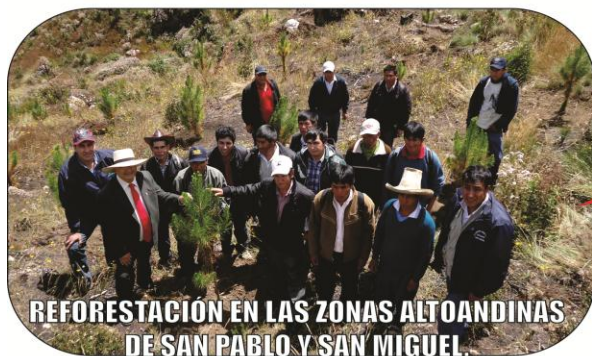

S/. 3,989,308
Benef. 2,540 Familias



S/. 9,067,285
Benef. 1,573 Familias

INDICADORES	2011	2012	I SEMETRE 2013
Monitoreo Calidad del Agua	14	18	10

Actividad	Ubicación
Monitoreo de la calidad del agua	Cuenca de Chancay Lambayeque, Río Grande – Mashcón, Crisnejas
Inventario de Recursos Hídricos	Zona Influencia Conga
Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental -PLANEFA 2013	A Nivel Regional
Evaluación de la Estrategia de Educación Ambiental	Cajamarca
Visitas Técnicas a con Comisión Ambiental Regional – CAR	Cajamarca
Fortalecimiento de las Comisiones Ambientales Municipales – CAMs	13 Provincias
Implementación del Sistema de Información Geográfico Ambiental.	13 Provincias



Proyecto en Ejecución	Costo Total S/.	Beneficiarios	Avance %
Fortalecimiento de la Gestión Ambiental	4,800,352	12,456	98 %




ESTACIONES FIJAS

- ER-UV** 3 Estaciones de Radiación Ultravioleta - Biometer
- EMA** 7 Estaciones Metereológicas Automáticas
- EHA** 3 Estaciones Hidrológicas Automáticas
- ECA** 1 Estación de Calidad de Aire ECA

EQUIPOS PORTATILES


- C** 2 Correntómetros
- M** 4 Multiparámetros
- EMAP** 3 Estaciones Metereológicas Automáticas Portátiles
- S** 3 Sonómetros

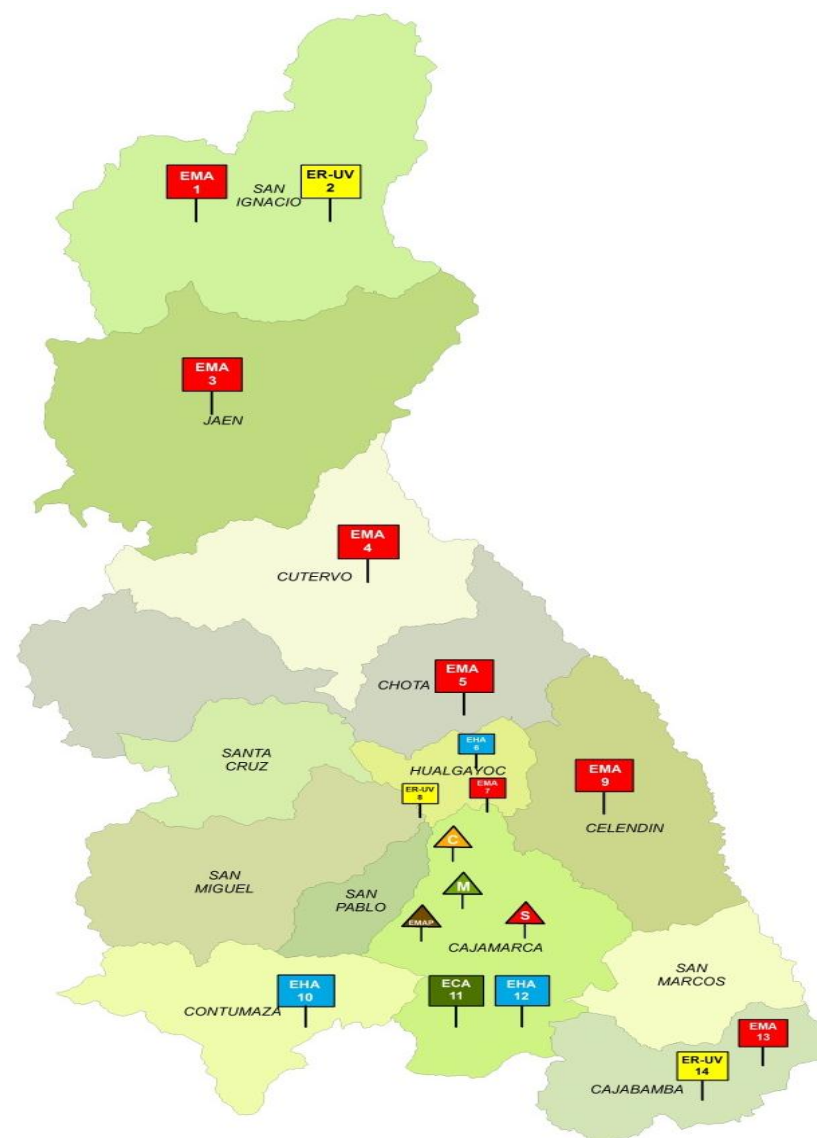

INDICADORES	2011	2012	I SEMESTRE 2013
Proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial.			1
Plan de Acción para la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial			0.5
Implementación del Plan Nacional de Demarcación Territorial			1
Saneamiento físico de bienes inmuebles	12	11	6
Estudios de Diagnostico y Zonificación Territorial (San Pablo y Cajamarca)	1		1
Categorización de Centros poblados	23	25	26

Actividades:

- ✓ Se ha presentado al Congreso de la Republica iniciativa legislativa de **proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Sostenible.**
- ✓ Inicio del Plan de Acción para la **elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial**
- ✓ Adecuación del expediente técnico para el POT Cajamarca tomando en cuenta Estudios complementarios regulados por RM N° 135-2013-MINAM.
- ✓ **Posicionamiento del ZEE-OT Cajamarca** a nivel nacional, regional y de la Comunidad Andina como referente para otros procesos en curso.
- ✓ Avance al **60% del saneamiento** del límite interdepartamental con Lambayeque y de los limites interprovinciales con Chota, Hualgayoc y Cajamarca.

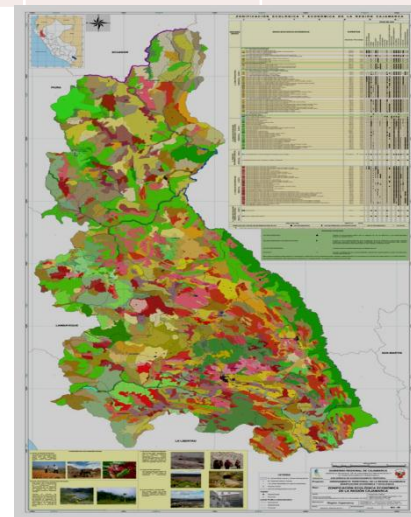

Prioridad: Ordenamiento Territorial

3 Perfiles de Ordenamiento Territorial, que demandará una inversión de 9.8 millones, beneficiando a 236,517 habitantes

Perfiles en Elaboración	Provincia	Monto de Inversión (S/.)	Beneficiarios
Instalación del servicio de ordenamiento territorial.	San Marcos.	3,738,245	51,031
Instalación del servicio de ordenamiento territorial.	San Miguel.	5,253,979	54,155
Instalación del servicio de ordenamiento territorial.	San Ignacio	851,234	131,331
TOTAL		9,843,458	236,517

LABORATORIO REGIONAL DEL AGUA



Nombre	Monto de Inversión(S/.)	Beneficiarios
Rediseño de la Construcción y Equipamiento del Laboratorio Regional del Monitoreo del Agua	1'066,627	Población Regional

Situación encontrada



Reingeniería



Situación Actual



EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO REGIONAL DEL AGUA

1.5. Millones en equipamiento

Nombre	Costo Unitario	Imagen
ICP-OES: Los análisis que se ofrecen incluyen prácticamente todos los elementos de la tabla periódica.	719,800	
CROMATOGRAFO IÓNICO: Análisis de cationes o aniones en agua potable, agua superficiales, residuales.	296,350	
ANALIZADOR DE MERCURIO: Análisis de mercurio en agua potable, agua superficial, residual.	88,500	
CAMPANA EXTRACTORA DE GASES: Zona de digestión de muestras con ácidos, en el pre tratamiento de muestras	76,700	
CABINAS DE BIOSEGURIDAD: Para siembras microbiológicas en condiciones de esterilización	26,550	

GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL LABORATORIO DEL AGUA

INDICADORES	I SEMESTRE 2013
Elaboración de documentación del sistema de gestión de calidad bajo la ISO 17025	70%
Requisitos Administrativos: Elaboración de Procedimientos	10
Requisitos Técnicos: Elaboración de Procedimientos	6



Actividades:

- ✓ **Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad:** Elaboración de los Instrumentos de Gestión del Laboratorio. Diseño de documentación del Sistema de Gestión de Calidad "Sistema de Gestión para Laboratorio de Ensayos y/o Calibración".
- ✓ **Estandarización de Métodos:** Gestión para Calibración de Materiales Volumétricos y Equipos, Capacitación en el uso de equipos.
- ✓ **Procesos:** se están realizando con el fin de lograr la acreditación en Metales Pesados por ICP-OES, por Cromatografía Iónica(Sulfatos, Nitritos, Nitratos, Cloruros, Cloratos, Cloritos, Bromatos). Para posteriormente ampliar la Acreditación en otros métodos.





Eje Institucional

Por una Gran Región

A large, thick green checkmark is positioned below the text "Por una Gran Región".

Prioridad: Consejo Regional

Principales Acuerdos:


- ✓ **Acuerdo N° 023: Aprobar** la implementación de "Iniciativas para incorporar a la Sociedad Civil Organizada, en actividades de vigilancia y soporte para reducir la Mortalidad Materna - Neonatal y la Desnutrición Crónica Infantil en Nuestra Región" y "La Creación de una Mesa de Alto Nivel para el Logro de los Objetivos del Milenio en Salud en la Región Cajamarca.
- ✓ **Acuerdo N° 038: Aprobar** la Iniciativa Legislativa conducente a aprobar: "Ley Orgánica del Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Sostenible".
- ✓ **Acuerdo N° 039: Realizar** las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto Supremo N° 048-2013-PCM (Declaración de Estado de Emergencia en Zonas Cafetaleras por la incidencia de la Roya Amarilla).



Prioridad: Consejo Regional

Principales Ordenanzas:

- ✓ **Ordenanza N° 02: Aprobar** la actualización de la Política Ambiental Regional al 2021, el Plan de Acción Ambiental Regional 2013 -2021 y la Agenda Ambiental Regional 2013- 2014.
- ✓ **Ordenanza N° 03: Créase** El Sistema de Información Ambiental Regional - SIAR Cajamarca, como instrumento de gestión ambiental, destinado a integrar y difundir la información ambiental en la Región Cajamarca.
- ✓ **Ordenanza N° 04: Aprobar** la implementación del Plan Regional de Movilización 2013 - 2014.
- ✓ **Ordenanza N° 05: Aprobar** la implementación del Plan Regional de Defensa Nacional.
- ✓ **Ordenanza N° 06: Aprobar** la implementación del Plan Regional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2014.



Prioridad: Mancomunidad Regional

Mancomunidad Regional del Qhapaq Ñan Nor Amazónico.

Acuerdo voluntario de GORE de Amazonas, Cajamarca, La Libertad y San Martín.

Objeto: Prestación conjunta de servicios y ejecución de PIP.

Eje Articulador: Turismo

Actividades:

- ✓ Incidencia para crear Registro de MR y aprobar Reglamento (SD/PCM).
- ✓ Lineamientos Estratégicos - Visión, Objetivos, Estrategias – Aprobados.
- ✓ Agenda Común priorizada (Seis Proyectos de interés interdepartamental).
- ✓ “Declaración de Tarapoto” protesta por desaceleración del proceso de Descentralización



Prioridad: Desarrollo Fronterizo

Actividades:

✓ **IV Reunión del Comité de Frontera Zamora Chinchipe – Cajamarca.**

Objetivo: Desarrollo de la frontera común, la cooperación y la integración fronteriza..

Meta: Acordar una agenda binacional, de corto y mediano plazo, vinculada a:

- Asuntos migratorios, aduaneros y la cooperación transfronteriza;
- Desarrollo sostenible y la integración territorial.
- Seguridad Ciudadana y Ejercicio de gobierno local.
- Institucionalización del Comité de Frontera



Participantes: 18 de Ecuador y 41 de Perú (Autoridades y representantes sectores Público y Privado).

- 48 Recomendaciones orientadas a fortalecer el cumplimiento de los acuerdos de reuniones anteriores y por ende, lograr la institucionalización del Comité de Frontera.
- 27 Acuerdos que articulan una agenda de corto, mediano y largo plazo, que establece compromisos y responsabilidades - Públicas y privadas – para los dos países.



Prioridad: Acciones de Defensa Nacional

Actividades:

Se brindó apoyo a población vulnerable de zonas afectadas por peligros naturales, lluvias intensas, vientos, zonas de frío, sistemas viales críticos y abastecimiento de agua potable beneficiando a 27,750 pobladores de la región:


- ✓ 710 planchas de calamina.
- ✓ 1,904 bolsas de cemento.
- ✓ 10,240 galones de petróleo.
- ✓ 6,070 metros lineales de tubería y 13 tanques de PVC.
- ✓ 02 motobombas para la Compañía de Bomberos de Jaén.
- ✓ 13 motos lineales para el fortalecimiento de los 13 Centros de Operaciones de Emergencia Provinciales.
- ✓ 3,380 frazadas para atender a escolares y adultos mayores, en zonas sobre los 3,500 metros de altura.



Prioridad: Gobierno Electrónico

Actividades:

- ✓ Ampliación de banda ancha de la Sede Regional de 16 mb a 26 mb, interconectando el Hospital Regional, la Municipalidad de Jesús, y la Dirección de Energía y Minas.
- ✓ Mayor transparencia y acceso a la información, mejorando la Página Web Institucional, llegando a obtener un promedio de 41 mil visitas al mes.
- ✓ Formulación del Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Información y Comunicación para la Gestión Administrativa y Consulta Ciudadana que demandará una inversión de 5 millones de soles.

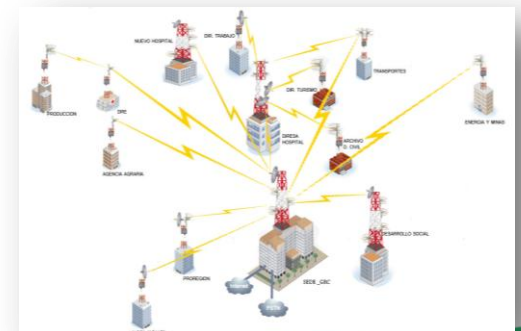

Prioridad: Convenios de Cooperación Interinstitucional

Principales Convenios:

- ✓ Convenio con los gobiernos locales de Celendín, San Marcos, San Ignacio, Hualgayoc-Bambamarca y otros, para cooperación y formulación de proyectos de inversión pública de competencia municipal.
- ✓ Convenio con el Fondo Bi-Nacional Perú –Ecuador para equipamiento de 33 Establecimientos de Salud en zona de frontera.
- ✓ Convenio de Gestión entre el Gobierno Regional de Cajamarca y el Seguro Integral de Salud – SIS, para pago CAPITADO, beneficiando a todos los asegurados por un monto de 39.5 millones.
- ✓ Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Articulado Nutricional entre el MEF y el GORE CAJ, por un monto de 5 millones.





Por una Gran Región

Demanda Adicional

Demanda de inversión

Salud

Tipo	Cantidad	Monto de Inversión (S/.)
Expediente Técnico en Elaboración	1	530,661
Perfiles Viables	1	8,929,624
Perfiles en Elaboración	5	
TOTAL	7	9,460,285

Educación

Tipo	Cantidad	Monto de Inversión (S/.)
Expedientes Técnicos Aprobados	4	3,621,629
Expedientes Técnicos en Elaboración	4	6,443,754
Perfiles Viables	25	150,554,929
Perfiles en Elaboración	21	
TOTAL	54	160,620,312

Saneamiento

Tipo	Cantidad	Monto de Inversión (S/.)
Expediente Técnico en Elaboración	1	4,321,250



Demanda de inversión

Riego

Tipo	Cantidad	Monto de Inversión (S/.)
Expediente Técnico Aprobado	03	7,226,895
Expediente Técnico en Elaboración	12	46,030,570
Perfiles Viables	10	55,231,713
Perfiles en Elaboración	20	95,570,621
TOTAL	45	204,059,799

Turismo

Tipo	Cantidad	Monto de Inversión (S/.)
Perfiles Viables	6	100,406,528
Perfiles en Elaboración	3	No definido
TOTAL	9	100,406,528



Demanda de inversión

Infraestructura Vial

Tipo	Cantidad	Monto de Inversión (S/.)
Expediente Técnico en Elaboración	2	43,166,143
Perfiles Viables	8	41,055,563
Perfiles en Elaboración	7	113,837,661
TOTAL	17	198,059,367

Infraestructura Eléctrica

Tipo	Cantidad	Monto de Inversión (S/.)
Expediente Técnico Aprobado	12	31,793,518
Expediente Técnico en Elaboración	1	16,689,815
Perfiles Viables	5	9,459,604
Perfiles en Elaboración	5	114,351,839
TOTAL	24	172,294,776



Demanda de inversión

Gestión Ambiental

Tipo	Cantidad	Monto de Inversión (S/.)
Expediente Técnico en Elaboración	2	8,872,590
Perfiles Viables	2	3,639,485
Perfiles en Elaboración	7	105,867,931
TOTAL	11	118,380,006



Resumen de la demanda de inversión

Tipo	Cantidad	Monto de Inversión (S/.)
Expediente Técnico Aprobado	19	42,642,042
Expediente Técnico en Elaboración	23	126,054,783
Perfiles Viables	57	369,277,446
Perfiles en Elaboración	68	429,628,052
TOTAL	167	967,602,323



Deuda Social por Setencias Judiciales y Otros Conceptos

EJECUTORA	PREPARACIÓN DE CLASES SENTENCIA JUDICIAL	DU Nº 118-94 CON SENTENCIA JUDICIAL	POR CUMPLIR 25 Y 30 AÑOS DE SERVICIOS CON RESOLUCIÓN	SEPELIO Y LUTO CON RESOLUCIÓN	SENTENCIAS EN CALIDAD DE COSA JUZGADA SENTENCIA JUDICIAL	ASIGNACION POR MAESTRIA	OTROS CONCEPTOS	DEUDA TOTAL
SEDE CENTRAL			9,663	4,573	6,525		4,920	20,761
CHOTA				27,852			844,800	27,852
CUTERVO			30,954	2,811			359,682	33,765
JAEN			37,386	50,000	271,854		1,455,077	359,240
AGRICULTURA			43,293	22,460	63,091,989		4,896,467	63,157,742
TRANSPORTES					728,808			728,808
EDUCACION CAJAMARCA								
EDUCACION CHOTA			2,187,607	71,540	215,496	151,200	267,077	2,625,843
EDUCACION CUTERVO	330,821		759,203	325,899				1,415,924
EDUCACION JAEN	12,045,908		1,626,968	902,849	2,967,162			17,542,887
EDUCACION SAN IGNACIO	755,096		1,114,923	174,743				2,044,762
EDUCACION SANTA CRUZ			434,428	212,608	4,503,055			5,150,090
EDUCACION CAJABAMBA								
EDUCACION BAMBAMARCA								
EDUCACION UGEL CELENDIN			88,848	31,630				120,478
EDUCACION UGEL CAJAMARCA								
EDUCACION UGEL SAN MARCOS			317,470	198,743		36,720	27,479	552,933
EDUCACION UGEL CONTUMAZA			19,234	17,363			141,428	36,597
EDUCACION SAN MIGUEL								
EDUCACION UGEL SAN PABLO			384,349	176,291				560,640
SALUD CAJAMARCA		3,771,230	239,874	54,322	68,946			4,134,371
SALUD CHOTA			243,450	158,392				401,842
SALUD CUTERVO			24,329	69,330	141,000			234,660
SALUD JAEN			175,309	25,964				201,273
HOSPITAL CAJAMARCA			653,495	54,322	273,101			980,918
HOSPITAL GENERAL DE JAEN								
TOTAL	13,131,825	3,771,230	8,390,783	2,581,691	72,267,936	187,920	7,996,930	100,331,385

Nota: existen devengados de intereses de sentencias judiciales por más de 800 millones

Deuda Social por Decreto de Urgencia N° 037-94

EJECUTORA	DU N° 037-94		
	DEUDA CON SENTENCIA JUDICIAL	DEUDA SIN SENTENCIA JUDICIAL	TOTAL
SEDE CENTRAL			
CHOTA			
CUTERVO			
JAEN			
AGRICULTURA			
TRANSPORTES			
EDUCACION CAJAMARCA		962,515	962,515
EDUCACION CHOTA	44,445	1,322,156	1,366,601
EDUCACION CUTERVO		19,943	19,943
EDUCACION JAEN		147,793	147,793
EDUCACION SAN IGNACIO		692,241	692,241
EDUCACION SANTA CRUZ	241,865	536,164	778,029
EDUCACION CAJABAMBA		124,322	124,322
EDUCACION BAMBAMARCA	126,499	637,665	764,163
EDUCACION UGEL CELENDIN			
EDUCACION UGEL CAJAMARCA	275,175	1,571,591	1,846,766
EDUCACION UGEL SAN MARCOS		15,120	
EDUCACION UGEL CONTUMAZA			
EDUCACION SAN MIGUEL	7,462	121,240	128,702
EDUCACION UGEL SAN PABLO			
SALUD CAJAMARCA	1,591,719	15,223,528	16,815,247
SALUD CHOTA	341,509	7,317,115	7,658,624
SALUD CUTERVO	42,175	64,839	107,013
SALUD JAEN	967	80,654	81,621
HOSPITAL CAJAMARCA	967	8,502,925	8,503,892
HOSPITAL GENERAL DE JAEN	7,474	20,590	28,064
TOTAL	2,680,256	37,360,400	40,025,536

GRACIAS

Por una Gran Región

