

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA



**2^{da} AUDIENCIA
PÚBLICA
REGIONAL**

Porfirio Medina Vásquez
Gobernador Regional Cajamarca



GOBIERNO REGIONAL
Cajamarca

Trabajando
junto al pueblo

Contenido:

I. Panorama Internacional, Nacional y Regional

II. Logros de Gestión 2017 – II Semestre

2.1. Desarrollo Humano con Servicios de Calidad

2.2. Desarrollo Integral con Sostenibilidad Ambiental

2.3. Desarrollo Económico Competitivo

2.4. Desarrollo Institucional y Gestión Participativa.

2.5. GORECAJ presente en Porcón Alto

III. Demanda y Perspectiva





I. PANORAMA INTERNACIONAL, NACIONAL Y REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

Cajamarca

Las proyecciones de diferentes organismos internacionales apuntan que este año la economía mundial cerrará con un crecimiento de alrededor del 3.5%, debido a una ligera mejora de algunos países del primer mundo y de otros de mediano desarrollo. Sin embargo, existe un alto riesgo de que en los próximos años la economía internacional se debilite y continúe aumentando la desigualdad del ingreso y manteniendo bajos niveles de productividad.

En cuanto a la economía nacional se estimaba que al finalizar el 2017 crecería a una tasa positiva del 2.8%, con los recientes acontecimientos políticos y sociales este crecimiento será menor y con señales de seguir empeorando a lo largo del 2018.



GOBIERNO REGIONAL
Cajamarca



GOBIERNO REGIONAL
Cajamarca

Trabajando
junto al pueblo



II. LOGROS DE LA GESTIÓN 2017 – II SEMESTRE

GOBIERNO REGIONAL
Cajamarca



GOBIERNO REGIONAL
Cajamarca

Trabajando
junto al pueblo



2.1. Desarrollo Humano con Servicios de Calidad

Cerrando Brechas

Atendiendo las Necesidades Básicas de la Población

GOBIERNO REGIONAL

Cajamarca




GOBIERNO REGIONAL
Cajamarca

Trabajando
junto al pueblo

Disminución de la Anemia Infantil

- Somos la región con menor prevalencia de anemia del país. Continua, la tendencia decreciente iniciada en el año 2013, bajando de 50.4% a 30% en el 2017, reduciendo en 20.5 puntos porcentuales. Dato que nos ubica muy por debajo de la prevalencia de la anemia a nivel nacional, que está en 43.5%.

Disminución de la Anemia Infantil

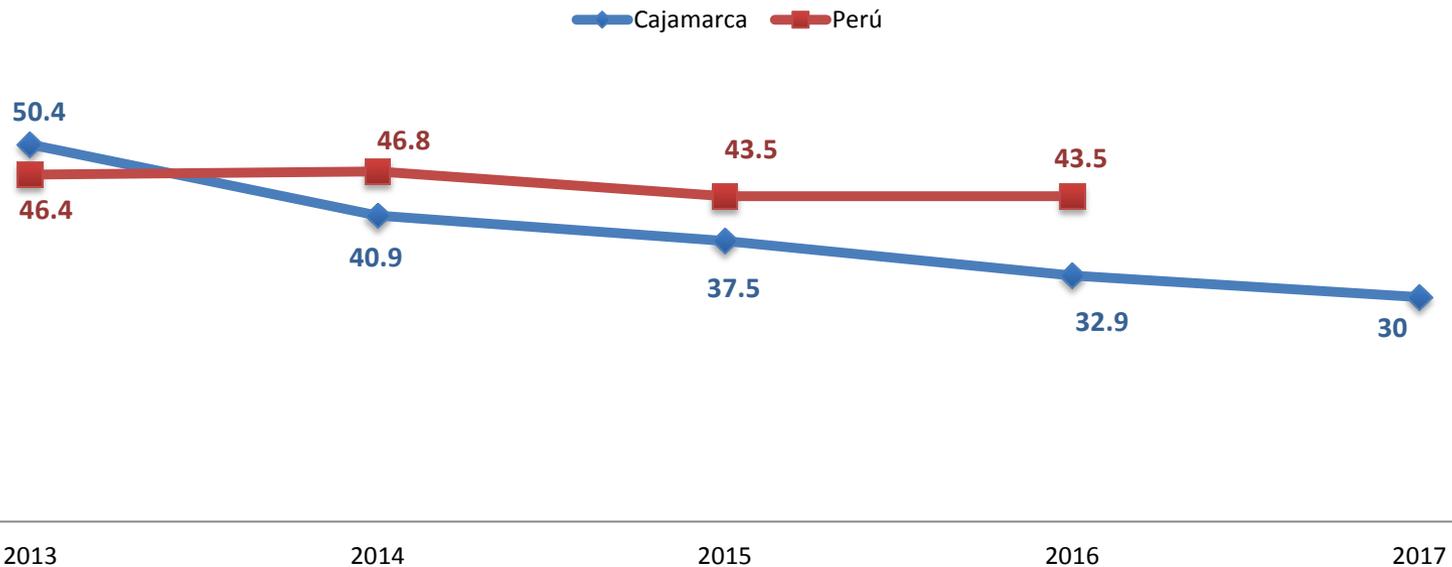


Fuente: ENDES 2011-2016/ Cajamarca- Sistema de Información Nutricional (SIEN) – 2013-2017*, DIRESA. (*) octubre 2017



Disminución de la Desnutrición Crónica Infantil

- Continúa la tendencia decreciente de la Desnutrición Crónica en la Región Cajamarca, iniciada en el 2012. A octubre 2017, se ha disminuido en 1.6 puntos porcentuales. A pesar de ello, la brecha con el nivel nacional sigue abierta.

Disminución de la Desnutrición Crónica Infantil

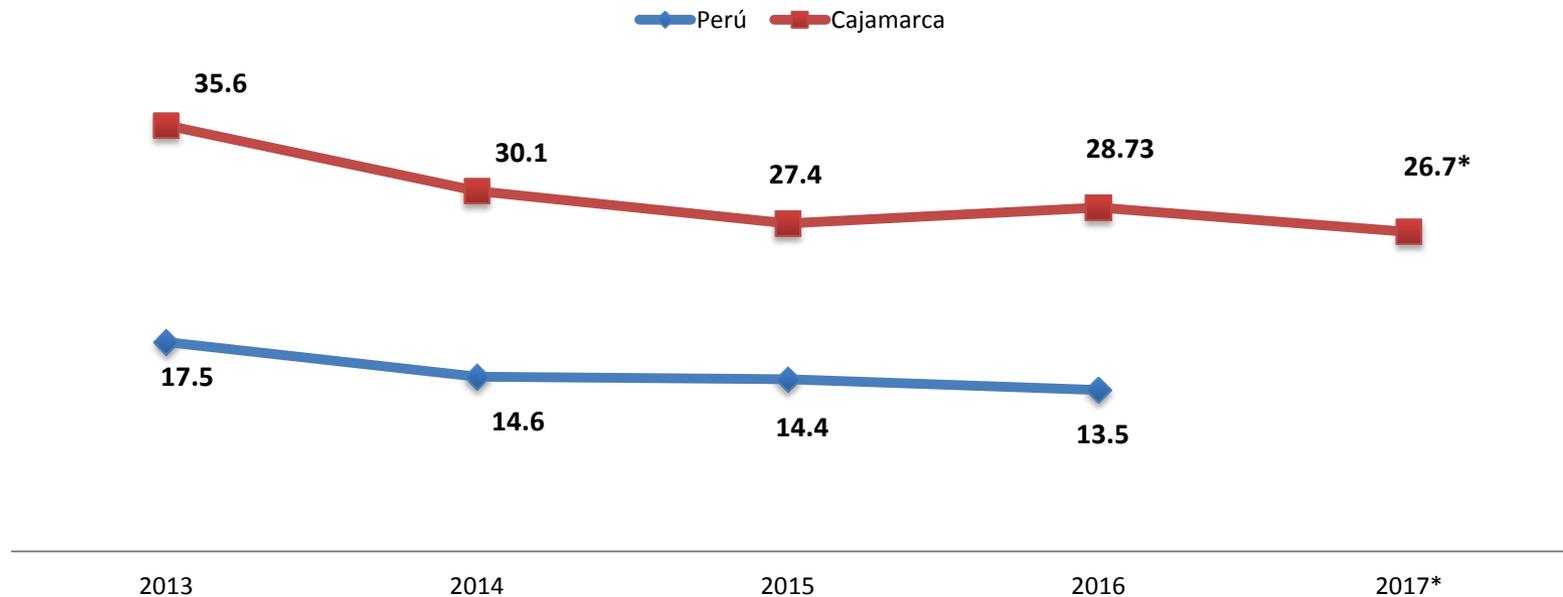


Fuente: PERÚ-ENDES 2011-2016 / Cajamarca- Sistema de Información Nutricional (SIEN) – 2013-2017*, DIRESA. (*) octubre 2017



Mortalidad Materna

- Hasta la Semana Epidemiológica 50 del año 2017, tenemos 30 muertes maternas: 23 directas y 07 indirectas. Requerimos un mayor esfuerzo para reducir este número.

N° MUERTES MATERNAS HASTA LA SEMANA EPIDEMIOLÓGICA N° 50, AÑOS 2013-2017. REGIÓN CAJAMARCA

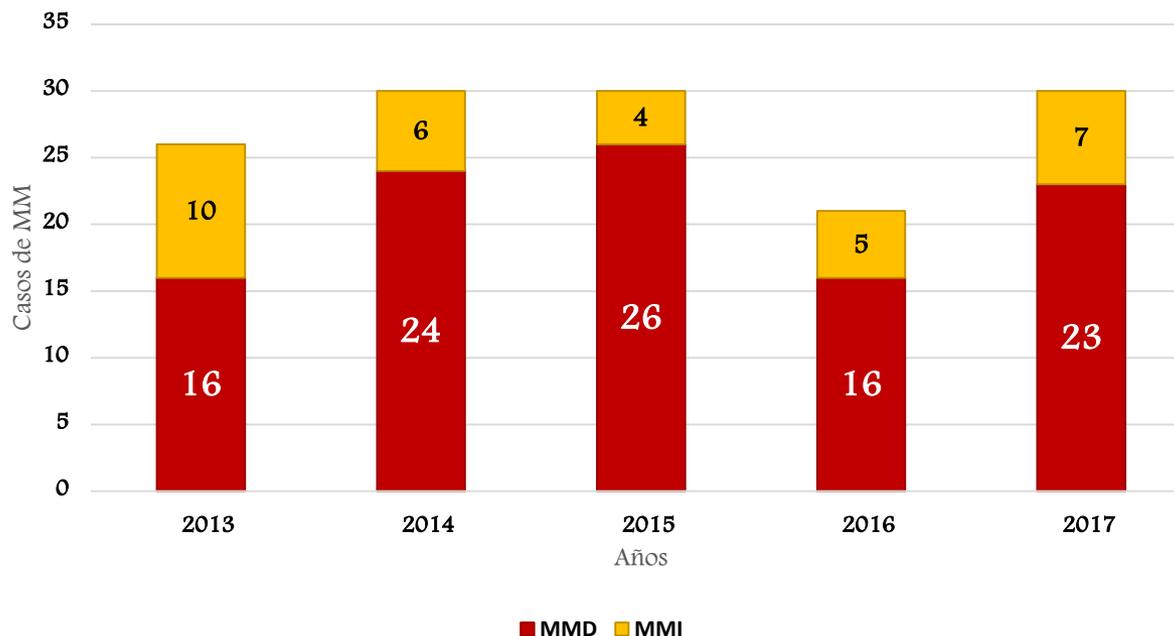

FUENTE: Vigilancia Epidemiológica-DIRESA




Incremento del Parto Institucional Calificado

- Continúa el incremento del Parto Institucional a nivel regional. Hemos pasado de 58.4% (2011) a un 76.5% (2016). A octubre de 2017 se ha alcanzado el 83,1% de la meta prevista para este año.

Parto Institucional 2011-2016, Oct. 2017. Cajamarca

DIRESA CAJAMARCA	META 2017	AVANCE	2017*
	20,259	16,832	83,1 %

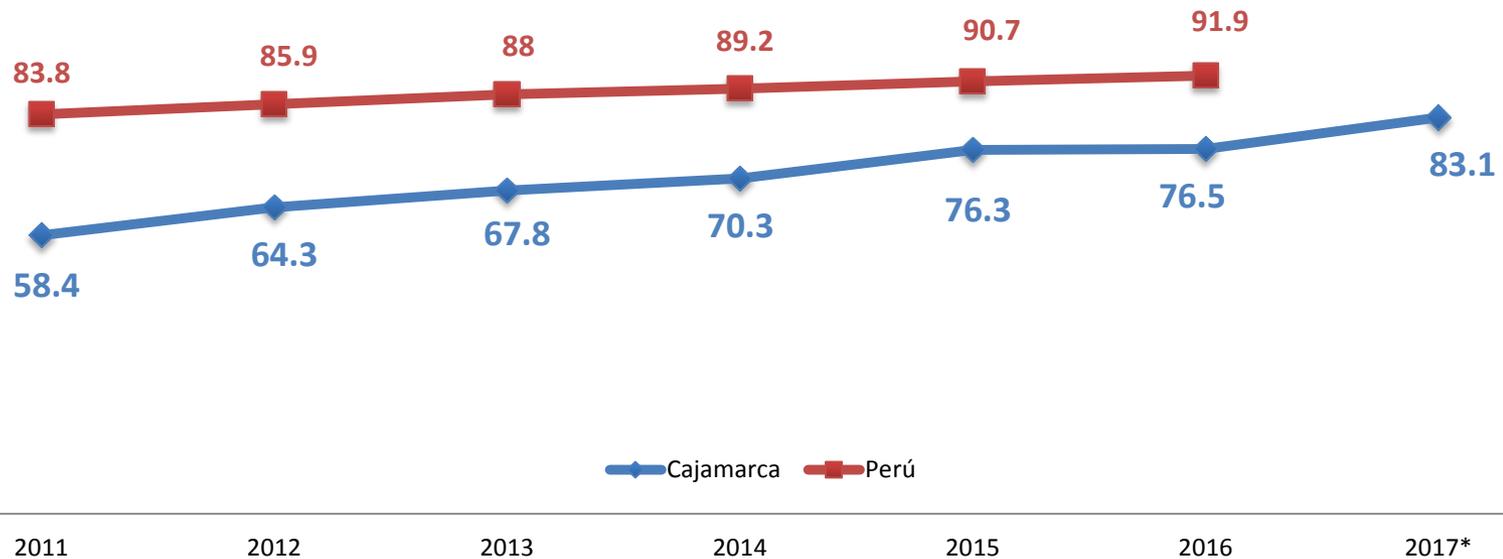

FUENTE: ENDES 2016/ HIS – Oct. 2017 DIRESA CAJAMARCA



Salud: Mejorando los servicios



- **Más de 47 mil mujeres de 25 a 64 años** con tamizaje en cáncer de cuello uterino, con examen de papanicolaou, promoviendo la prevención y facilitando en tratamiento oportuno.
- **4 referencias aéreas** a la ciudad de Lima (Contumazá, Cajamarca, San Miguel) y 1 referencia aérea al Hospital Regional de Cajamarca, **salvaguardando la vida de la gestante.**
- **361 personas tamizadas** en exposición a metales pesados, quienes vienen recibiendo el paquete de Atención Primaria en Salud (1° Fase) y la 2° Fase se hará en el mes de enero 2018 por médicos especialistas.
- **280 brigadistas comunitarios** preparados para la atención inicial ante una emergencia.

- **50 profesionales de salud** capacitados en: "**Ayudando a respirar al bebé y ayudando a las madres a sobrevivir**", gracias al Convenio DIRESA y ASPERSUD.
- **88 profesionales capacitados** en Atención Integral de la Etapa de Vida Adolescente.
- **40 profesionales capacitados** en Manejo de Emergencias Obstétricas "Hora de oro".
- **44 profesionales capacitados** en Prevención Secundaria en Cáncer de Cuello Uterino mediante Inspección Visual con Ácido Acético y Crioterapia.



Salud: Mejorando los servicios

Más y mejor gestión institucional

- **23'958,733 soles** desembolsados por el SIS en pago de la deuda que mantenían con Cajamarca.
- **16'788.54 soles** por el **Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional** entre el Gobierno Regional de Cajamarca, EsSalud - Red Asistencial Cajamarca y el SIS.
- **5'848,920 soles** para el Mantenimiento de Infraestructura de 201 establecimientos de salud de toda la Región, afectados por las intensas lluvias durante el Niño Costero.
- Gestión con el Ministerio de Salud y los gobiernos locales para incorporar a **780 integrantes de las Rondas Campesinas de la Región Cajamarca al Sistema de Vigilancia Comunal en Salud.**



Más recursos humanos para una mejor atención

- **6'868,890 soles** incorporados para pago de bonos por Atención Primaria de Salud (APS) y especializada a los profesionales, técnicos y auxiliares en salud.
- **6,850 profesionales** de la salud (médico, enfermero, obstetrix) trabajando para la región.
- **421 profesionales** nuevos se han incorporado como personal nombrado.

DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO. DIRESA CAJAMARCA 2017

TOTAL	Grupo Ocupacional	Disponibilidad
DIRESA CAJAMARCA	Médico, enfermera, obstetrix, psicólogo, auxiliares entre otros.	6,850

FUENTE: HIS, Octubre 2017 - DIRESA CAJAMARCA.



GOBIERNO REGIONAL
Cajamarca

Trabajando
junto al pueblo

Salud: Más inversión para un mejor servicio



- Conformación del **Comité Técnico Permanente de la Estrategia Sanitaria Regional de Atención a Personas Afectadas por Contaminación con Metales Pesados y Otras Sustancias Químicas**, con Resolución Regional de Salud N° 702 – 2017 – GR.CAJ/DRS – DESP.
- **314,288 soles** destinados a la adquisición de equipos para atención en Salud Sexual y Reproductiva en EE.SS. I-1 al II-1.
- **81,500 soles** para la adquisición de 08 unidades dentales portátiles en las 07 redes de salud de la UE Cajamarca.
- Elaboración de Expediente Técnico para la construcción e implementación de las **Plataformas de Atención al Usuario en Salud**.
- Instalación del **Aplicativo Certificado Nacido Vivo** en línea en 71 establecimientos de salud.
- **3,107,300 soles** para la adquisición de equipamiento por Reposición.
- **36'641,353 soles** presupuesto distribuido en las 08 unidades ejecutoras para asegurar la continuidad del servicio y adquisición de medicamentos e insumos.

PROYECTOS CONCLUIDOS

Desarrollo Humano con Servicios de Calidad

Salud

7 proyectos concluidos con una inversión de 1'856 908 de soles beneficiando a 1 731 personas.

N°	Nombre del Proyecto	Costo de Inversión (S/)	Beneficiarios (personas)
1	Mejoramiento de la Capacidad de Atención Neonatal en el C.S. de Pachacútec. SNIP: 2302247	305,309	371
2	Mejoramiento de la Capacidad de Atención Neonatal en el C.S. La Ramada. SNIP: 2304525	302,589	34
3	Mejoramiento de la Capacidad de Atención Neonatal en el Hospital de Apoyo de Celendín. SNIP: 2302238	241,252	301
4	Mejoramiento de la Capacidad de Atención Neonatal en el C.S. San Pablo. SNIP: 2304524	196,823	121
5	Mejoramiento de la Capacidad de Atención Neonatal en el C.S. Baños del Inca. SNIP: 2302190	264,293	619
6	Mejoramiento de la Capacidad de Atención Neonatal en el C.S. Cachachi. CÓDIGO: 2302244	242,930	114
7	Mejoramiento de la Capacidad de Atención Neonatal en el Hospital de Apoyo de José Soto Cadenillas. SNIP: 2304528	303,712	171

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Desarrollo Humano con Servicios de Calidad

Salud

5 proyectos en ejecución con una inversión de más de 348 millones para beneficiar a más de 1 millón de personas.



Salud: Proyectos en Ejecución

1. CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SANTA MARIA NIVEL II-1, PROVINCIA DE CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. SNIP: 113089

Objetivo: Acceso a Adecuados Servicios de Salud en los Niveles de Mayor Complejidad en la provincia de Cutervo.

Costo de Inversión (S/.)	Monto (S/.) Ejecutado a la fecha	Avance físico %	Beneficiarios (personas)
85,944,247	26,611,196	16	131,932

Logros Alcanzados:

- Se vienen trabajando movimiento de tierras, obras de concreto simple, obras de concreto armado (muros de contención).
- En el módulo B 1 y B2 cuenta con un importante avance, se encuentra en el 2do nivel de su ejecución física.
- El módulo A3, se encuentra en el 3er piso de ejecución física.



2. Construcción e Implementación del Hospital II-1, Nuestra Señora del Rosario de Cajabamba. SNIP: 2107890

Objetivo: Acceso a servicios adecuados de salud.

Costo de Inversión (S/.)	Monto (S/.) Ejecutado a la fecha	Avance físico %	Beneficiarios (personas)
53,456,523	50,581,709	87	78 640

Logros Alcanzados:

- Llegada de todo el equipamiento hospitalario, para su pronta instalación.
- Culminación del hospital, en febrero del 2018.



Salud: Proyectos en Ejecución

3. Construcción e Implementación del Hospital II-2 de Jaén. SNIP: 123694

Objetivo: Dotar de infraestructura y acceso de salud a la población.

Costo de Inversión (S/.)	Monto (S/.) Ejecutado a la fecha	Avance físico %	Beneficiarios (personas)
115 956 177	92,358,760	96	376 865

Logros Alcanzados:

- Saldo de Obra listo para ejecutar, del 15%, que asciende a S/.9'800,000.00.
- Equipamiento informático y de comunicación
- Adquisición de la brecha de equipamiento de 6,000,000 y en proceso de convocatoria por 6,500,000.



4. CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL HOSPITAL II-1 DE SAN IGNACIO. SNIP: 123826

Objetivo: Mejora de la capacidad resolutive de los servicios de salud que brinda el establecimiento de salud San Ignacio.

Costo de Inversión (S/.)	Monto (S/.) Ejecutado a la fecha	Beneficiarios (personas)
81'587,241	1,822,653	62,456

Salud: Proyectos en Ejecución

5. MEJORAMIENTO DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS DE EDAD EN LA PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA. SNIP: 249002

Objetivo: Mejorar la calidad de atención y cuidado del crecimiento y desarrollo de los niños menores de 5 años desde la gestación en la provincia de Chota.

Costo de Inversión (S/.)	Monto (S/.) Ejecutado a la fecha	Avance físico %	Beneficiarios (personas)
11,347,216	2,632,237	33	902,239

Logros Alcanzados:

- **16** Gobiernos locales articulados y capacitados.
- Los beneficiarios directos son **18,098**, familias de niños menores de 5 años y madres gestantes.
- Los beneficiarios potenciales atendidos en los próximos 10 años serán: **37,783** personas.
- **100** agentes comunitarios de salud capacitados.
- **17** Centros de Promoción y Vigilancia acondicionados y equipados.
- **125** EESS con personal Capacitado.
- **39** EESS Equipados.
- **20** EESS Acondicionados



EDUCACIÓN: Cerrando Brechas



- **Creación de 6 nuevas IIEE del Nivel Primaria** a través del proceso de racionalización.
- Adquisición de **44 Kits de servicios higiénicos** para beneficiar a más de **1,000 estudiantes**.
- **2,893 Docentes acompañados** en **998 II.EE.**, multigrado y Polidocente para beneficiar a 48,945 estudiantes de la región Cajamarca. (PELA, JEC, Soporte Pedagógico, PFEF)
- **Saneamiento físico legal de 120 IIEE** de Inicial, Primaria y Secundaria en el ámbito de la región.

- Avances en la implementación del **INSTITUTO DE EXCELENCIA** en el **IESTP 4 de Junio de 1821**- Jaén, uno de los cuatro ejecutados a Nivel Nacional.
- **150 MIL SOLES** en útiles de escritorio **que beneficia a 36 Institutos Pedagógicos y Tecnológicos**.
- **2 MILLONES DE SOLES** recibidos por **cumplimiento de metas en los aprendizajes**.
- Gestión para la administración por mantenimiento escolar por un **monto de S/. 36 millones; que beneficia a 5,874 II. EE.**



Educación: Propuesta Pedagógica Regional



- **II Congreso Regional de Innovación Educativa** benefició a Directores, Docentes Estudiantes y Alcaldes de las 13 provincias.
- **III Encuentro de Pueblos originarios** con la participación de 1,000 personas de 08 provincias de la región.
- III Congreso de gestión de Riesgos y Desastres y Educación Ambiental que **beneficia a 400 Directores y Docentes** de las 13 provincias. Gestión para el Diplomado de SEGUNDA ESPECIALIZACIÓN: Diversidad e inclusión educativa de estudiantes con discapacidad, **beneficiando a 40 docentes de la región.**
- Monitoreo para la recuperación efectiva de clases de las 13 UGELs.
- El 98% de los docentes de Educación Inicial evaluados (**536 profesores**) aprobaron la evaluación de desempeño realizado por el MINEDU.

- Culminación de los **Proyectos Educativos Locales –PEL-** de las provincias de Santa Cruz y San Marcos.
- **Grandes avances del PEL de San Ignacio, Chota, Bambamarca y Celendín**
- Operatividad **de los 13 laboratorios de Innovación Educativa-LIE** en todas las provincias de Cajamarca.
- **Consolidación del Plan Lector**, que incluirá la publicación de cuentos, mitos y leyendas regionales.
- Operatividad **de los 13 laboratorios de Innovación Educativa-LIE** en todas las provincias de Cajamarca.



PROYECTOS CONCLUIDOS

Desarrollo Humano con Servicios de Calidad

Educación

3 proyectos concluidos con una inversión de 21'080 018 millones beneficiando a 2, 565 alumnos.

N°	Nombre del Proyecto	Costo de Inversión (S/)	Beneficiarios (personas)
1	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE SALLOF, CHONTAS, SAN VICENTE DE PALMO, LAGUNA SHITA Y MUÑUÑO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO. SNIP: 301811	7,226,014	740
2	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE VILUCO, PABELLON, EL PUQUIO, NUEVO PORVENIR LOS ALISOS Y COLPA DE LA PROVINCIA DE CUTERVO. SNIP: 301814	7,855,289	810
3	MEJORAMIENTO DE LA I.E. DULCE NOMBRE DE JESUS, DISTRITO DE JESUS - CAJAMARCA – CAJAMARCA. SNIP: 271667	6,006,715	1 015



PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Desarrollo Humano con Servicios de Calidad

Educación

18 proyectos en ejecución con una inversión de más de 60 millones de soles para beneficiará a 29 mil alumnos.



Educación: Proyectos en Ejecución

1. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 821010 CENTRO POBLADO SAN ISIDRO, DISTRITO JOSE SABOGAL, PROVINCIA DE SAN MARCOS, REGION CAJAMARCA. SNIP: 229572

Objetivo: Adecuado servicio educativo que promueve el apropiado desarrollo de logros de aprendizaje de los alumnos.

Costo de Inversión (S/.)	Monto (S/.) Ejecutado a la fecha	Avance físico %	Beneficiarios
3 808,309	2,141,306	61	1, 568



2. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E. N° 82165 YANATOTORA, DISTRITO DE LA ENCAÑADA, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA. SNIP: 184462

Objetivo: Adecuada oferta del servicio educativo.

Costo de Inversión (S/.)	Monto (S/.) Ejecutado a la fecha	Avance físico %	Beneficiarios
1 871, 295	413, 893	43	374



3. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E N 821015 - SANTA ROSA DE UNANCA, PROVINCIA DE SAN PABLO – CAJAMARCA. SNIP: 194617

Objetivo: Adecuada oferta del servicio educativo para el logro del aprendizaje.

Costo de Inversión (S/.)	Monto (S/.) Ejecutado a la fecha	Avance físico %	Beneficiarios
1 866, 999	278, 271	6	798



Educación: Proyectos en Ejecución

4. MEJORAMIENTO I.E. 82069 - LLACANORA, CAJAMARCA - CAJAMARCA. SNIP: 169636

Objetivo: Población escolar de la Institución Educativa N° 82069 – Llacanora, adecuadamente atendida.

Costo de Inversión (S/.)	Monto (S/.) Ejecutado a la fecha	Avance físico %	Beneficiarios
892, 668	626,892	59	2, 537



5. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO BELAUDE TERRY, DISTRITO DE CHETILLA, CAJAMARCA. SNIP: 163274

Objetivo: Adecuada oferta de servicios educativos para el logro del aprendizaje.

Costo de Inversión (S/.)	Monto (S/.) Ejecutado a la fecha	Avance físico %	Beneficiarios
3,372,397	37, 180	26	2,131



6. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. LEONCIO PRADO DE LA LOCALIDAD DE PANDALLE, DISTRITO DE PIMPINGOS - CUTERVO – CAJAMARCA. COD: 2322652

Objetivo: La Población Escolar de la I.E. Leoncio Prado acceden a Servicios educativos que cumplen estándares sectoriales.

Costo de Inversión (S/.)	Monto (S/.) Ejecutado a la fecha	Avance físico %	Beneficiarios
2,134,186	1,687,808	91	65



Educación: Proyectos en Ejecución

7. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA JORGE CHAVEZ DE LA LOCALIDAD DE CONDORHUASI, DISTRITO DE PIMPINGOS - CUTERVO – CAJAMARCA. COD: 2276486

Objetivo: Población escolar de I.E.S Jorge Chávez de Condorhuasi, adecuadamente atendida en los sectores de infraestructura.

Costo de Inversión (S/.)	Monto (S/.) Ejecutado a la fecha	Avance físico %	Beneficiarios
1,944,312	1,427,476	86	758



8. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E.S JUAN PABLO II , LOCALIDAD DE SALABAMBA, DISTITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA. COD: 2302289

OBJETIVO: Población escolar adecuadamente atendida en la Institución Educativa Juan Pablo II.

Costo de Inversión (S/.)	Monto (S/.) Ejecutado a la fecha	Avance físico %	Beneficiarios (personas)
3,061,888	1,186,693	30	1,040



9. MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E.S. FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA DEL C.P EL TAMBO , DISTRITO BAMBAMARCA, PROVINCIA HUALGAYOC-CAJAMARCA. SNIP: 296575

OBJETIVO: Adecuadas condiciones físicas para brindar el servicio educativo en la I.E. Secundaria Felipe Huamán Poma de Ayala.

Costo de Inversión (S/.)	Monto (S/.) Ejecutado a la fecha	Avance físico %	Beneficiarios (personas)
10, 674,323	2, 933,795	28	4,169



Educación: Proyectos en Ejecución

10. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.S DIVINO CORAZÓN DE JESÚS CP CUMBE CHONTABAMBA, DISTRITO BAMBAMARCA, PROVINCIA HUALGAYOC , REGIÓN CAJAMARCA. SNIP: 294426

OBJETIVO: Población escolar de la I.E. S. Divino Corazón de Jesús, accede a un servicio educativo adecuado que cumple con los estándares sectoriales.

Costo de Inversión (S/.)	Monto (S/.) Ejecutado a la fecha	Avance físico %	Beneficiarios (personas)
3,091,290	732,309	25	2,136



11. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.S JUAN PABLO II SARABAMBA, DISTRITO CHOTA, PROVINCIA CHOTA-CAJAMARCA.

OBJETIVO: Población escolar de la I.E. Juan Pablo II, tiene acceso a un servicio educativo adecuado que cumple con los estándares sectoriales.

Costo de Inversión (S/.)	Monto (S/.) Ejecutado a la fecha	Avance físico %	Beneficiarios (personas)
4,142,399	1,291,386	2	1,375



12. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL SECUNDARIO SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO DEL CC.PP SAN ANTONIO BAJO , DISTRITO BAMBAMARCA, PROVINCIA HUALGAYOC, REGIÓN CAJAMARCA. 278455

Objetivo: Adecuadas condiciones físicas y tecnológicas para brindar el servicio educativo.

Costo de Inversión (S/.)	Monto (S/.) Ejecutado a la fecha	Avance físico %	Beneficiarios (personas)
4,196,000	921,662	24	3,978



Educación: Proyectos en Ejecución

13. RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 16036 ALFONSO ARANA VIDAL - SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS, PROVINCIA DE JAÉN – CAJAMARCA. SNIP 53562

Objetivo: Mejorar la calidad de Educación de la población estudiantil de la localidad de las Naranjas.

Costo de Inversión (S/.)	Monto (S/.) Ejecutado a la fecha	Avance físico %	Beneficiarios (personas)
4'481,453	2,675,333	65	2,738



14. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 16070 CORAZÓN DE JESÚS DE LA LOCALIDAD DE TABACAL, DISTRITO JAÉN, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN CAJAMARCA. SNIP 288699.

Objetivo: Adecuado servicio educativo del nivel primario y secundario de la i.e. 16070 de la localidad de tabacal del distrito de Jaén.

Costo de Inversión (S/.)	Monto (S/.) Ejecutado a la fecha	Avance físico %	Beneficiarios (personas)
4'094,965	2,290,103.84	66	1,033



15. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E N° 16072 JORGE BASADRE - VALILLO, EN EL DISTRITO DE JAÉN – CAJAMARCA. SNIP 45658.

Objetivo: Población escolar de I.E. Jorge Basadre N° 16072, Valillo - distrito de Jaén, adecuadamente atendida.

Costo de Inversión (S/.)	Monto (S/.) Ejecutado a la fecha	Avance físico %	Beneficiarios (personas)
3'714,063	1,681,566	45	1,494



Educación: Proyectos en Ejecución

16. MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 16850 BUENOS AIRES LA LAGUNA - DISTRITO DE SAN JOSÉ DEL ALTO, PROVINCIA DE JAÉN – CAJAMARCA. SNIP: 89488

Objetivo: Adecuada oferta de servicios educativos para el logro del aprendizaje de la I.E. Nº 16850.

Costo de Inversión (S/.)	Monto (S/.) Ejecutado a la fecha	Avance físico %	Beneficiarios (personas)
538,876	173,236	35	83



17. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. PRIMARIA Y SECUNDARIA N 17524 SAN AGUSTÍN - SAN AGUSTÍN - BELLAVISTA - JAÉN – CAJAMARCA. SNIP: 44570

Objetivo: La población escolar del nivel primario y secundario de la I.E. 17524.

Costo de Inversión (S/.)	Monto (S/.) Ejecutado a la fecha	Avance físico %	Beneficiarios (personas)
5'369,789	1,594,865	18	2,723



18. SUB DRENAJE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 16093-JOSE GÁLVEZ DE CHUNCHUQUILLO, DISTRITO DE COLASAY - JAÉN – CAJAMARCA. SNIP: 183240

Objetivo: Mejorar la calidad de Educación de la población estudiantil de la localidad de las Naranjas.

Costo de Inversión (S/.)	Monto (S/.) Ejecutado a la fecha	Avance físico %	Beneficiarios (personas)
216,332	75,932	39	441



INCLUSIÓN: Vivienda, Construcción y Saneamiento



Instalación de **150 dosadores** de cloración en los Sistemas de Agua Potable en distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza con una **Inversión de 397,500 soles**

250 Profesionales y Técnicos capacitados para la Gestión Sostenible del Agua y Saneamiento

Fortalecimiento de los Gobiernos Locales de San Pablo, San Miguel, Chota, Celendín en **normativa de la Edificación y Formulación de Planes de Desarrollo Urbano.**

Promoción de Programas Habitacionales en San Miguel, San Pablo, Cajabamba, Celendín, Jorge Chávez, Sucre, Magdalena, Jesús, Centro Poblado de Porcón Alto.



Se cuenta con **Diagnósticos APROBADOS** de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en las provincias de Celendín y San Miguel.


BENEFICIARIOS CELENDÍN: 23,381 Habitantes.

BENEFICIARIOS SAN MIGUEL: 17,660 Habitantes

El GORECAJ, invertirá **1 150,000** para los estudios de Pre inversión y la consultoría de supervisión, monitoreo y evaluación, de cada proyecto.

Revalorar el Patrimonio Cultural para Fortalecer la Identidad e Integración Regional

- 106 escritores participaron del **Concurso Regional Vanguardia Literaria Cajamarquina 2017**. Impresión de 4000 ejemplares de trabajos ganadores en los géneros de poesía, narrativa, ensayo y teatro, cuya premiación y reconcomiendo será el 03 de enero del 2018.
- Se implementó la biblioteca **“Clásicos de la Literatura Regional Cajamarquina”**. Impresión de 3500 ejemplares del libro Mario Florián – Homenaje Centenario, que se están distribuyendo a todas las instituciones de nivel secundario de nuestra región.

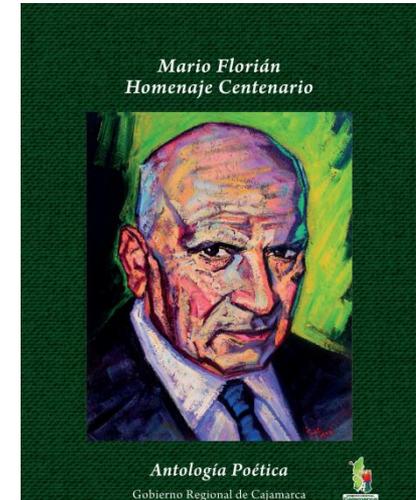

Inclusión: Poblaciones Vulnerables

Más y mejor servicio a personas en estado de vulnerabilidad

- **320 personas con discapacidad mejoran su calidad de vida al recibir sillas de ruedas**, gracias al convenio firmado por el GORE-CAJ, MIMP, CONADIS.
- **15 mujeres con discapacidad fortalecieron sus capacidades** en emprendimiento, autoestima y liderazgo; empoderándose en temas de Violencia de Género.
- **1343 personas con discapacidad se sumaron al beneficio de “Pensión por Discapacidad Severa”**, logro obtenido por un trabajo articulado entre el Gobierno Regional Cajamarca, Ministerio de Inclusión Social y OMAPED de la región.
- OREDIS cuenta con una **Línea De Base para cierre de brechas en discapacidad**.



Inclusión: Poblaciones Vulnerables

Más fortalecimiento de capacidades a nuestras Rondas Campesinas

- **IV Encuentro Regional de la Mujer Rondera de Cajamarca**, con la participación de 350 mujeres de las 13 provincias de la región.
- **Encuentro Regional de Comunidades y Rondas Campesinas de Cajamarca**, congregando 320 comuneros y ronderos de las 13 provincias de la región.



Inclusión: Promoviendo derechos y salud



- Aprobación del **Plan Regional para la Reducción y Control de Anemia Materno Neonatal y Desnutrición Crónica Infantil 2017-2021**, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 017-2017-GR-CAJ-GR.
- **Reconocimiento del espacio de Articulación Madre – Niño**. RER N°397-2017-GR-CAJ/GR.
- Fortalecimiento de capacidades al personal de salud, agentes comunitarios y líderes comunales de las 13 provincias en **Promoción de la Salud para reforzar la participación y empoderamiento de las familias-comunidad**.
- **Promoción de Campañas de Donación de Sangre en Cajabamba y Celendín**.
- **Campañas de Atención integral en Bambamarca y Chetilla**, disminuyendo brechas en el acceso a los servicios de salud.
- **Proyecto piloto de Estándares Esenciales de calidad en 10 Establecimientos de Salud** para promover la mejora del servicio de atención en salud y garantizar la seguridad del paciente.

- **Aprobación del Plan Regional Contra la Violencia de Género 2018-2030**, mediante Ordenanza Regional N° 017-2017-GR-CAJ/GR.
- Institucionalización de la **Transversalización del Enfoque de Género en las Políticas y Gestión del GORECAJ**, mediante Ordenanza Regional N° 016-2017-GR-CAJ/GR.
- Capacitación a servidores públicos, operadores de justicia, líderes sociales y organizaciones sociales en Prevención de la Violencia Familiar, Trata de Personas y Derechos Humanos a nivel regional.
- Publicación del Libro **“Violencia contra la mujer. Miradas desde el quehacer público cajamarquino”**.



Inclusión: Promoviendo espacios de articulación



Mejora de la identidad y aseguramiento:

- **95.8%** de niños con Certificado de Nacido Vivo, DNI y afiliación antes de los 30 días de edad.
- **77 %** de niños afiliados al SIS antes de los 30 días de edad.
- **Suscripción de convenio con el RENIEC** el 25 de Octubre 2017, con la finalidad de corroborar información de identidad para el seguimiento nominal de los niños de la Región Cajamarca.

- **Reuniones de articulación a nivel de 7 provincias** (Jaén, Cutervo, Hualgayoc, Celendín, Cajabamba, San Pablo y San Marcos) y el distrito de Asunción, **para el cierre de brechas.**

- Se elaboró el **Plan Multianual de Inversiones en salud a nivel Regional en coordinación con Oficina de Planeamiento Multianual de Inversiones, Unidad Formuladora y DIRESA.**



Inclusión: Más Protección Laboral



- **235 fiscalizaciones y orientaciones técnicas a micro-empresas** para el cumplimiento de la normatividad socio laboral.
- **80 conciliaciones a favor de los trabajadores beneficiándolos** con un total de 120.000 de soles.
- **244 trabajadores fueron insertados en el mercado laboral** , a través de la bolsa de trabajo, de las cuales 7 cuentan con habilidades diferentes.

- **450 trabajadores del régimen de construcción civil y servidores** de los gobiernos locales, capacitados sobre derechos socio laborales a nivel de toda la región Cajamarca.
- **650 carnets entregados a trabajadores de construcción civil**, para que puedan acceder a un trabajo formal y cobrar todos sus derechos socio laborales.



PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Desarrollo Humano con Servicios de Calidad

Inclusión: Protección Social

1 proyecto en ejecución con una inversión de más de 9 millones de soles para beneficiar a 736 niñas, niños y adolescentes.

1. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL SAN ANTONIO, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA-CAJAMARCA. SNIP: 283115

Objetivo: Adecuada prestación del servicio de atención integral de niñas, niños y adolescentes en la Aldea Infantil San Antonio.

Costo de Inversión (S/.)	Monto (S/.) Ejecutado a la fecha	Beneficiarios
9,308,104	763,067	736





GOBIERNO REGIONAL
Cajamarca

2.2. Desarrollo Integral con Sostenibilidad Ambiental

Conservando los recursos naturales y el ambiente regional especialmente el recurso hídrico para el equilibrio intergeneracional



GOBIERNO REGIONAL
Cajamarca

Trabajando
junto al pueblo

Gestión Ambiental Participativa



- Se cuenta con **3 instrumentos de fiscalización ambiental: Reglamento de supervisión ambiental, Reglamento de atención a denuncias ambientales y Procedimiento administrativo sancionador**; validados por los sectores competentes (DREM, PRODUCE, DIRCETUR, DIRESA).
- 8 municipalidades provinciales cuentan con su **Plan de Educación Cultura y Ciudadanía Ambiental- PLAN EDUCCA 2017-2021**.
- Se cuenta con un documento de **evaluación del estado situacional de las Comisiones Ambientales Municipales- CAM** .
- Documento de generación de **Línea Base sobre el Estado Situacional en materia ambiental de la Región**.
- **Se aprobó el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental del GORECAJ- PLANEFA 2018, mediante RER N°561-3017-GR-CAJ/GR**.
- **Creación del Sistema de Información Ambiental Local del distrito de Hualgayoc –SIAL- INFOCENTRO**.

- Inspección ocular a las Lagunas: **La Aurora, Las Gemelas, La Cueva de Campo, Quebradas las Gradas y Quebrada Tacamache en la Mina de Tantahuatay**.

- Se cuenta con una **Línea Base de la calidad Ambiental en el área de influencia de la actividad minera formal e informal del distrito de Cachachi- Cajabamba**, con el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA.

- **Monitoreo participativo en la Huaylla- Quilish**, verificación de manantiales que se usa para agua de consumo humano y riego de cultivos.



Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas



- Se presentó al SERNANP el Expediente Técnico de la propuesta del “**Área de Conservación “Bosques el Chaupe Cunia y Chinchiquilla”** con una extensión de 23,505 hectáreas a intervenir.
- Entrega de **estudios de biodiversidad a las rondas campesinas de Santa Rosa de Crisnejas** el cual se creó como área de conservación rondera, con una extensión de 5046.34 hectáreas.
- Se realizaron **estudios de biodiversidad en la comunidad campesina San Gregorio**, con aprobación de la comunidad se presenta ante el SERNANP, para ser reconocida como área de conservación privada, con una extensión de 7038.31 hectáreas.

- Se declaró de interés público regional la propuesta **RAMSAR las Lagunas del Alto Perú, San Cirilo y Yanacanchilla**, con Ordenanza regional N° 12-2017-GR.CAJ-CR.




Laboratorio Regional del Agua

- El Laboratorio Regional del Agua, ha renovado su acreditación ante el INACAL, desde Diciembre de 2017 a Diciembre de 2021.
- Seguimos autofinanciando nuestras actividades, en un 70% con Recursos Directamente Recaudados).
- **AMPLIAMOS** la acreditación; de 43 parámetros pasamos a 90 parámetros ACREDITADOS por el Instituto Nacional de la Calidad (INACAL), con la finalidad de mejorar el servicio brindado a los usuarios de la Región Cajamarca y otras regiones que solicitan nuestro servicio.

Sostenibilidad Ambiental



- ▶ Contamos con acreditación nacional e internacional otorgado por el Instituto Nacional de Calidad – INACAL, de acuerdo con la norma NTP-ISO/IEC 17025.
- ▶ Reconocimiento entre 367 laboratorios a nivel mundial, como un laboratorio de calidad y excelencia para el logro al 100% de datos aceptables en análisis, otorgado por ERA.

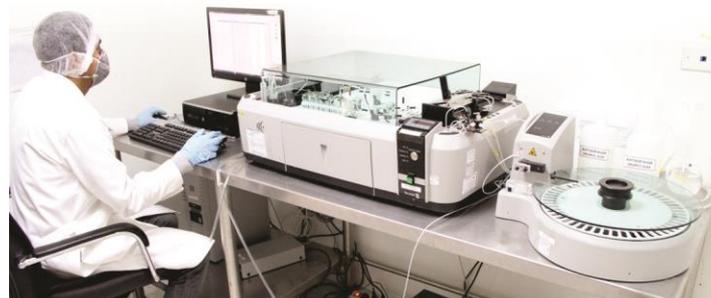

- ▶ El Laboratorio Regional del Agua ofrece: monitoreo, análisis físico, químico y biológico en aguas.
- ▶ Servicio de asesoramiento en el manejo de equipos de campo y toma de muestras adecuadas.
- ▶ Recepción, conformidad, almacenamiento y análisis de muestras, un servicio físico, químico y microbiológico confiable, oportuno y confidencial.

Jr. Luis Alberto Sánchez S/N, Urb. El Bosque (Paradero a Minera)
Correo: laboratoriodelagua@hotmail.com / Telf. 076-599000 Anexo 1140

PROYECTOS CONCLUIDOS

Desarrollo Integral con Sostenibilidad Ambiental

Sostenibilidad Ambiental

1 proyecto concluido con una inversión de más de 3'999,500 millones de soles para beneficiar a 18,782 personas.

N°	Nombre del Proyecto	Costo de Inversión (S/)	Hectáreas incorporadas	Beneficiarios (personas)
1	Fortalecimiento para la Forestación y Reforestación con especies nativas y exóticas en las Zonas de Chirinos, Distrito de Chirinos – San Ignacio – Cajamarca”. SNIP 146709.	3'999,500	1,290	18,782 (18 caseríos)



PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Desarrollo Integral con Sostenibilidad Ambiental

Sostenibilidad Ambiental

3 proyectos en ejecución con una inversión de más de 12 millones de soles para beneficiar a 517 404 personas.

1. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA. SNIP: 279565

Mejorar los servicios de gestión ambiental, conservación de recursos naturales y biodiversidad ofrecida por la gerencia regional de recursos naturales y gestión del medio ambiente.

Costo de Inversión (S/.)	Monto (S/.) Ejecutado a la fecha	Avance físico %	Beneficiarios (personas)
3,621,710	770,484	30	449,680



Sostenibilidad Ambiental: Proyectos en Ejecución


2. RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN HÍDRICO DEL ÁREA DE AMORTIGUAMIENTO DEL BOSQUE DE PROTECCIÓN PAGAIBAMBA, DISTRITO DE QUEROCOTO, PROVINCIA CHOTA, REGIÓN CAJAMARCA. SNIP 235587

Objetivo: Recuperación del Servicio Ambiental Hídrico del Área de Amortiguamiento del Bosque de Protección Pagaibamba.

Costo de Inversión S/.	Monto Ejecutado a la fecha S/.	Avance físico %	Hectáreas a Reforestar	Beneficiarios
3 951,149	2,082,787	57	3 085	2, 131 (8 caseríos)

Logros Alcanzados:

- Se ha reforestado 261.9 hectáreas en macizo y cercos vivos, en los C.P de: Ayanchacra, Ayuran, Obraje, Campamento, Naranjo, Rocoto, San Luis, Cruz Roja.
- Conformación y equipamiento de 01 comité de vigilancia para la protección del bosque de protección de Pagaibamba.
- Diagnóstico y línea de base del bosque de protección Pagaibamba.

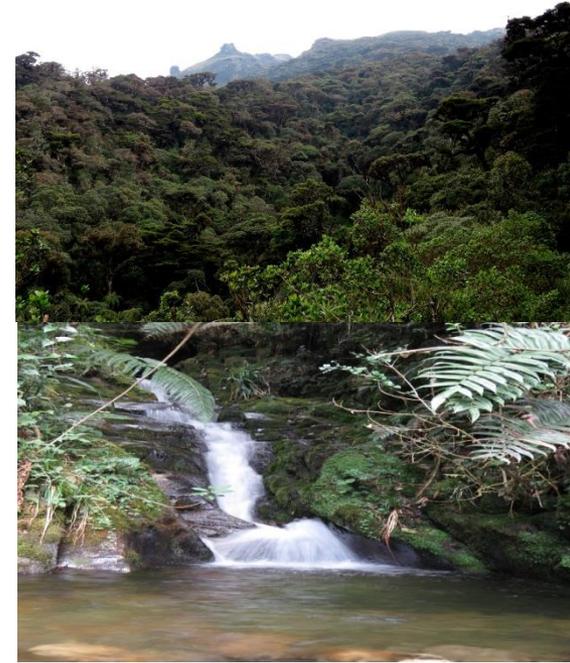

3. RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN DE SUELO EN LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE, JAÉN, CAJAMARCA. SINP 233833

Objetivo: Mediante la reforestación con especies nativas adaptadas a las condiciones edafoclimáticas de la zona y el desarrollo de capacidades locales en el manejo de sistemas agroforestales, contribuyendo a la educación y sensibilización ambiental para la gestión de recursos naturales con enfoque participativo e integral.

Costo de Inversión (S/.)	Monto (S/.) Ejecutado a la fecha	Beneficiarios (personas)
4'474,916	241,423	65,593

Ordenamiento Territorial



- Se **georreferenció los límites de la comunidad nativa de Supayaku** después de una semana de internamiento en plena selva limítrofe con Amazonas, gracias al trabajo conjunto entre Acondicionamiento Territorial y Titulación de Tierras.
- Se aprobó con Resolución Jefatural de la PCM el **Estudio de Diagnóstico y Zonificación Territorial de la provincia de San Miguel**.
- Se culminó el **saneamiento del límite interdepartamental entre Cajamarca y Amazonas**.
- **61 centros poblados categorizados**, de los cuales 3 pasan a ser Pueblo y 58 a Caserío.

- Se capacitó a funcionarios de la Dirección de agricultura, educación, energía y minas y municipios, SERFOR, en el **uso de imágenes satelitales del PERU SAT-1**.
- **MÁS de 200 investigadores participaron del Seminario Permanente de Investigación Agraria SEPIA**, y fuimos organizadores de la Mesa Regional de Ordenamiento Territorial.
- Se remitió las recomendaciones técnicas para la mejora del **Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Chota y Cajamarca**.
- Se publicó la sistematización del proceso ZEE y Ordenamiento Territorial con el apoyo del Grupo Propuesta Ciudadana.
- Se apoyó **para el saneamiento de 16 inmuebles a favor del Estado** y se logró apoyo con Voluntario de Corea del Sur en Desarrollo Rural.





2.3. Desarrollo Económico Competitivo

GOBIERNO REGIONAL
Cajamarca

Generando la Competitividad
Incrementando los ingresos de la población



GOBIERNO REGIONAL
Cajamarca


Trabajando
junto al pueblo

Economía Rural: Recursos Forestales y Fauna Silvestre

PRODUCCIÓN DE PLANTONES AL II SEMESTRE 2017

	Especies	N° Plantones	N° Has. Instaladas	N° Beneficiarios
Especies Forestales	Pino, Eucalipto, Ciprés	373,954	285.1	1140
Especies Frutícolas	Palto, Granadilla, Chirimoyo, Lúcuma	31,950	69.87	200
Especies Nativas	Aliso, Capulí, Molle	19,700	17.9	71
Especies Industriales	Tara, Café, Cacao	93,576	51.9	207
Total		459,100	424.75	1618



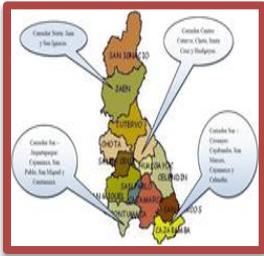

Se priorizaron las **cadena productivas de leche y derivados lácteos, aguaymanto, café, cacao, palta, maíz morado, mango, tara, cuyes y artesanía**, en el marco del PROCOMPITE, que se implementarán en el 2018, con una **inversión de 4 millones de soles**.

Se firmó el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el GORECAJ y la ONGD KAIPACHA INTI – ESPAÑA, en el marco del proyecto integral de **“MEJORA GENÉTICA BOVINA, MEDIANTE IMPLANTACIÓN DE EMBRIONES CENTRADO EN RAZAS DE PRODUCCIÓN LECHERA O CARNICA, EN CAJAMARCA - PERÚ”**.



En el marco del **CORETARA** se realizó el **II ENCUENTRO REGIONAL DE PRODUCTORES DE TARA CAJAMARCA – PERÚ**, con la participación de **80 productores**, entre estudiantes de universidades, institutos y productores de tara procedentes de todas las provincias de la región los cuales intercambiaron experiencias y generaron propuestas de desarrollo para incrementar la productividad, mejorar la calidad y exportar de manera asociada.



Economía Rural: *Desarrollo Tecnológico*



45 profesionales de las agencias agrarias y funcionarios de los Gobierno Locales participaron del taller: **Formulación y Evaluación de Planes de negocio en el marco de la Ley 29337 – PROCOMPITE**, fortaleciendo sus capacidades técnicas.

En el marco del COREMYPE, el GORECAJ realizó el estudio de la Cadena de Valor de Derivados Lácteos en Cajamarca, el cual permitirá postular ante el Ministerio de la Producción para acceder a financiamiento para generar un CLUSTER de lácteos en Cajamarca.



En la **VI SEMANA DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN LA REGION CAJAMARCA – 2017**, participaron 182 personas entre investigadores, técnicos, estudiantes, productores, de las diversas instituciones Publicas, Privadas y las diferentes Universidades de la Región. Asimismo, se realizó el encuentro de Ofertantes y Demandantes de Ciencia Tecnología e Innovación, lográndose la identificación de 179 temas de investigación, que contribuirá a mejorar la competitividad de las diferentes cadenas productivas priorizadas por cada corredor económico de la región.

PROYECTOS CONCLUIDOS

Eje Desarrollo Económico Competitivo

Economía Rural

2 proyectos concluidos con una inversión de 3'511,085 beneficiando a 1 205 personas.

N°	Nombre del Proyecto	Costo de Inversión (S/)	Beneficiarios (personas)
1	MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CENTRO POBLADO DE HUAGAL, DISTRITO DE JOSE SABOGAL, PROVINCIA DE SAN MARCOS, REGION CAJAMARCA. SNIP: 199026	2,774,612	445
2	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DEL CASERIO LA COLPA, DISTRITO DE JESUS - CAJAMARCA - CAJAMARCA	736, 473	760



PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Eje Desarrollo Económico Competitivo

Economía Rural

9 proyectos en ejecución con una inversión de más de 88 millones para atender a 61 mil 620 beneficiarios.



Economía rural: Proyectos en ejecución

1. MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DE SERVICIOS AGRARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA CAJAMARCA . SNIP: 184383

Objetivo: Mejorar la provisión de los servicios agrarios de la Dirección Regional de Agricultura.

Costo de Inversión (S/.)	Monto (S/.) Ejecutado a la fecha	Avance físico %	Beneficiarios (personas)
10,230,435	9,702,488	88	19, 028

Logros Alcanzados:

- 120 Tn de taya comercializada por la Coop. Santa Cruz por 252 mil soles.
- 16 Tn de palta exportada a Francia y España por la coop Celendín por 73800.00 soles.
- 7 cooperativas cafetaleras vendieron 40430.00 qq de café por 17082700.00 soles.
- 24 promotores en inseminación artificial, 33 promotores de taya y 25 promotores de café acreditados por el SINEACE.



2. MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE RIEGO TECNIFICADO EN EL CENTRO POBLADO DE CUMBICO, DISTRITO MAGDALENA, PROVINCIA CAJAMARCA, REGIÓN CAJAMARCA, CON CÓDIGO SNIP :204416

Objetivo: Incrementar la Producción y productividad de los cultivos en el C.P. Cumbico, beneficiando a 378 usuarios e irrigando a 254 Ha.

Costo de Inversión (S/.)	Monto (S/.) Ejecutado a la fecha	Avance físico %	Beneficiarios (personas)
5,278,938	2,866,471	60	378

Logros Alcanzados:

- 05 reservorios, 03 Captaciones, 01 bocatoma y 11 cámaras de inspección concluidos.
- 3.3 km de línea de conducción.
- 48 km de línea de distribución.



Economía rural: Proyectos en ejecución

3. MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGION CAJAMARCA. SNIP: 225834

Objetivo: Desarrollar y fortalecer capacidades y habilidades competitivas de los productores rurales de ganado bovino lechero de la región Cajamarca.

Costo de Inversión (S/.)	Monto (S/.) Ejecutado a la fecha	Beneficiarios (personas)
57,587,043	355,159	25,621

Logros Alcanzados:

- Lanzamiento del proyecto en las 13 provincias de la región
- Convocatoria del centro genético, aretes para identificación de vacunos, tanques criogénicos, línea de base y mobiliario.



4. MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CASERÍO DE SANTA CATALINA, DISTRITO DE CUPISNIQUE, PROVINCIA DE CONTUMAZÁ, REGIÓN CAJAMARCA. SNIP: 199060.

Objetivo: Incremento de la Producción de los cultivos agrícolas y frutales, para incorporar 292.5 hectáreas a la producción irrigadas por sistema de goteo.

Costo de Inversión (S/.)	Monto (S/.) Ejecutado a la fecha	Avance físico %	Hectáreas incorporadas	Beneficiarios
5,571,604	4,536,719	70	292.1 Ha	215

Logros Alcanzados:

- Construcción de 01 Bocatoma de concreto, canal aductor y desarenador.
- Construcción de 01 reservorio cubierto de Geomembrana de polietileno de 1.5 mm de dimensiones 50m x 40m x 3.5 m.
- Instalación de un sistema de riego tecnificado por goteo para 292.1 Hectáreas.
- Instalación de 80% de las redes de Conducción, distribución y laterales



Economía rural: Proyectos en ejecución

5. MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO CRIOLLO Y CRIOLLO MESTIZO A NIVEL MULTILOCAL, DISTRITO DE SANTO TOMAS - CUTERVO – CAJAMARCA. CÓDIGO: 2190681

Objetivo: Incrementar la Productividad del Ganado Vacuno Criollo y Criollo Mestizo.

Costo de Inversión (S/.)	Monto (S/.) Ejecutado a la fecha	Avance físico %	Beneficiarios (personas)
1,837,389	1,724,058	95	7,305

Logros Alcanzados:

- Se realizaron 10 cursos talleres, 1200 Inseminaciones Artificiales. Nacieron 324 terneros como producto de la Inseminación Artificial.
- Se tiene 140 animales vacunos preñados de Inseminación Artificial.
- Se cuenta con 03 postas de Inseminación Artificial implementadas y 01 centro genético implementado.
- Se logró fortalecer las capacidades, por medio de cursos talleres a 700 productores.



6. MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO CRIOLLO Y CRIOLLO MESTIZO EN EL DISTRITO DE LA RAMADA - CUTERVO - CAJAMARCA. CÓDIGO: 2185616

Objetivo: Incrementar la productividad del ganado vacuno.

Costo de Inversión (S/.)	Monto (S/.) Ejecutado a la fecha	Avance físico %	Beneficiarios (personas)
1,527,959	1,402,923	95	3,215

Logros Alcanzados:

- 36 talleres de capacitación realizados.
- 21 has de pastos mejorados instalados, 871 vacas inseminadas.
- 240 terneros nacidos, producto de inseminación artificial.
- Instalación del primer centro genético en la provincia de Cutervo.
- Asistencia técnica permanente, en alimentación, sanidad, manejo y reproducción en vacunos.



Economía rural: Proyectos en ejecución

7. AMPLIACIÓN, RECUPERACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SAN JOSÉ DEL ALTO - JAÉN – CAJAMARCA. CÓDIGO: 2310439

Objetivo: Suficiente provisión de energía eléctrica en forma integral y confiable.

Costo de Inversión (S/.)	Monto (S/.) Ejecutado a la fecha	Avance físico %	Beneficiarios (personas)
1'812,248	1'179,995	92	3,781



8. INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL MICROCUENCA CHIRIMOYO - CAJAMARQUINO – CAJAMARCA. SNIP: 203477

Objetivo: Localidades Nuevo Edén de Mogol, Alcaparrosa, Cochas, Chirimoyo, Yahuarmarca y Huayobamba, conectadas y vinculadas al servicio básico de energía eléctrica.

Costo de Inversión (S/.)	Monto (S/.) Ejecutado a la fecha	Avance físico %	Beneficiarios (personas)
3,368,007	717,327	10	1,565




9. ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS POQUISH Y CHUPICA, DISTRITO DE SAN BERNARDINO, PROVINCIA DE SAN PABLO – CAJAMARCA.

Objetivo: Población de los caseríos de Poquish y Chupica, distrito de San Bernardino, provincia de San Pablo - departamento de Cajamarca, vinculada al servicio básico de energía eléctrica

Costo de Inversión (S/.)	Monto (S/.) Ejecutado a la fecha	Avance físico %	Beneficiarios
887,557	15,939	19	512



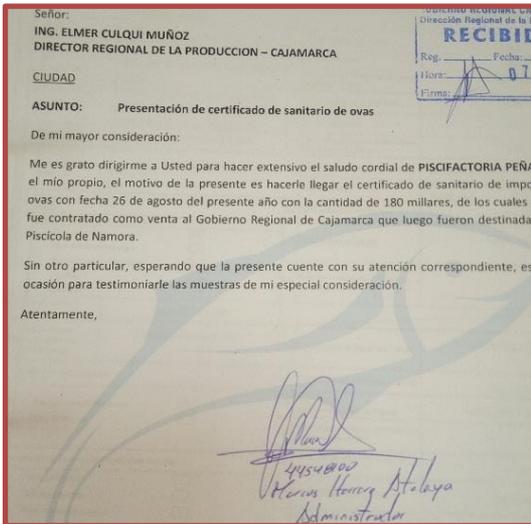

- **5 Certificaciones de Autorización para Importación de 465 000** ovas embrionadas de trucha procedentes de España y EE.UU. requeridas por **2 Piscigranjas y 04 Empresa Importadoras.**
- **22 Autorizaciones para el desarrollo de la acuicultura:** AMYPE: 05, Arel: 05 Permisos de Pesca artesanal: 07 en Jaén, Chota, Cutervo y Cajamarca.
- **7 Permisos de Pesca artesanal otorgados,** a pescadores de Cajamarca, Chilete, Tembladera y Distrito de Huarango - San Ugnacio.

- **1 monitoreo y verificación** en la quebrada el Pululo Porcón Cajamarca.
- **10 Evaluaciones y Fiscalizaciones Ambientales:** en las Piscigranjas de Namora, La Encañada, Cutervo, porcón – Cajamarca, San Marcos y San Miguel.
- **4 Supervisiones ambientales:** en Namora, La Encañada, Cutervo y San Marcos.
- **12 Inspecciones Técnicas a Piscigranjas:** 12 en Baños del Inca, Cajamarca, San Miguel y Celendín.






- **20 Recursos Hídricos Evaluados** para el desarrollo de la acuicultura en las zonas de: San Ignacio, Jaén, San Miguel y San Marcos.

- **4 repoblamientos en ríos y lagunas:** con 10 000 **Alevinos de Trucha Arco Iris** en las provincias de Cajamarca, Celendín, San Miguel y San Pablo.

- **1 repoblamiento con 5 000 Alevinos de Paco**, en la represa Gallito Ciego - Tembladera – Contumazá.

- **23 Asesoramientos y asistencias técnicas personalizadas a piscigranjas** en los lugares de Namora, La Encañada, Baños del Inca, Cajabamba, Cajamarca, San Miguel y San Marcos.

- **417 Capacitados** en materia de acuicultura y pesca a: piscicultores, pescadores, comerciantes e interesados.

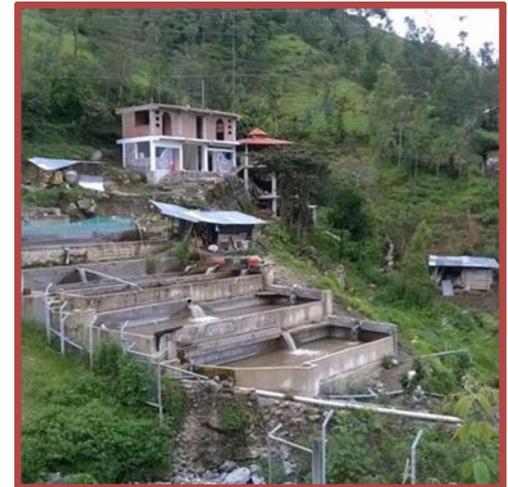

Acuicultura y Pesca



455 personas participaron del **I Congreso Internacional de Acuicultura y Desarrollo Rural – Retos y Propuestas Para el Desarrollo de la Acuicultura en el Perú**, con 06 expositores Internacionales y 16 expositores nacionales.

Con la asistencia de 50 organizaciones se desarrolló la **II Expo Feria Binacional de pesca y acuicultura Perú–Ecuador** en el puerto internacional la balsa distrito de Namballe – San Ignacio.





- 35 Asesoramientos y Asistencias Técnicas en Constitución y Formalización de organizaciones y en temas de Competitividad Asociativa.
- 116 capacitados en temas de desarrollo empresarial, productivo y articulación a nivel Regional.

- 12 organizaciones constituidas entre empresas, asociaciones y cooperativas.
- 63 derechos otorgados para el uso, transporte y comercialización de insumos químicos fiscalizados.

YANQUE, NOTARIO ABOGADO DE ESTA CIUDAD, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 4072423, CON R.U.C. N° 2005724231, CON DOMICILIO LEGAL EN EL AVENIDA MANCO CARRIC N° 508 -DISTRITO LOS BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.-----
PROCEDER POR SU PROPIO DERECHO-----
EL SEÑOR HECTOR GAMONAL GONZALEZ, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 27393816, DE COLOCACION EMPRESARIAL, CASADO CON (LA SRA. ESSELINDA IDROGO VASQUEZ, CON DNI N° 27417903), CON DOMICILIO EN LA AV. INCA GARCILOZO DE LA VEGA N° 1002, DEL DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA-----
EL COMPARECIENTE ES MAYOR DE EDAD, SOLAPANTE, HABIL, PARA CONTRATAR A INTELIGENTE EN EL SIGMA COSTELLANO, A QUIEN IDENTIFICO, PROCESÉ CON CAPACIDAD, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO BASTANTE DE CONFORMIDAD CON EL EXAMEN QUE HE EFECTUADO, DE LO QUE SOY FE, Y HE ENTREGADO UNA MONEDA DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LETRADO, LA MISMA QUE ARCHIVO EN SU LEGAJO RESPECTIVO BAJO EL NÚMERO DE ORDEN CORRESPONDIENTE Y CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE-----
MINUTA:-----
SEÑOR NOTARIO DE CONFORMIDAD CON EL T.U.O. DE LA LEY DE IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y AL CRECIMIENTO EMPRESARIAL, D.S. N° 013-2013-PRODUCE, SE SIRVA USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS, UNA DE CONSTITUCIÓN DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, QUE OTORGA: EL SEÑOR HECTOR GAMONAL GONZALEZ, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 27393816, DE COLOCACION EMPRESARIAL, CASADO CON (LA SRA. ESSELINDA IDROGO VASQUEZ, CON DNI N° 27417903), CON DOMICILIO EN LA AV. INCA GARCILOZO DE LA VEGA N° 1002, DEL DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, QUIEN ACTÚA POR SU PROPIO DERECHO CON PLENA CAPACIDAD DE GOCE Y EJERCICIO EN SUS DERECHOS CIVILES PARA SUSCRIBIR LA PRESENTE MINUTA BAJO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTENIDOS EN LAS CLÁUSULAS SIGUIENTES-----
PRIMERO: POR EL PRESENTE INSTRUMENTO, EL OTORGANTE CONVENE EN CONSTITUIR UNA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, BAJO LA DENOMINACIÓN "EMPRESA DE PRODUCTORES LACTICOS GAMONAL IDROGO GAMILAC E.I.R.L.", CON UN CAPITAL, DEDICADO, DURACION Y DEMÁS ESTIPULACIONES QUE SE ESTABLEZCAN EN EL ESTATUTO-----
SEGUNDO: EL CAPITAL INICIAL DE LA EMPRESA ES DE S/ 18, 000.00 (DIECIOCHO MIL CON 00/100 SOLES), INTEGRAMENTE SUSCRITOS Y PAGADOS POR EL TITULAR, MEDIANTE BIENES ONEROSOS,-----
EL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO EN UN 100 %, CONFORME CONSTA DE LA DECLARACIÓN JURADA DEL TITULAR GERENTE DE EMPRESA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 10 DEL D.S. N° 013-2013-PRODUCE, QUE USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRÁ INSERTAR AL FINAL DE LA ESCRITURA PÚBLICA QUE ORIGINA LA PRESENTE MINUTA EN LO QUE CORRESPONDE-----
TERCERO: LA EMPRESA SE REGISTRARÁ DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE ESTATUTO-----
ESTATUTO-----



Conectividad Territorial: Vías y transitabilidad



685.765 km de carreteras departamentales con Mantenimiento Rutinario garantizando la transitabilidad de personas y productos.

30 mantenimientos preventivos y 24 correctivos de los sistemas de telecomunicaciones, en las provincias de Jaén, San Ignacio, Cutervo y Chota **beneficiando a 20 mil habitantes** de la Región.



PROYECTOS CONCLUIDOS

Eje Desarrollo Económico Competitivo

Conectividad Territorial

1 proyecto concluido con una inversión de 8,701,246 millones de soles para beneficiar a 9,436 personas.

N°	Nombre del Proyecto	Costo de Inversión (S/)	Beneficiarios (personas)
1	Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular en Otuzco - Rinconada Otuzco -Otuzco La Victoria - PuyLucana, distrito de los Baños del Inca - Cajamarca – Cajamarca. SNIP: 230102	8,701,246	9,436



PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Eje Desarrollo Económico Competitivo

Conectividad Territorial

2 proyectos en ejecución con una inversión de más de 10 millones de soles para beneficiar a 3 728 personas.



Conectividad Territorial: Proyectos en Ejecución

1. CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL TRAMO CRUCE INGUER - PALTIC - SAGASMACHE - LA COLPA - PARIC, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA (AFIRMADO). COD: 251728

OBJETIVO: Eficiente comunicación terrestre entre los caseríos y comunidades ubicadas entre el área de influencia del PIP y los mercados locales y regionales.

Costo de Inversión (S/.)	Monto (S/.) Ejecutado a la fecha	Avance físico %	Beneficiarios (personas)
8,638,257	6,864,655	31	2,588



2. REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TROCHA CARROZABLE ICHOCÁN- LA TULPUNA, DISTRITO DE ICHOCÁN, PROVINCIA DE SAN MARCOS, REGIÓN CAJAMARCA. SNIP: 203122

Objetivo: Facilidad en el transporte de pasajeros y productos para acceder a los mercados de Ichocán, La Tulpuna y otros mercados locales y regionales.

Costo de Inversión (S/.)	Monto (S/.) Ejecutado a la fecha	Avance físico (%)	Beneficiarios (personas)
1,679,724	1,452,402	90	1, 140



Logros Obtenidos:

Buena transitabilidad para el transporte de carga y pasajeros a los lugares adyacentes al proyecto, con afirmado de 3.04 km., construcción de un puente de concreto armado, construcción de obras de arte y muros tipo gavión.



Conectividad Territorial: Proyecto paralizado

MEJORAMIENTO CARRETERA CA-103;EMP.PE-06B (SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA-ROMERO CIRCA-LA LAGUNA-TONGOD-CATILLUC EMP.PE 06C (EL EMPALME). SNIP: 95883

Objetivo: Buena transitabilidad para el transporte de carga y pasajeros desde los mercados provinciales de Santa Cruz, y distritales de Catilluc, Tongod y Anexos, en la provincia de San Miguel, hacia la región Cajamarca.

Costo de Inversión (S/.)	Monto (S/.) Ejecutado a la fecha	Avance físico (%)	Beneficiarios (personas)
89' 593, 943	40,096,639	21	53, 493

Con fecha 04 de febrero, se suscribe el Contrato N°002-2016-GR.CAJ/GGR, derivado de la Licitación Pública N° 002-2015-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA, suscrito entre el Gobierno Regional de Cajamarca y la Empresa Contratista CONSORCIO CATILLUC, integrado por las Empresas "ESTRACO S.A. SUCURSAL PERU" y "RM. BRITANIA CONTRATSITAS GENERALES"; por un monto contractual de Ochenta Millones Trescientos Treinta y Siete Mil Novecientos Once con 92/100 Soles (80'337,911.92), y con un plazo de ejecución de 540 días calendario.

El CONSORCIO CATILLUC, ha incurrido en la causal de **Incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo** (referente a la no utilización de campamento y no presencia de profesionales), la que ha provocado un retraso en la ejecución de la obra.

Teniendo en cuenta que el área técnica Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones y Gerencia Regional de Infraestructura, recomiendan la resolución de contrato por incumplimiento de obligaciones contractuales, ésta deberá ceñirse de conformidad al numeral 1) del artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, determinándose la resolución de contrato **por Incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo**, pese haber sido requerido para ello.

Corresponde efectuar la resolución de contrato en atención a la información técnica emitida por la Gerencia Regional de Infraestructura, la misma que de acuerdo a sus funciones y responsabilidades es la encargada de verificar el proceso de ejecución de los proyectos de inversión de acuerdo a normativa vigente, es por ello que mediante Resolución Gerencial General Regional N° 235-2017-GR.CAJ/GGR de **fecha 22 de setiembre del 2017, Se Resuelve El Contrato.**



Sector minería y asuntos ambientales



- **7 empresas formalizadas en Pequeña Minería no metálica (Cal)** generando 140 puestos de trabajo con derecho a sus beneficios sociales.
- **10 empresas de Pequeña Minería y Minería Artesanal fiscalizadas**, en Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo, para prevenir y reducir accidentes de trabajo en beneficio de los trabajadores.
- **30 denuncias atendidas de minería informal e ilegal**, con la participación de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, rondas campesinas y otras instituciones publicas y privadas, evitando la expansión de la minería no formal.
- **500 mineros informales** capacitaciones en el ámbito regional, en **Seguridad, Medio Ambiente** y en el cumplimiento de los requisitos del Proceso de Formalización Minera.
- Se **otorgaron 14 Certificaciones Ambientales** para proyectos de Pequeña Minería y Minería Artesanal, no metálica (caliza, arena, carbón de piedra, arcilla), que permitirá promover dichas actividades con responsabilidad ambiental y social, beneficiando a un promedio de 280 familias a nivel regional.
- **36 supervisiones ambientales a empresas de la pequeña minería y minería artesanal**, logrando mejorar la protección y el cuidado ambiental.
- **26 denuncias atendidas por contaminación ambiental**, logrando prevenir y corregir daños al medio ambiente; de las cuales 03 empresas mineras han sido sancionadas con un total de 20 UIT.

- **35 Proyectos de Electrificación Rural, cuentan con su Instrumento de Gestión Ambiental aprobadas**, logrando que 1,660 localidades de la Región Cajamarca, se electrifiquen conservando su medio ambiente, y la mejora de la calidad de vida de 63,646 familias.
- 20 Empresas de Grifos, Plantas Envasadoras, Grifos Rurales y Estaciones de Servicios, **cuentan con su Declaración de Impacto Ambiental aprobadas**; lo cual contribuye a la disminución de la informalidad en la venta de combustibles y la generación de pasivos ambientales; asimismo generará 320 puestos de trabajo.



Turístico Rural y Artesanal



- Inclusión en el programa de **Turismo Rural Comunitario del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo a la Laguna San Nicolás de Cajamarca.**
- **03 emprendedores realizaron pasantía** en la Isla de los Uros – Puno.
- 03 emprendedores participaron en el **“I Workshop región Norte de Turismo Rural Comunitario”.**

- 372 personas capacitadas del sector turismo en temas de **cultura turística y calidad de servicio**, que permitirá mejorar la imagen y competitividad turística del destino Cajamarca.



- **385 participantes** en el **VII Concurso Internacional de Pintura “Mario Urteaga Alvarado”** y sesenta y seis mil (S/. 66,000.00) soles en premios distribuidos en 04 categorías (Paisaje nocturno, Paisaje realista, Paisaje contemporáneo y Concurso de Fotografía); generado un movimiento económico de **147,060 soles** en tres (03) días que dura el evento.

- Contamos con el **Plan Estratégico Regional de Turismo de Cajamarca** y el **Plan Estratégico Regional de Exportación.**



Turístico Rural y Artesanal



- 7 talleres de capacitación a los **emprendedores de la Ruta Artesanal de Mollepampa.**

- 1 Estudio de investigación realizado sobre **Nivel de Satisfacción de los Turistas Nacionales y Extranjeros que visitan Cajamarca** en coordinación con el MINCETUR.



Nº DE REGISTRO: 289 - 2017
De conformidad con el Decreto Supremo N° 001 - 2015 - MINCETUR, se Expide el Presente
CERTIFICADO DE CLASE Y CATEGORÍA
AL ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE: **"LA CASONA"**
Ubicado en: Jr. Bolívar N° 730
Dist: CAJABAMBA Prov: CAJABAMBA Dpto: CAJAMARCA
Se inscribió en el REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE,
CLASIFICADO como: **HOTEL** CATEGORÍA: DOS ESTRELLAS
RAZÓN SOCIAL: MARICELA M. PASTOR MEDINA DE CARRANZA
Con Dominio Legal en: Jr. Bolívar N° 730
Dist: CAJABAMBA Prov: CAJABAMBA Dpto: CAJAMARCA
FECHA DE VENCIMIENTO: INDETERMINADO
Cajamarca, 12 de OCTUBRE de 2017

- 10 prestadores de servicios turísticos categorizados y/o clasificados como actividades del **Plan de apoyo a la formalización del sector Turismo.**

- **2 ferias artesanales regionales ejecutadas**, trabajo realizado con el Comité de Ferias (IPERU – Cajamarca, Cite Koriwasi, Municipalidad Provincial de Cajamarca, DIRCETUR, CARETUR Y DDCC); **logrando un total de ventas de 38,237 soles.**





GOBIERNO REGIONAL
Cajamarca

2.4. Desarrollo Institucional y Gestión Participativa

Institucionalizar una gestión popular,
participativa, descentralizada,
transparente, eficaz y eficiente



GOBIERNO REGIONAL
Cajamarca

Trabajando
junto al pueblo

En Gestión del Riesgo de Desastres:

- Prevenición y de rehabilitación, y atención de emergencias, se apoyo con:

INSUMOS	CANTIDAD	POBLACIÓN BENEFICIADA	TOTAL (S/.)
Combustible	21,720 gl	210,000	249,780.00
Herramientas	75 kits	2,250	32,850.00
Calaminas	4,134 und	1,654	88,881.00
Tubería	3,560 und	89,000	131,720.00
Frazadas	1,264 und	1,264	31,600.00
Ayuda entregada: 62.33 Toneladas – S/. 534,831.00			

- Para fortalecer la **Gestión del Riesgo de Desastres**, se han llevado a cabo **Simulacros** y talleres como el de **Entrenamiento e Implementación de Brigadas Voluntarias en Defensa Civil**, beneficiando a 196,000 personas de las provincias de Chota, Celendín, Santa Cruz y Cajamarca.



En Seguridad Ciudadana y Movilización:


- **560 participantes** en reuniones de fortalecimiento de capacidades en las provincias de San Ignacio, Cajabamba, San Marcos, San Miguel, San Pablo, Contumazá y Celendín.
- **460 integrantes de las Rondas Campesinas y Urbanas** beneficiados con indumentaria.
- **2 000 personas** participaron de la **Caminata por la Seguridad Ciudadana**, entre miembros e instituciones del Comité Regional de Seguridad Ciudadana.
- En cuanto a Movilización, con el apoyo de miembros del Ejército del BIM Zepita N° 7, se realizaron **acciones de limpieza en zonas que han sufrido el embate de la naturaleza**, como en el Distrito de Los Baños del Inca y en la ciudad de Cajamarca.



En el año 2017 se aprobó el Programa Multianual de Inversiones (PMI) 2018 – 2020, dicha Programación contiene 501 proyectos, por un monto acumulado mayor a los 7,751 millones de soles.

En el mes de Octubre del Presente año, se aprobó la **Segunda actualización del Programa Multianual de Inversiones (PMI) 2018 – 2020**, dicha Programación contiene **581 proyectos**, cuyo monto acumulado supera los **8,630 millones de soles**.

NÚMERO DE PROYECTOS SEGÚN FUNCIÓN

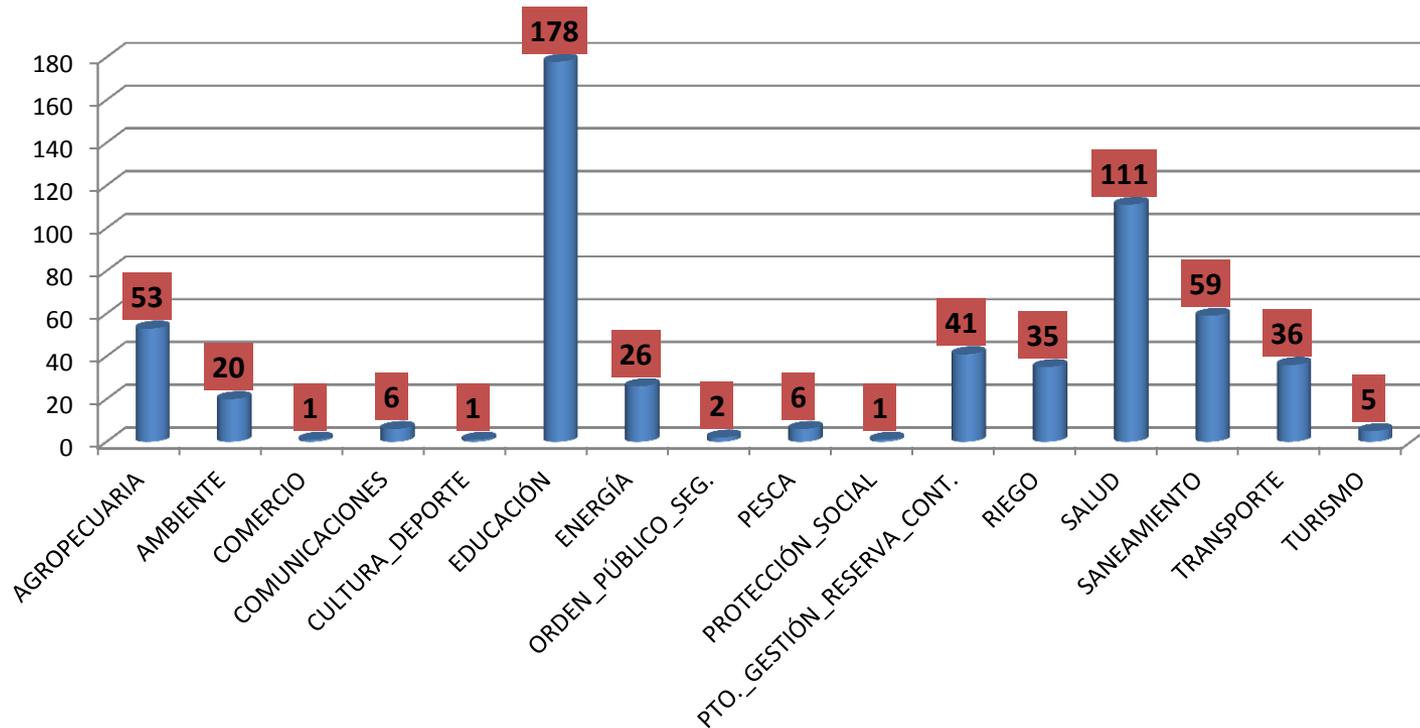



GOBIERNO REGIONAL
Cajamarca

2.5. EL GORECAJ Presente en Porcón Alto

Generando condiciones y oportunidades
para todos



GOBIERNO REGIONAL
Cajamarca

Trabajando
junto al pueblo

PRESENTE EN PORCÓN ALTO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN 16 CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA– REGION CAJAMARCA

Este importante proyecto se encuentra en proceso de elaboración de PERFIL y expediente técnico con una Inversión de **3 600,000 de soles**.

Objetivo: Dotar de un servicio de agua potable y saneamiento de calidad beneficiando a **125 caseríos del distrito de Cajamarca**, contribuyendo a mejorar las condiciones de salud y vida de la población.

- CONEXIONES : 10,269 Viviendas
- BENEFICIARIOS : 51,345 Habitantes
- CENTROS POBLADOS : 16

Porcón Alto, Porcón Bajo, Río Grande, Tual, La Ramada, Porcón La Esperanza, Huambocancha Alta, Huambocancha Baja, Porconcillo Alto, Chamis, Agocucho, La Paccha, Cashapampa, Pariamarca, El Cumbe y Huacariz.





GOBIERNO REGIONAL
Cajamarca

2.6. Demanda y Perspectivas 2018

Atendiendo las necesidades y prioridades
para un desarrollo integral



GOBIERNO REGIONAL
Cajamarca

Trabajando
junto al pueblo

Perspectivas

Iniciamos el 2017, con un Presupuesto de Inversiones de **112 Millones de soles**; sin embargo, a la fecha producto de la gestión realizada en los diversos Ministerios, contamos con **390.5 Millones de Soles**.

Nuestro compromiso es también que culminaremos con la elaboración de los perfiles y expedientes de los diferentes proyectos productivos y demás sectores que tenemos en cartera; orientando así la inversión pública a la diversificación productiva en la Región.



PROYECTOS EN FASE DE INVERSIÓN



GOBIERNO REGIONAL
Cajamarca

Trabajando
junto al pueblo

Expedientes Técnicos Concluidos

14 Expedientes Técnicos Concluidos que demandan una inversión de 103'129, 622 de soles.

N°	Nombre del Proyecto	Costo de Inversión (S/)
1	INSTALACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES LANCHE CONGA Y LA LLICA Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN AULLAN DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA CUTERVO, REGION CAJAMARCA	4,585,922
2	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES: N 361 DE NIVEL INICIAL, N 10289 DE NIVEL PRIMARIO Y SALOMON VILCHEZ MURGA DE NIVEL SECUNDARIO EN EL CENTRO POBLADO YACANCATE, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO, REGION CAJAMARCA	7,602,957
3	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA, CHAUPECRUZ, PALO QUEMADO Y NARANJOS, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CUTERVO - CAJAMARCA	8,885,703
4	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN 14 LOCALIDADES , PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA	58,029,394
5	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LAS LOCALIDADES DE MUSUNGATE Y SANTA ROSA, DISTRITO DE SAN JUAN DE CUTERVO - CUTERVO - CAJAMARCA.	2,231,192
6	INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE LA UNIÓN, LA FLOR DEL NORTE, SAN FRANCISCO DEL AGUA COLORADA, SAN JUAN DE LA MONTAÑA, EL EUCALIPTO Y SAULACA EN LA PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN CAJAMARCA. SNIP: 299473	11'791,179
7	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 10, PUEBLO JOVEN MIRAFLORES, DISTRITO Y PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN CAJAMARCA. SNIP: 263261	5'466,531
8	INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE NUEVO ORIENTE, NUEVO SOLITOR, ALFONSO UGARTE Y CALABAZO EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, REGIÓN CAJAMARCA. SNIP: 2284574	4'536,744
9	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA INTERCUENCA ALTO MARAÑÓN IV, PROVINCIA DE CELENDÍN, REGIÓN CAJAMARCA. SNIP 310392.	11'462,530.
10	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECO SISTÉMICO DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA CUENCA DEL RÍO CONTUMAZÁ Y EN LA CUENCA DEL RÍO HUERTAS, PROVINCIA DE CONTUMAZÁ, REGIÓN CAJAMARCA. SNIP 223179.	4,321,339
11	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS CANALES LANCHEZ ARTEZA, ARTEZA CANCHÁN, ANCHIPÁN ARTEZA MASCOTA, EN EL CENTRO POBLADO LAMASPAMPA, DISTRITO EL PRADO, PROVINCIA SAN MIGUEL, REGIÓN CAJAMARCA. SNIP: 205470	5,877,743
12	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO, CASERÍO SANTA ROSA - DISTRITO CORTEGANA - PROVINCIA CELENDÍN - REGIÓN CAJAMARCA. SNIP: 212304	5,302,035
13	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CENTRO POBLADO HUAMBOCANCHA ALTA, CASERÍO PLAN PORCONCILLO Y CASERÍO PORCONCILLO BAJO – DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, REGIÓN CAJAMARCA. SNIP: 252547	2,193,482
14	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACIÓN ARANMARCA, CASERÍO DE OGORIZ EN EL DISTRITO DE SAN JUAN – CAJAMARCA. SNIP: 165809	939,459



Elaboración de Expedientes Técnicos

46 proyectos en Elaboración de Expedientes Técnicos que necesitan una inversión 10'871,418 soles.

N°	Nombre del Proyecto	Costo E.T. (S/)
1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO DE LAS LOCALIDADES RAYME Y CULLANMAYO DISTRITO CUTERVO. PROVINCIA CUTERVO. DEPARTAMENTO CAJAMARCA. SNIP: 295151	96,005
2	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO NIVEL INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 396 DE NARANJO YACU Y NARANJITO, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CUTERVO - CAJAMARCA	48,540
3	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE PAN DE AZUCAR, SAN ANTONIO Y TABLABAMBA, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CUTERVO - CAJAMARCA	123,302
4	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE SOCOTA - CUTERVO - CAJAMARCA	139,785
5	CREACION, AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LA LADRILLERA, JUNTAS, BUENOS AIRES, NUEVO PORVENIR, GUAYAQUIL, CABRAMAYO, CUYCA ALTO Y HUERTILLAS - DISTRITO DE CALLAYUC - PROVINCIA DE CUTERVO - REGION CAJAMARCA	83,468
6	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 10891 VALLE CALLACATE, N° 17039 VALLE CONDAY, N° 16978 SANICULLO BAJO Y N° 17014 SAHUALPAMPA, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO – CAJAMARCA	320,000
7	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO Y TECNOLÓGICO OCTAVIO MATTA CONTRERAS, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA.	450,000
8	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N°10276 HUICHUD, N°10887 LAS PALMAS DE HUICHUD, N°17031 SANTA ROSA DE HUICHUD, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO -CAJAMARCA	240,000
9	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 10286 CHIBULGAN, N° 10282 MAMABAMBA, N° 10263 SANTA CLARA DE CAMSE, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA	240,000
10	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DEL NIVEL SECUNDARIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ELIAS AGUIRRE - SANTA CLARA DE CAMSE Y GERARDO GUERRERO GUEVARA - RAMBRAN DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA DE CUTERVO - REGION CAJAMARCA	140,000

Elaboración de Expedientes Técnicos

N°	Nombre del Proyecto	Costo E.T. (S/)
11	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IES JOSÉ ANTONIO ENCINAS DEL CP CADMALCA ALTO , DISTRITO LAJAS,CHOTA, CAJAMARCA	67,000
12	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS SAMUEL DE ALCAZAR, VALENTÍN PANIAGUA CORAZAO DE LOS CC.PP LLLANGODEN ALTO Y LANCHECONGA, DISTRITOS DE LAJAS Y HUAMBOS –CHOTA-CAJAMARCA.	72,400
13	MEJORAMIENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE PINGOBAMBA ALTO, PINGOBAMBA BAJO PINGOBAMBA DOÑA ANA, PINGOBAMBA TORIL Y PINGOBAMBA BEDOYA DEL DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA – CAJAMARCA.	108,000
14	INSTALACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN LA ZONA ARQUEOLÓGICA PACOPAMPA , DISTRITO QUEROCOTO –CHOTA-CAJAMARCA.	491,500
15	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE LAS MALVINAS, NUEVA ESPERANZA, TUCO ALTO TUCO BAJO ,TUCO CENTRO NOGAL, LIVAQUE, SANTA ROSA Y EL NARANJO , DISTRITOS DE BAMBAMARCA Y CHALAMARCA-HUALGAYOC Y CHOTA-CAJAMARCA.	175,948
16	ATENCIÓN A LLUVIAS Y PRODUCTOS ASOCIADOS –EMERGENCIA.	500,000
17	INSTALACIÓN DEL SERVICIO PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE CATACHE , DISTRITO DE CATACHE,SANTA CRUZ-CAJAMARCA	148,000
18	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CP MAJIN ALTO , DISTRITO MIRACOSTA, PROVINCIA CHOTA-REGIÓN CAJAMARCA.	105,000
19	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CP YURACYACU , DISTRITO CHOTA, PROVINCIA CHOTA-REGIÓN CAJAMARCA.	243,956
20	MEJORAMIENTO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CASORIOS DE CHIRIBAMBA Y LA PUTAGA , DISTRITO DE HUAMBOS, PROVINCIA DE CHOTA,REGIÓN CAJAMARCA.	155,496
21	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL CETPRO SANTA CRUZ PARA FORTALECER LA FORMACIÓN TÉCNICA Y LOS ESTÁNDARES DE EMPLEABILIDAD EN EL MERCADO LABORAL EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ-REGIÓN CAJAMARCA.	30,000
22	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO EN LA I.E 16981 COMUNIDAD NATIVA ALTO NARANJOS Y LA I.E 17357 COMUNIDAD NATIVA NUEVO CUCHA, DISTRITO DE SAN JOSÉ DE LOURDES, PROVINCIA SAN IGNACIO, REGIÓN CAJAMARCA. SNIP 248934.	81,020



Elaboración de Expedientes Técnicos

N°	Nombre del Proyecto	Costo E.T. (S/)
23	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA I.E 16524 COMUNIDAD NATIVA LOS NARANJOS, DISTRITO DE SAN JOSÉ DE LOURDES, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, REGIÓN CAJAMARCA. SNIP 248953.	96,856
24	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS I.E. N 16097, I.E. N 17432, I.E. N 16844, DE LOS CASERÍOS JORONGA ALTO, NUEVO ORIENTE Y BOLÍVAR EN EL DISTRITO DE COLASAY, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN CAJAMARCA. SNIP: 304429.	183,338
25	CREACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL JAÉN IV ETAPA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. CÓDIGO: 2300330.	691,052
26	CREACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL JAÉN V ETAPA EN LOS DISTRITOS DE: SAN JOSÉ DEL ALTO, BELLAVISTA, SANTA ROSA Y HUABAL DE LA PROVINCIA DE JAÉN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. CÓDIGO: 2314911	288,865
27	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN EL CENTRO POBLADO DE HUANICO, DISTRITO DE NAMORA, EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGION CAJAMARCA. CÓDIGO: 2330571	38,350
28	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL INICIAL, EN LAS LOCALIDADES DE PALTAPAMPA EN EL DISTRITO DE CHETILLA, GRANERO EN EL DISTRITO DE JESUS Y HUAQUILLAS EN EL DISTRITO DE MAGDALENA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGION CAJAMARCA	170,660
29	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE JUNCOS, DISTRITO DE NAMORA, CATULLA DISTRITO DE LA ASUNCION, CHAMANI DISTRITO DE LA ASUNCION, OGORIZ, DISTRITO DE SAN JUAN, EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA-CAJAMARCA	126,438
30	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CELENDIN- DISTRITO DE CELENDIN, EL LIMON - DISTRITO DE UTCO, JORGE CHAVEZ DISTRITO DE JORGE CHAVEZ Y FRAYLECOCHA - DISTRITO DE JOSE GALVEZ DE LA PROVINCIA DE CELENDIN, REGION CAJAMARCA	178,015
31	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE LA TOTORA EN EL DISTRITO DE CALQUIS, EL PALMITO EN EL DISTRITO DE NIEPOS Y TALLAPAMPA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, EN LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL, REGION CAJAMARCA	167,000
32	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CAJEN Y BELLAVISTA DE CAJEN - DISTRITO DE SUCRE, LA QUINUA Y PAJONAL - DISTRITO DE OXAMARCA DE LA PROVINCIA DE CELENDIN, REGION CAJAMARCA	211,915
33	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE - 3N (BAMBAMARCA) - PACCHA - CHIMBAN - PION - L.D. CON AMAZONAS (EMP.AM - 103 EL TRIUNFO)	1'545,425



Elaboración de Expedientes Técnicos

N°	Nombre del Proyecto	Costo E.T. (S/)
34	APERTURA DE LA CARRETERA TRAMO ALIMARCA - CANLLE - CHIQUINDA - ULLUAYPAMPA - LAS PAJAS, DISTRITO DE GREGORIO PITA - SAN MARCOS- CAJAMARCA	321,894
35	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE: EL TUCO, TUCO BAJO, NUEVA ESPERANZA, LA RAMADA Y SANTA ROSA, EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC-REGION CAJAMARCA	292,970
36	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DEL MILAGRO, MESAPATA, HIGOSBAMBA Y PUCARITA, EN LOS DISTRITOS DE CACHACHI, CAJABAMBA Y SITACOCCHA DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA, REGION CAJAMARCA	100,279
37	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CENTRO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA-CETPRO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA-CAJAMARCA	152,073
38	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE Nº82969 CARBON ALTO, DISTRITO GREGORIO PITA, PROVINCIA DE SAN MARCOS-REGION CAJAMARCA	96,706
39	CONSTRUCCION CANAL CHACAPAMPA - TUMBADEN	158,528
40	CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. VENECIA, LOCALIDAD DE VENECIA, DISTRITO BAÑOS DEL INCA, CAJAMARCA- CAJAMARCA	40,552
41	CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES EL PRADO,GALLITO CIEGO, AMANCHALOC,SANTA ANA Y EL MOTE, EN LOS DISTRITOS DE YONAN, GUZMANGO,SAN BENITO Y CONTUMAZA, PROVINCIA DE CONTUMAZA, REGION CAJAMARCA	264,571
42	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LA LOCALIDAD DE LUCMACUCHO, DISTRITO DE CAJAMARCA- CAJAMARCA	39,914
43	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES EL EMPALME, UCHUQUINUA Y VALLE ANDINO, DISTRITO DE LLAPA	31,950
44	INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA MEDIANTE REDES ELECTRICAS PARA LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS OLIVOS DE COLUMBO, DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJAMARCA	32,200
45	INSTALACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN MIGUEL FASE II- CAJAMARCA	862,444
46	INSTALACION Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS RURALES SAN MARCOS - CAJAMARCA	720,003



Procedimiento de selección en el OSCE

(para buena pro y firma de contrato e iniciar su ejecución)

5 proyectos en procedimiento de selección con una inversión de S/. 33' 382, 203 para beneficiar a 12, 350 personas.

FUNCION: Educación por S/. 9' 018, 507 para beneficiar a 2, 493 personas.

N°	Proyecto	Inversión S/.	Beneficiarios (personas)
1	MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO DE PORCÓN BAJO, PROVINCIA DE CAJAMARCA-CAJAMARCA. SNIP: 158219	639,227.36	487
2	RECONSTRUCCION DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 82284, CAJABAMBA – CAJAMARCA. SNIP: 173472	5,428,357.98	265
3	RECONSTRUCCION I.E. CARLOS MANUEL COX ROSSE-CHOLICAL, CAJABAMABA. SNIP: 141642	2,950,921.42	1,741

FUNCION: Transporte por S/. 24' 363, 696 para beneficiar a 9, 857 personas.

N°	Proyecto	Inversión S/.	Beneficiarios (personas)
1	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-101, TRAMO: EMPALME PE-1NF (CONTUMAZÁ) – YETÓN. SNIP: 132854	9,498,274.00	6,265
2	CONSTRUCCIÓN CARRETERA CORTEGANA-SAN ANTONIO-EL CALVARIO-TRES CRUCES-CANDÉN. SNIP: 258386	14,865,421.89	3,592

PROYECTOS EN FASE DE PRE INVERSIÓN

11 Perfiles Viables que necesitan una inversión de 1'919 194 de soles para elaboración de expediente técnico.

N°	Nombre del Proyecto	Costo E.T. (S/)
1	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO N 10837 CONGONA, N 16963 NUEVO PORVENIR DE ALIFIACO, N 10261 HUANGASHANGA Y N 10746 QUILAGAN, DE LOS DISTRITOS DE CUTERVO Y QUEROCOTILLO, PROVINCIA DE CUTERVO, REGIÓN CAJAMARCA	240,000
2	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS EN EL BARRIO NIÑO DIOS, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA	86,765
3	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES SAN FERNANDO, LOS CLAVELES, INDUSTRIAL, JOSÉ GÁLVEZ, LAS INDUSTRIAS, LOS OLIVOS, SOCOTA, ASUNCIÓN, SANTA ANA, RAMIRO PRIALE, FE Y ASUNCIÓN, PASAJE ASUNCIÓN, SALIDA A TACABAMBA, DEL BARRIO NIÑO DIOS Y 20 DE OCTUBRE, VIRGEN DEL CARMEN, LA AMISTAD, LOS ANDES, DEL SECTOR LAS FLORES, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA	254,069
4	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LAS LOCALIDADES DE CHACAF, CACHACARA, CONGA DE ALLANGA, ADCUÑAC, NUDILLO, SAN LORENZO, SANTA ROSA DE TAPO, DISTRITO DE Y PROVINCIA DE CUTERVO- REGION CAJAMARCA	232,530
5	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N°10257 URCURUME, N°10262 LA COLCA, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - REGIÓN CAJAMARCA	177,283
6	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS I.E.I. N 604 TOMAS GALVEZ QUISPE; I.E.I. LUZCATE; I.E.I. N 336 EL VERDE; I.E.I. EL CHIRIMOYO; I.E.I. N 353 EL CARDON; I.E.I. N 537 LIBERTAD PAN DE AZUCAR; I.E.I. 370 RAYME; I.E.I CHUPICAMONTE , DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA	168,336
7	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS II.EE. N 376 - EL ROLLO, N 388 SAN ISIDRO, N 541 MIRAFLORES, N 551 SAN PEDRO, DISTRITO DE CHOROS - CUTERVO - CAJAMARCA	210,701
8	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Nº 82885 Y Nº 821216 CENTRO POBLADO DE LA PAUCA - DISTRITO DE JOSE SABOGAL - PROVINCIA DE SAN MARCOS - REGIÓN CAJAMARCA, CENTRO POBLADO DE CORIORCO - DISTRITO DE JOSE SABOGAL - PROVINCIA DE SAN MARCOS - REGIÓN CAJAMARCA. CÓDIGO: 2365064	157,428
9	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E.S. MALAT, JOSÉ SABOGAL SAN MARCOS CENTRO POBLADO DE MALAT - DISTRITO DE JOSE SABOGAL - PROVINCIA DE SAN MARCOS - REGIÓN CAJAMARCA. CÓDIGO 2365085	68,059
10	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E.S. VENECIA, DISTRITO JOSE SABOGAL, PROVINCIA SAN MARCOS, REGION CAJAMARCA CENTRO POBLADO DE VENECIA - DISTRITO DE JOSE SABOGAL - PROVINCIA DE SAN MARCOS - REGIÓN CAJAMARCA. CÓDIGO: 2365078	72,976
11	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL C. P. DE NUMBRAL DEL DISTRITO DE CHALAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA – REGION CAJAMARCA. CODIGO 2383164	251,047

Proyectos en Elaboración de Perfil

9 proyectos de salud, en elaboración de perfil, por un monto estimado de 392 millones que atenderá a 124, 260 personas.

N°	Nombre del Proyecto	Beneficiarios	Costo de Inversión (S/)
1	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL JOSÉ SOTO CADENILLAS DE CHOTA	47,210	82,000,000
2	AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ONCOLOGÍA Y HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL REGIONAL DE CAJAMARCA	45,350	170,000,000
3	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD I – 4 TACABAMBA, DISTRITO DE TACABAMBA, PROVINCIA DE CHOTA – CAJAMARCA	7,000	20,000,000
4	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD I – 3 CHALAMARCA, DISTRITO DE CHALAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA – CAJAMARCA	2,100	20,000,000
5	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD I – 3 HUAMBOS, DISTRITO DE HUAMBOS, PROVINCIA DE CHOTA – CAJAMARCA	2,600	20,000,000
6	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD I – 3 CATACHE, DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ – CAJAMARCA	2,300	20,000,000
7	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD I – 4 SANTA CRUZ, DISTRITO DE SANTA CRUZ, PROVINCIA DE SANTA CRUZ – CAJAMARCA	6,200	20,000,000
8	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD I – 3 EL TAMBO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC – CAJAMARCA	7,500	20,000,000
9	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD I – 3 HUALGAYOC, DISTRITO DE HUALGAYOC, PROVINCIA DE HUALGAYOC – CAJAMARCA.	4,000	20,000,000





GOBIERNO REGIONAL
Cajamarca

!POR UNA GRAN REGIÓN!



GOBIERNO REGIONAL
Cajamarca

Trabajando
junto al pueblo
